

Pedidos Online - DUSA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.2

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/11/2013	1.0	Versión inicial	Laura Font
12/11/2013	1.1	Se agrega detalle de incidentes ocurridas y se completa la evaluación	Laura Font
12/11/2013	1.2	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra

Índice

1 Mediciones realizadas	3
1.1 Mediciones de horas	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.2 Mediciones de productos	5
2. Indicadores.....	5
3. Informe de Situación.....	5
3.1 Estado del proyecto	5
3.2 Desviaciones ocurridas.....	6
3.3 Incidencias encontradas	6
3.4 Estado de Riesgos	6
4 Evaluación	6


1 Mediciones realizadas

1.1 Mediciones de horas


1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Laura	15	15.0	226.8	18.9
Juan Miguel	15	25.5	165.5	13.8
Joana	15	30.0	302.7	25.2
Dahiana	15	33.0	244.7	20.4
Rodrigo Lago	15	20.5	204.0	17.0
Rodrigo Lavista	15	24.0	186.5	15.5
Veronica	15	18.0	283.8	23.7
Sergio	15	27.5	265.5	22.1
Patricia	15	28.0	271.5	22.6
Luciana	15	15.0	213.0	17.8
Santiago	15	40.0	353.5	29.5
Ignacio	15	19.0	188.0	15.7
Juan Francisco	15	18.5	213.5	17.8
Fernando	15	28.0	249.0	20.8


Esfuerzo Realizado en Semana 12

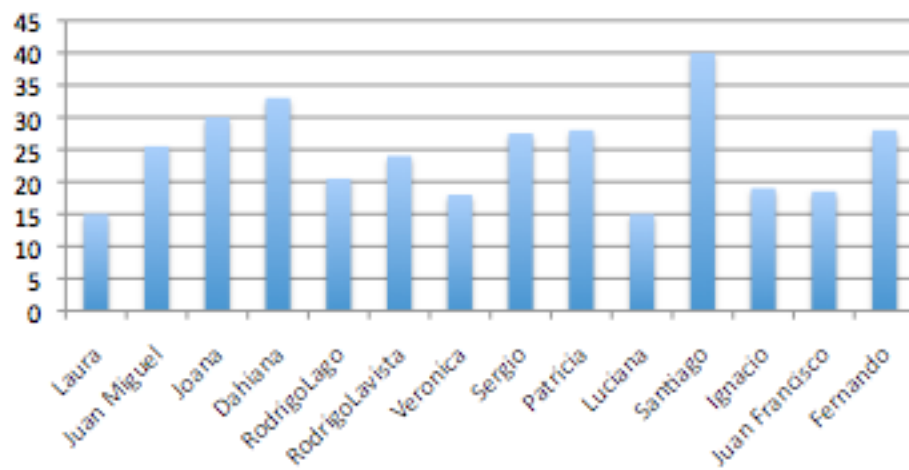

Esfuerzo Acumulado a Semana 12

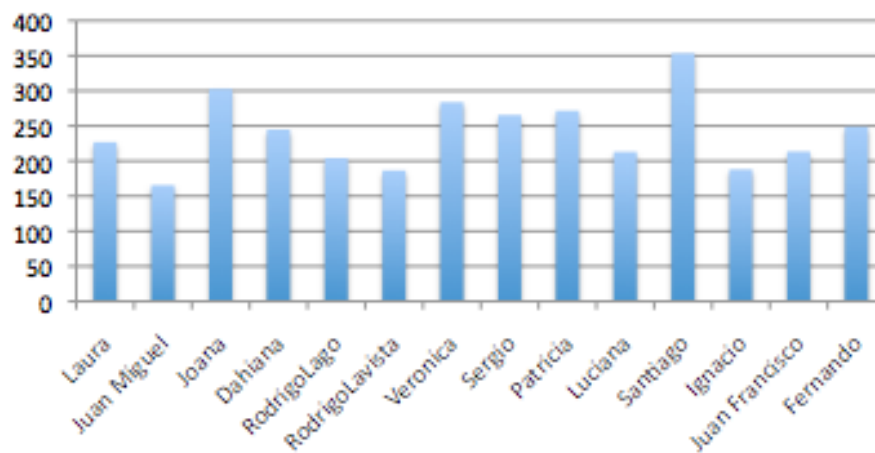

Promedio semanal a Semana 12

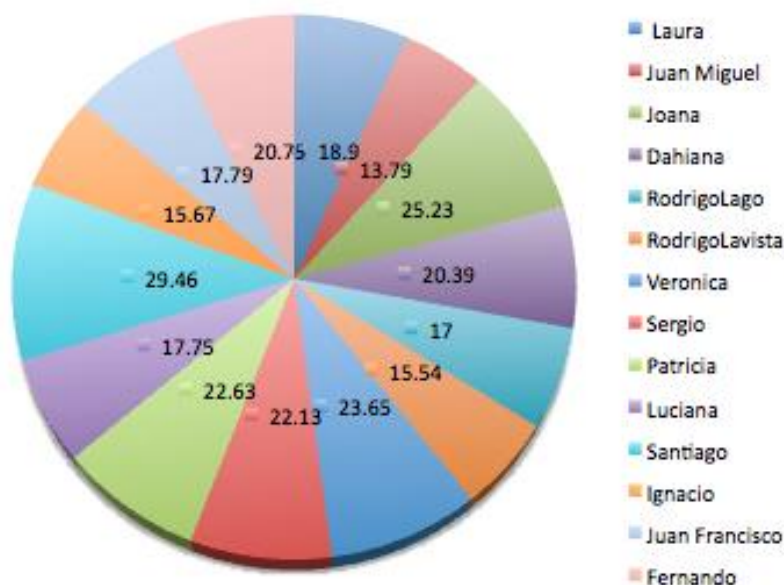

1.2 Mediciones de productos

Se han implementado todos los casos de uso previstos para la segunda iteración de Fase de Construcción y se han revisado algunas fallas reportadas por el equipo de Verificación.

En particular se han resuelto casos puntuales en los que la búsqueda no entregaba un resultado 100% correcto.

Interesa destacar que se ha realizado la presentación al cliente de la versión preliminar de la versión Beta, y que el cliente se ha mostrado muy satisfecho con la misma.

2. Indicadores

No se calcularon por no terminar la evaluación de cierre de fase sino hasta último momento. Se entregan en forma tardía.

3. Informe de Situación

3.1 Estado del proyecto

El proyecto ha avanzado de acuerdo a la planificación y estimaciones realizadas.

A pesar de ello han ocurrido incidencias que nos obligan retrasar algunas actividades previstas para el comienzo de la siguiente fase no. Se detallan las incidencias en la sección correspondiente de este informe.

3.2 Desviaciones ocurridas

Ocurrieron desviaciones de cronograma en cuanto a la liberación interna de la versión Beta prevista para el miércoles 6/11.

La liberación de la versión Beta se realiza a media noche del domingo 10 (último día de la semana 12), por lo que el equipo de Verificación comenzará su trabajo a partir de ese momento.

3.3 Incidencias encontradas

Existieron incidencias de distinta naturaleza que se detallan a continuación:

1. La liberación prevista para el día 6/11 debió ser replanificada para el sábado 9/11 puesto que se encontraron en la versión liberada con respecto a los últimas actualizaciones de código realizadas. Este segundo intento también se vio demorado.
2. Al tiempo que se intentaba volver al estado anterior al problema generado, se realizaron cambios en la implementación para el manejo de mensajes de errores lo cuál originó mayores cambios de los previstos
3. Un error al guardar en la base un pedido activo pero aún no confirmado generó un cambio importante en la implementación del componente de lógica.

3.4 Estado de Riesgos

Ha surgido el riesgo de tener poco tiempo para la verificación previa a la liberación para el cliente de la versión Beta.

Para mitigar el impacto del mismo se prevé entregar la versión con algunos detalles (no críticos) por resolver, los que serán finalizados en la primer semana de Fase de Transición. En la delantar varias actividades correspondientes a dicha fase.

4 Evaluación

La evaluación es positiva, si bien hemos tenido incidencias, no ponen en duda la finalización del proyecto en las condiciones deseadas por el equipo y esperadas por el cliente
