

Pedidos Online - DUSA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.3

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/09/2013	1.0	Versión inicial	Laura Font
08/09/2013	1.1	Revisión Responsable SQA	Verónica Gamarra
09/09/2013	1.2	Agregado esfuerzo final	Laura Font
09/09/2013	1.3	Revisión final Responsable SQA	Verónica Gamarra

Índice



1. Mediciones realizadas.....	3
1.1 Mediciones de horas	3
1.2 Mediciones de productos	4
2. Indicadores	4
3. Informe de Situación	5
3.1 Estado del proyecto	5
3.2 Desviaciones ocurridas.....	5
3.3 Incidencias encontradas	5
3.4 Estado de Riesgos	5
4. Evaluación.....	6

1. Mediciones realizadas

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Laura	15	22	68.3	22.8
Juan Miguel	15	11	46.5	15.5
Joana	15	18.3	62.6	20.9
Dahiana	15	15.2	54.2	18.1
Rodrigo Lago	15	15.5	50	16.7
Rodrigo Lavista	15	17	48.5	16.2
Veronica	15	24.5	85.3	28.4
Sergio	15	24	59.5	19.8
Patricia	15	23	59.6	19.9
Diego	15	13.45	55.35	18.5
Luciana	15	23	60	20.0
Santiago	15	26.5	59	19.7
Ignacio	15	13.5	35.5	11.8
Juan Francisco	15	16.95	45.95	15.3
Fernando	15	19	57.75	19.3

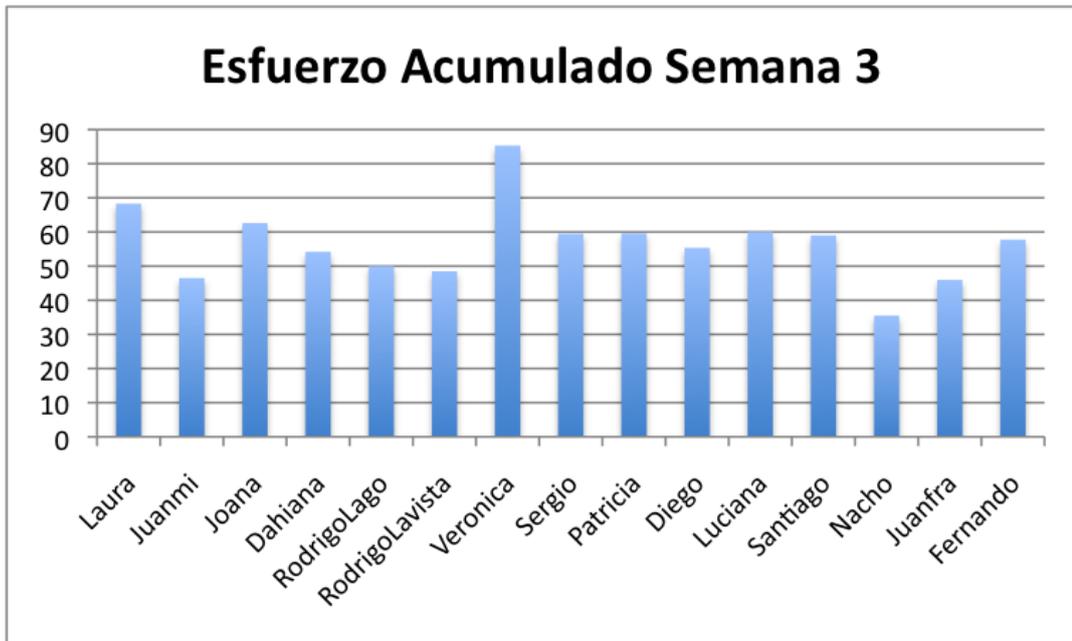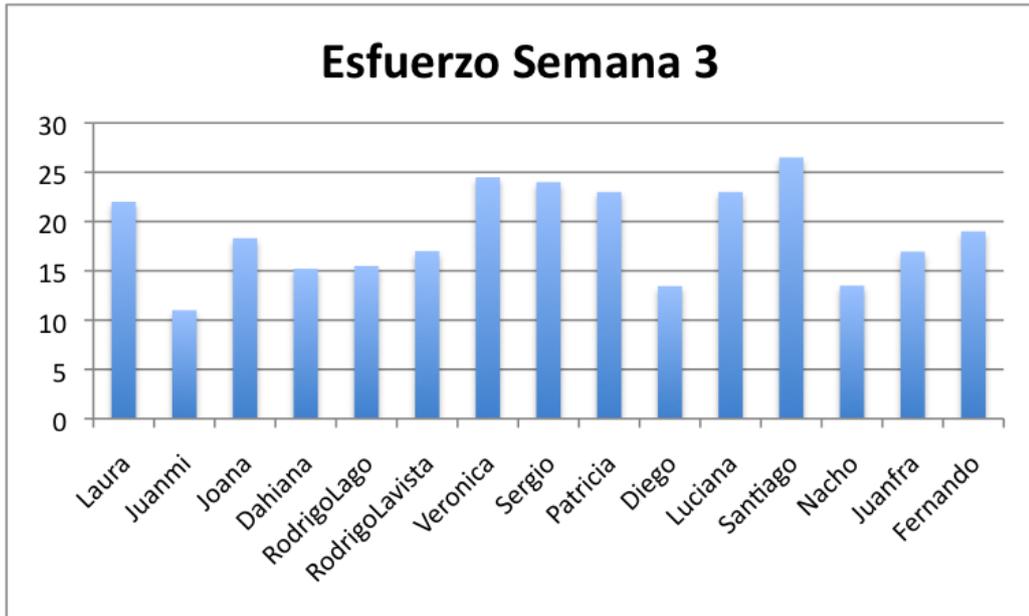

1.2 Mediciones de productos

No aplica al finalizar semana 3

2. Indicadores

No aplica al finalizar semana 3

3. Informe de Situación

El informe de estado de situación se realiza habiendo transcurrido el 40% de la duración de la iteración (equivale a 6 días completos de trabajo de un total de 15)

3.1 Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en plena ejecución, con los participantes abocados a las actividades correspondientes a la planificación realizada.

Se han evaluado algunas tecnologías y técnicas nuevas para el equipo, se ha podido concluir que su incorporación para el proyecto será beneficiosa, aportando valor en el aspecto de facilidad de uso esperado en el producto.

En este sentido, algunos integrantes del equipo han invertido en entrenamiento en el uso de las nuevas herramientas.

3.2 Desviaciones ocurridas

En la línea de Gestión de Proyecto se está trabajando en la primer versión de estimaciones, lo que representa cierto atraso que esperamos poder subsanar para la finalización de al iteración en curso.

3.3 Incidencias encontradas

Al finalizar al iteración 1 de la Fase Inicial, se decide intercambiar roles asignados entre dos participantes, dado que la ausencia temporal de uno de ellos generaba dificultades de organización, debido a que las actividades previstas para esta etapa requieran mucha interacción entre los participantes (arquitecto - especialistas técnicos - analistas - cliente).

3.4 Estado de Riesgos

De acuerdo al plan de Gestión de Riesgos, se realiza el monitoreo de aquellos que corresponden a la Fase de Inicio. En particular se encuentra necesario definir contingencias para los siguientes riesgos:

Riesgo	Descripción	Estado	Síntoma	Respuesta
EXT-C	Ausencia temporal contraparte cliente	Activo	Se comunica en la reunión de relevamiento la ausencia en próximas semanas	Coordinar con antelación la designación de sustituto a quién se le trasladan las responsabilidades y actividades en lo que al proyecto refiere.
ORG-4	No tener conocimientos en el uso de herramientas de administración del proyecto	Activo	Se demora más tiempo del previsto en el uso de MS Project por dificultades concretas de personalización en cuanto a	Se consultan guías de uso y recomendaciones de buenas prácticas en el uso de MS Project, aplicación utilizada para realizar estimaciones y planificación

			asignación de disponibilidad, de manera de poder planificar y controlar luego dedicación estimada vs real	
--	--	--	---	--

4. Evaluación

Entiendo que el proyecto va tomando el ritmo adecuado para el cumplimiento de los hitos previstos.

Todos los integrantes de equipo se muestran más comprometidos y con menos incertidumbre acerca de las responsabilidades que les competen y cómo lograr las interacciones necesarias de manera fluida.

La ocurrencia de aquellos eventos identificados como riesgos tienen una respuesta definida que no impacta en el proyecto por el momento. Corresponde a riesgos de prioridad Baja y Media.
