

# **Bizativiti**

## **Grupo 4**

### **Informe de Situación del Proyecto**

#### **Versión 2.0**

### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
26/08/2013	1.0	Revision SQA	Valeria Rocha
01/09/2013	1.1	Iteración 1	Andrés Moreira
01/09/2013	1.1	Revision SQA	Valeria Rocha
08/09/2013	1.2	Revisión Semana 3	Andrés Moreira
15/09/2013	1.3	Actualización Semana 4	Andrés Moreira
22/09/2013	1.4	Actualización Semana 5	Andrés Moreira
29/09/2013	1.5	Actualización Semana 6	Andrés Moreira
07/10/2013	1.6	Actualización Semana 7	Andrés Moreira
07/10/2013	1.6	Revisión SQA	Valeria Rocha
13/10/2013	1.7	Actualización Semana 8	Andrés Moreira
20/10/2013	1.8	Actualización Semana 9	Andrés Moreira
21/10/2013	1.8	Revisión SQA	Valeria Rocha
26/10/2013	1.9	Actualización Semana 10	Andrés Moreira
27/10/2013	1.9	Revisión SQA	Valeria Rocha
3/11/2013	2.0	Actualización Semana 11	Andrés Moreira
3/11/2013	2.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

# Índice

[Mediciones realizadas](#)

[Mediciones de horas](#)

[Esfuerzo por integrante del equipo](#)

[Esfuerzo por disciplina](#)

[Esfuerzo histórico por integrante](#)

[Esfuerzo histórico por Línea de trabajo](#)

[Informe de Situación](#)

[Estado del proyecto](#)

[Desviaciones ocurridas](#)

[Incidencias encontradas](#)

[Estado de Riesgos](#)


[Evaluación](#)

## Mediciones realizadas

### Mediciones de horas

#### Esfuerzo por integrante del equipo


<b>Nombre</b>	<b>Esfuerzo estimado</b>	<b>Esfuerzo realizado</b>	<b>Esfuerzo acumulado</b>
Armand Ugon, Victoria	15	<b>15.25</b>	157.5
Cardozo, Javier	15	<b>15.75</b>	163.9
Cossio, Diego	15	<b>15.25</b>	168
De Munno, Luciano	15	<b>20</b>	170
Der Boghosian, Reyna	15	<b>22</b>	165.5
Dieci, Constanza	15	<b>16</b>	161.75
Lorier, Juan Pablo	15	<b>16</b>	181.5
Moreira, Andrés	15	<b>12</b>	179.35
Moreno, Santiago	15	<b>16</b>	161
Mori, Martin	15	<b>26.5</b>	155.25
Picca, Juan	15	<b>14.5</b>	177.75
Rocha, Valeria	15	<b>15.5</b>	165.5
Roldán, Fabiana	15	<b>15.5</b>	166.5
Rubio, Martin	15	<b>17.75</b>	165
Techera, Tamara	15	<b>17.5</b>	161.8
Yemini, Virginia	15	<b>12</b>	204.25

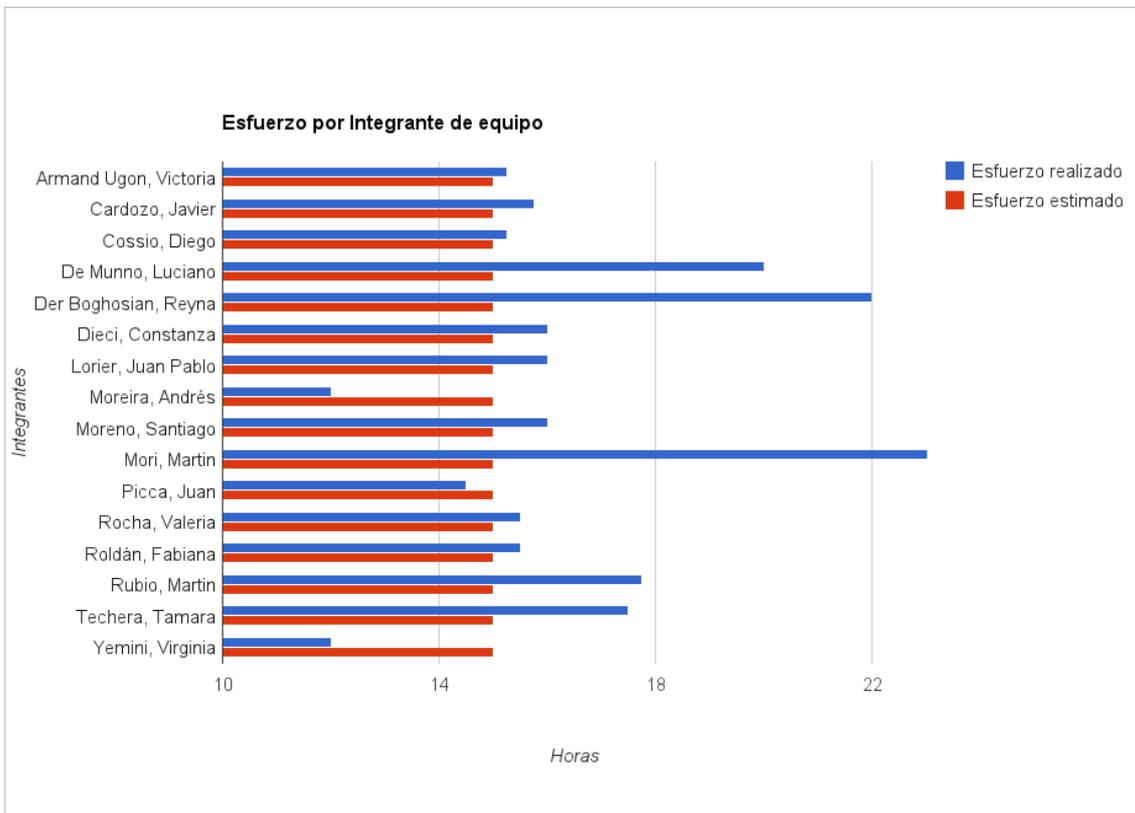


## Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.


<b>Disciplina</b>	<b>Esfuerzo realizado</b>	<b>Esfuerzo estimado</b>	<b>Esfuerzo acumulado</b>
Línea Análisis/Req.	0	3	68
Línea Diseño	0	1	83.75
Línea Implementación	142.75	119	668.25
Línea Gestión de Calidad	12.5	13	104.75
Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	3.5	5.5	51.5
Línea Gestión de Proyecto	44.5	47	756.35
Línea Verificación	19.25	28	221.5
Línea Comunicación	10	0	222.05
Línea Transición al entorno del usuario	7	11	7
Línea de Formación y Entrenamiento	23	20	411.85

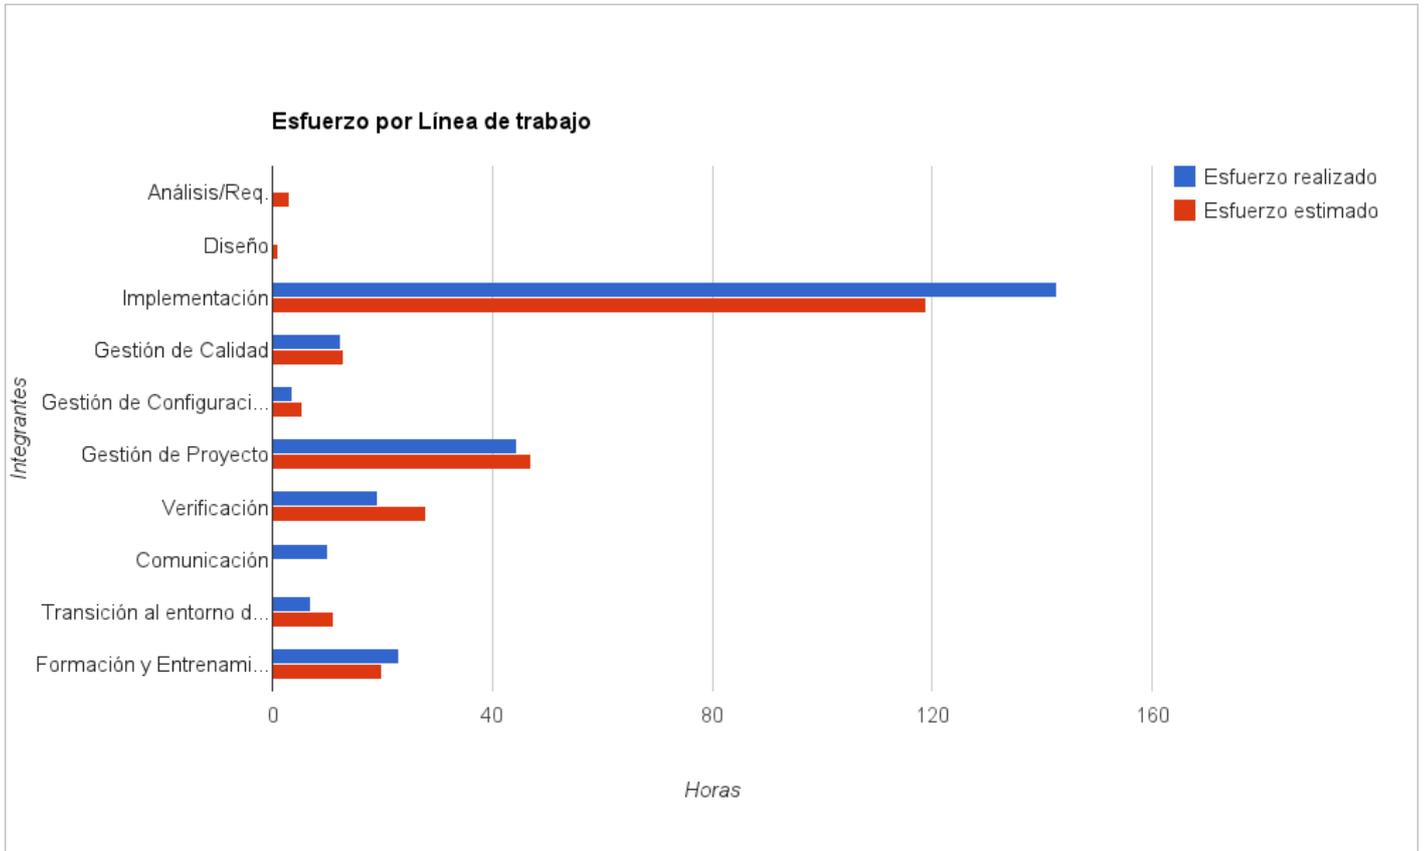

### Esfuerzo histórico por integrante

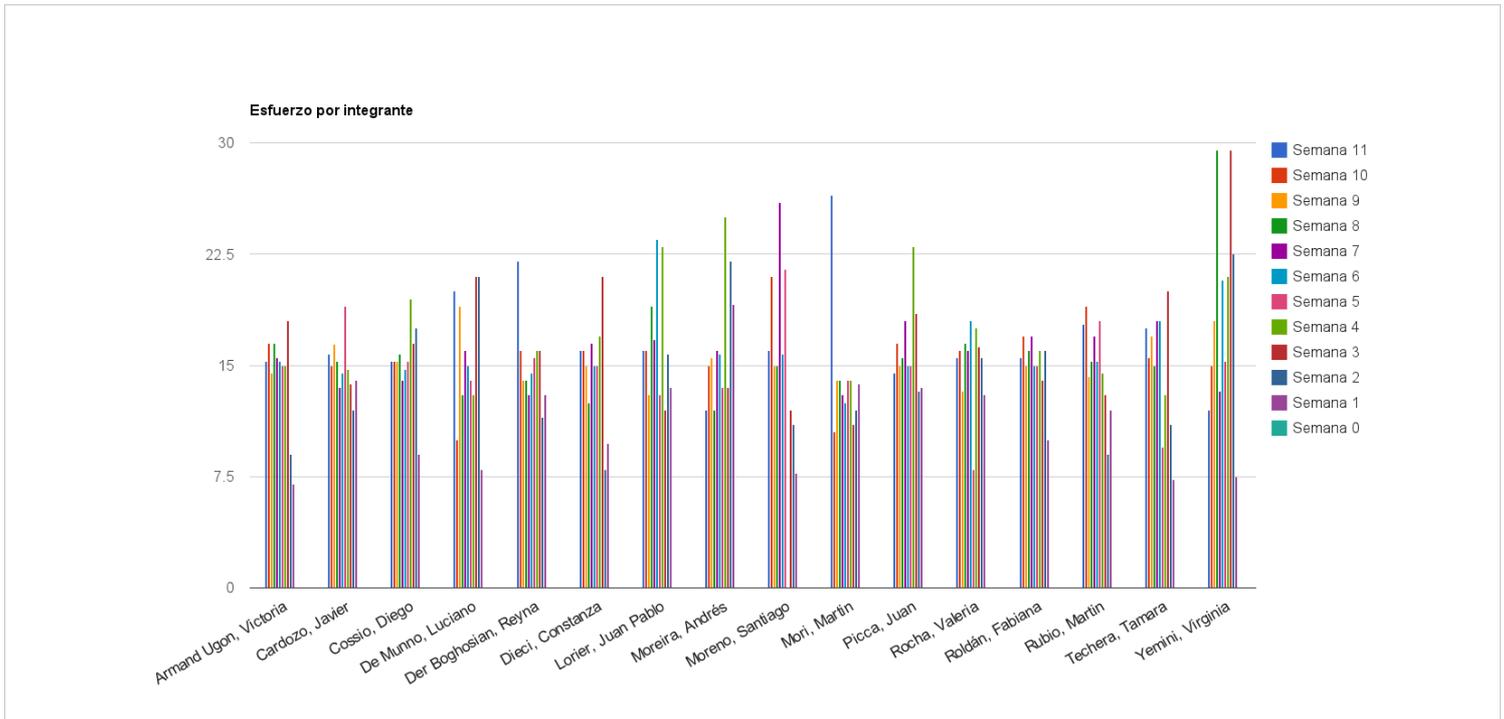

## Esfuerzo histórico por Línea de trabajo

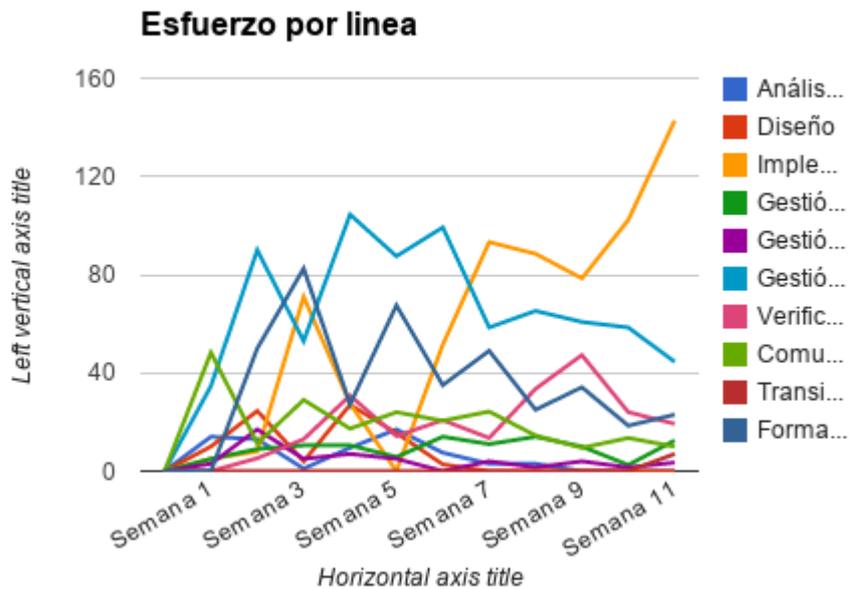

## Informe de Situación

### Estado del proyecto

Se completo todo lo planificado para la semana, incluyendo un servidor (provisto por el equipo) para que el cliente empiece a testear cuanto antes (mañana Lunes se le envía la URL al producto para que empiece el UAT).

### Desviaciones ocurridas

La desviación es debido a que se encontraron un conjunto de bugs más que fuerón solucionados pero llevaron más tiempo de lo estimado.

### Incidencias encontradas

No hay incidencias encontradas.

### Estado de Riesgos

El único riesgo presente en este momento es:

### **1. Riesgo - Tardía validación para la aceptación del producto con el cliente**

La validación con el cliente se demora debido a disponibilidad del cliente o por problemas del que el equipo no tiene las liberaciones en tiempo para validar con el cliente la aceptación del producto.

## **Evaluación**

El proyecto continua avanzando sin problemas, ya disponemos de un entorno para mostrarle el producto al cliente y vamos a generar una mayor sinergia en la semana 12 para poder obtener feedback rápido, y de calidad.
