

Bizativiti

Grupo 4

Informe de Situación del Proyecto

Versión 2.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
26/08/2013	1.0	Revision SQA	Valeria Rocha
01/09/2013	1.1	Iteración 1	Andrés Moreira
01/09/2013	1.1	Revision SQA	Valeria Rocha
08/09/2013	1.2	Revisión Semana 3	Andrés Moreira
15/09/2013	1.3	Actualización Semana 4	Andrés Moreira
22/09/2013	1.4	Actualización Semana 5	Andrés Moreira
29/09/2013	1.5	Actualización Semana 6	Andrés Moreira
07/10/2013	1.6	Actualización Semana 7	Andrés Moreira
07/10/2013	1.6	Revisión SQA	Valeria Rocha
13/10/2013	1.7	Actualización Semana 8	Andrés Moreira
20/10/2013	1.8	Actualización Semana 9	Andrés Moreira
21/10/2013	1.8	Revisión SQA	Valeria Rocha
26/10/2013	1.9	Actualización Semana 10	Andrés Moreira
27/10/2013	1.9	Revisión SQA	Valeria Rocha
3/11/2013	2.0	Actualización Semana 11	Andrés Moreira
3/11/2013	2.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
11/10/2013	2.1	Actualización Semana 12	Andrés Moreira
11/10/2013	2.1	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índice

[Mediciones realizadas](#)

[Mediciones de horas](#)

[Esfuerzo por integrante del equipo](#)

[Esfuerzo por disciplina](#)

[Esfuerzo histórico por integrante](#)

[Esfuerzo histórico por Línea de trabajo](#)

[Informe de Situación](#)

[Estado del proyecto](#)

[Desviaciones ocurridas](#)

[Incidencias encontradas](#)

[Estado de Riesgos](#)

[Evaluación](#)


Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado
Armand Ugon, Victoria	15	14.5	172
Cardozo, Javier	15	13	176.9
Cossio, Diego	15	15.25	183.25
De Munno, Luciano	15	13	183
Der Boghosian, Reyna	15	17.5	183
Dieci, Constanza	15	15	176.75
Lorier, Juan Pablo	15	15.5	197
Moreira, Andrés	15	13	192.35
Moreno, Santiago	15	18	179
Mori, Martin	15	21.5	176.75
Picca, Juan	15	11	188.75
Rocha, Valeria	15	17	182.5
Roldán, Fabiana	15	17	183.5
Rubio, Martin	15	15.5	180.5
Techera, Tamara	15	17.5	179.3
Yemini, Virginia	15	15.5	219.75


Esfuerzo por Integrante de equipo

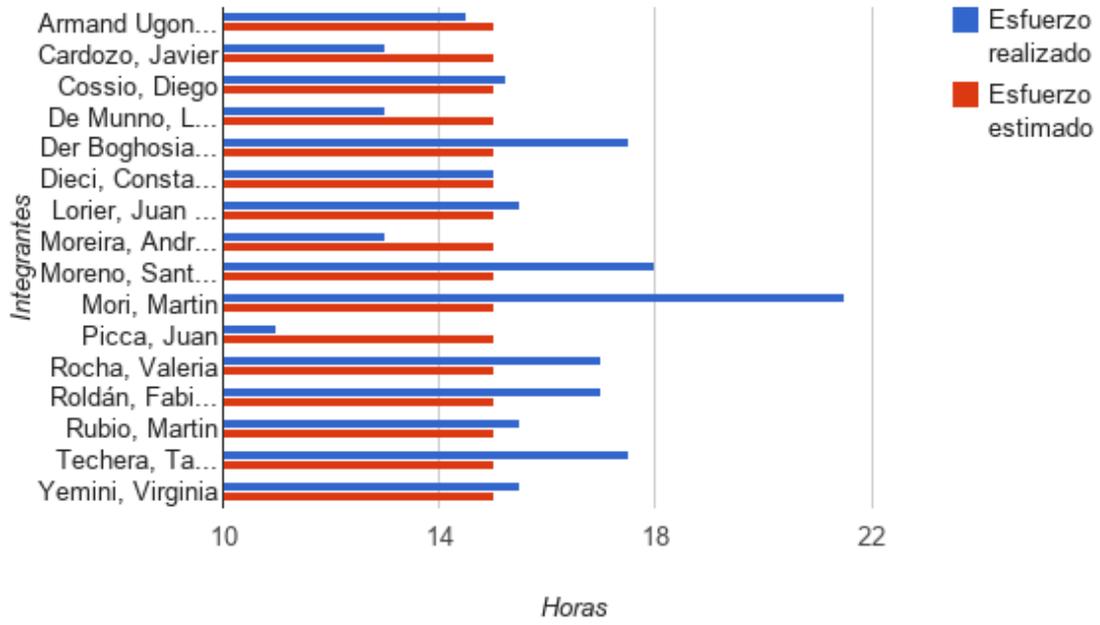


Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.


Disciplina	Esfuerzo realizado	Esfuerzo estimado	Esfuerzo acumulado
Línea Análisis/Req.	0	0	68
Línea Diseño	0	0	83.75
Línea Implementación	116	119	784.25
Línea Gestión de Calidad	13.5	13	118.25
Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	1	4	52.5
Línea Gestión de Proyecto	27.5	30	783.85
Línea Verificación	30.75	30	252.25
Línea Comunicación	10	0	232.05
Línea Transición al entorno del usuario	20	20	27
Línea de Formación y Entrenamiento	31	25	442.85

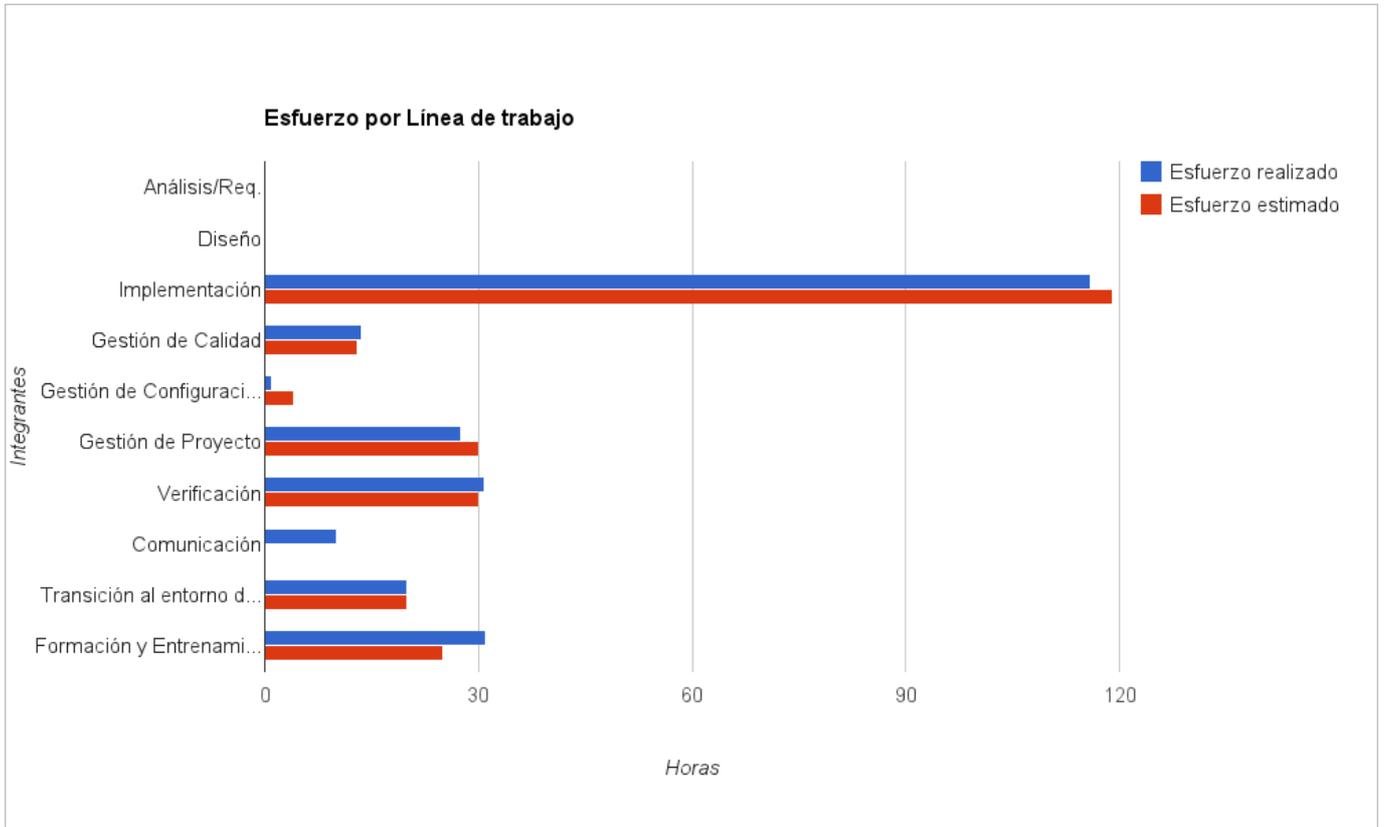

Esfuerzo histórico por integrante

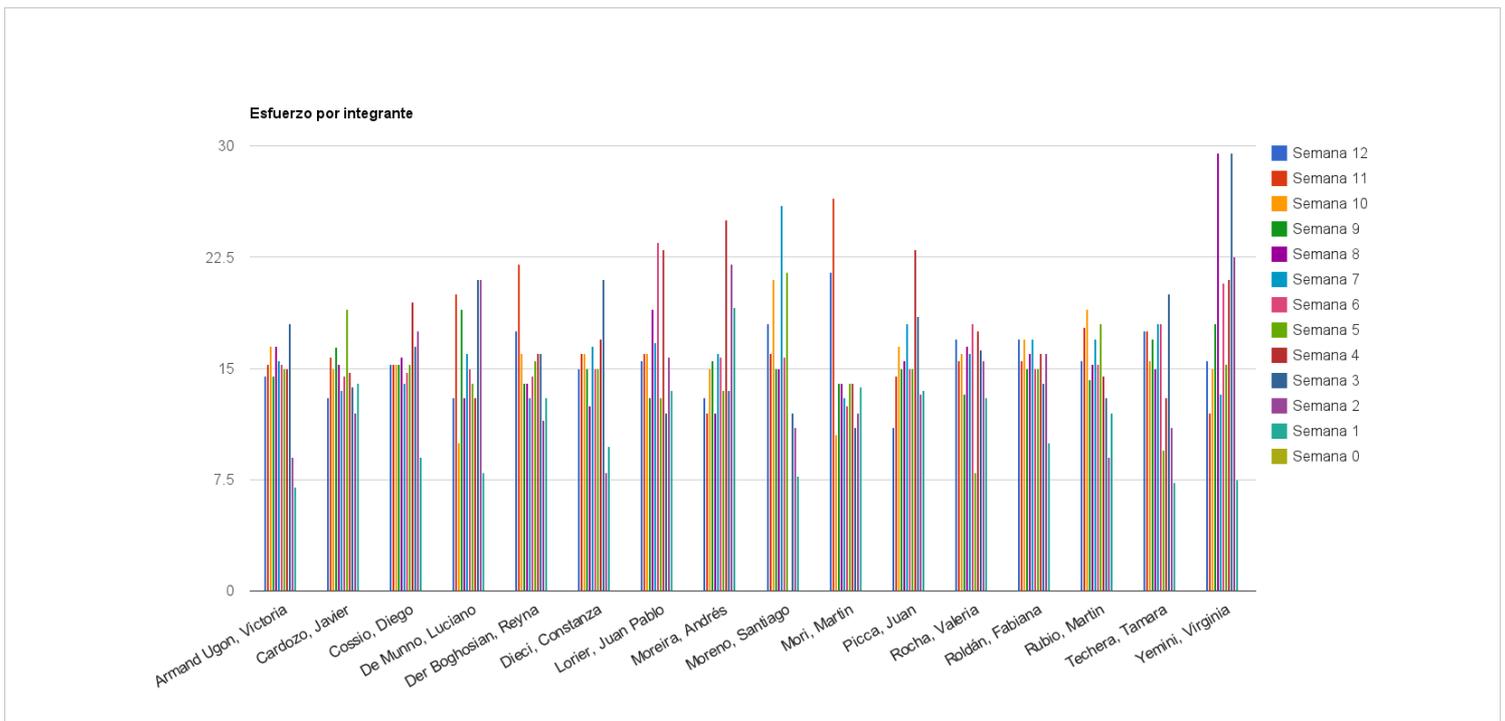

Esfuerzo histórico por Línea de trabajo

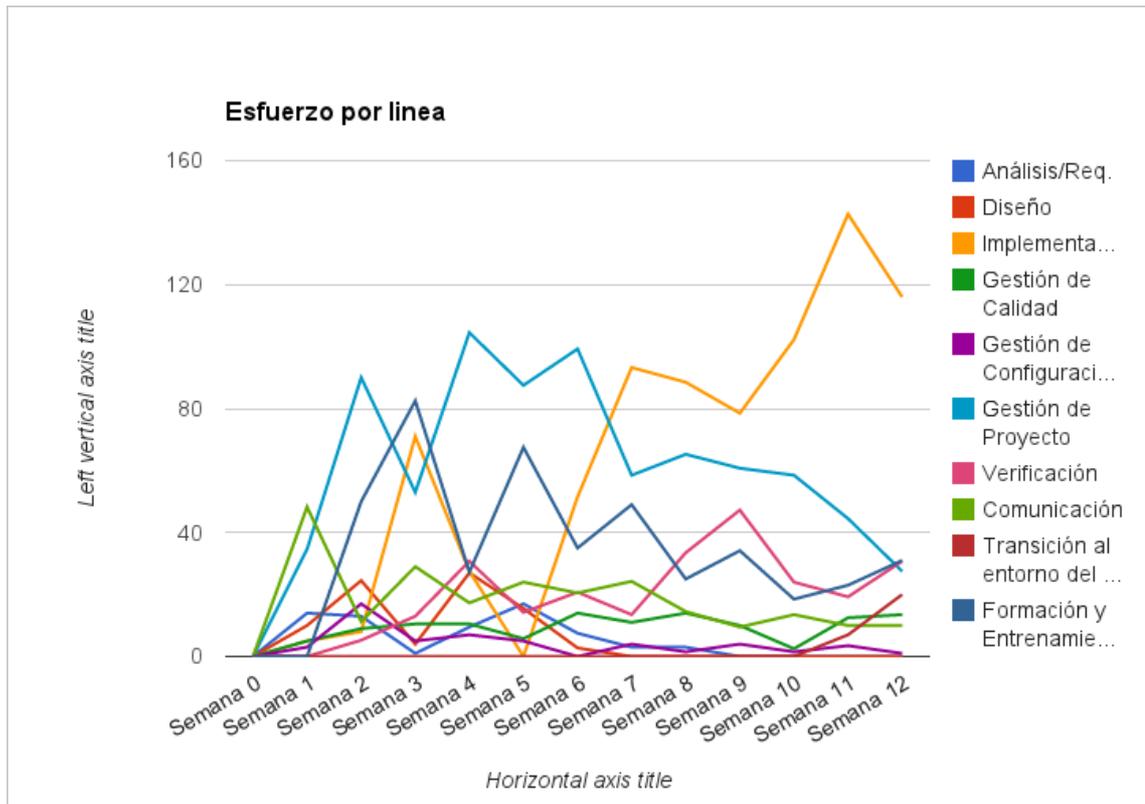

Informe de Situación

Estado del proyecto

Se continua evolucionando de forma esperada, se completo lo pautado en el cronograma para la semana y se está en una fase final del proyecto.

Actualmente, llevamos:

- 729 horas dedicadas
- 34 horas faltantes
- 798 estimadas
- 35 horas de desviación

Desviaciones ocurridas

No hubieron desviaciones.

Incidencias encontradas

No hay incidencias encontradas.

Estado de Riesgos

El único riesgo presente en este momento es:

1. Riesgo - Tardía validación para la aceptación del producto con el cliente

La validación con el cliente se demora debido a disponibilidad del cliente o por problemas del que el equipo no tiene las liberaciones en tiempo para validar con el cliente la aceptación del producto.

Evaluación

Se continua trabajando bien, y se preve terminar el desarrollo en la semana próxima sin mayores problemas. Se está esperando feedback del cliente luego de haberle enviado la URL para acceder al software, así como el el paquete web y como instalarlo para que puedan probar.
