

# **Bizativiti**

## **Informe de Situación del Proyecto** **Versión 1.0**

### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
26/08/2013	1.0	Revision SQA	Valeria Rocha

# Contenido

## [Mediciones realizadas](#)

### [Mediciones de horas](#)

[Esfuerzo por integrante del equipo](#)

[Esfuerzo por disciplina](#)

[Mediciones de productos](#)

### [Indicadores](#)

[Indicadores de Esfuerzo y Tiempo](#)

[Indicador de Cumplimiento de entregas](#)

[Indicador de Desviación de fechas de entregas](#)

### [Informe de Situación](#)

[Estado del proyecto](#)

[Desviaciones ocurridas](#)

[Incidencias encontradas](#)

[Estado de Riesgos](#)


[Evaluación](#)

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo


Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Armand Ugon, Victoria	15	7
Cardozo, Javier	15	14
Cossio, Diego	15	9
De Munno, Luciano	15	8
Der Boghosian, Reyna	15	13
Dieci, Constanza	15	9.75
Lorier, Juan Pablo	15	13.5
Moreira, Andrés	20	19.1
Moreno, Santiago	15	7.75
Mori, Martin	15	13.75
Picca, Juan	15	13.5
Rocha, Valeria	15	13
Roldán, Fabiana	15	10
Rubio, Martin	15	12
Techera, Tamara	15	7.3
Yemini, Virginia	15	7.5

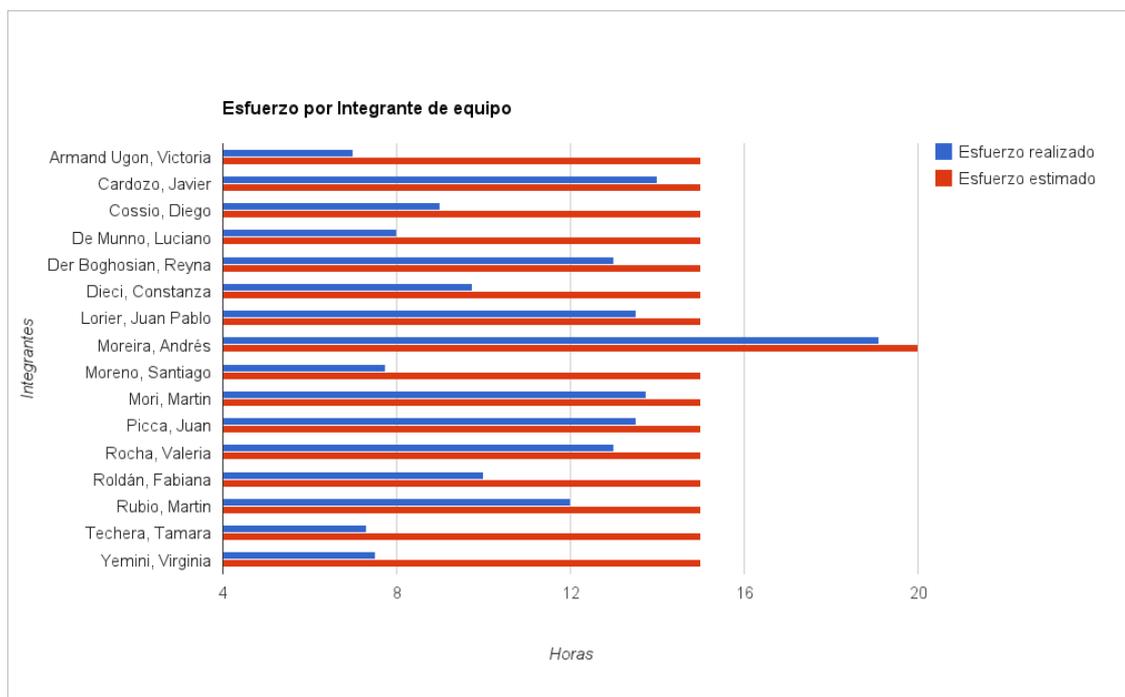

## Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.

Disciplina	Esfuerzo realizado	Esfuerzo estimado
Línea Análisis/Req.	14	25.5
Línea Diseño	10	0
Línea Implementación	5	4.5
Línea Gestión de Calidad	5	21
Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	3	8.5
Línea Gestión de Proyecto	34.6	21.5
Línea Verificación	0	4.5
Línea Comunicación	48.25	0
Línea Transición al entorno del usuario	0	0

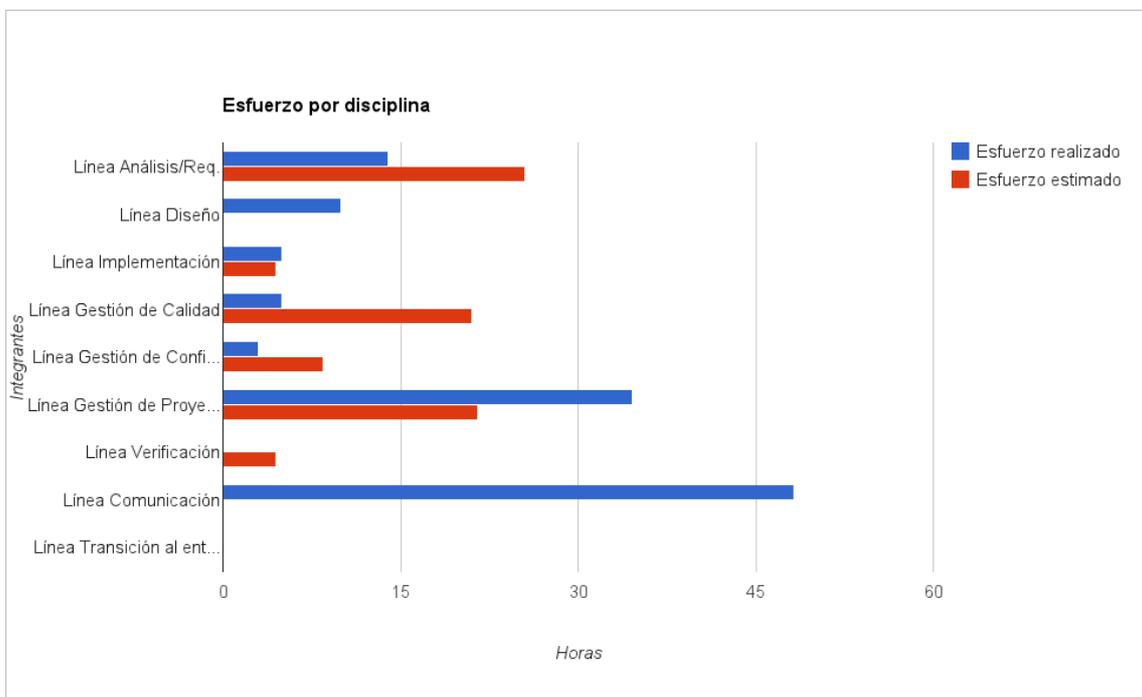

## Mediciones de productos

N/A

# Indicadores

## Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

## Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

## Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

# Informe de Situación

## Estado del proyecto

El proyecto viene progresando de acuerdo a lo previsto. Como es de esperar, la primer semana hay un gran cantidad de horas dedicadas a la comunicación y a la gestión del mismo.

El equipo de analistas ya está trabajando en obtener los requerimientos del proyecto mediante una reunion con el cliente que está solicitada para la semana proxima.

El equipo de especialistas técnicos ha estado trabajando en la propuesta de un ambiente de desarrollo homogéneo, así como estandares para la documentción y código.

Se ha estado discutiendo sobre la arquitectura del mismo entre el arquitecto, un especialista técnico y el administrador. En particular, sobre la arquitectura de plugins, la cual ha sido mencionada como el cliente como algo importante del producto a desarrollar.

En el área de verificación no hubo avances de acuerdo a lo planeado, pero dado que es una etapa temprana, no se considera riesgoso.

El equipo de SQA ha estado trabajando de cerca en todo el proceso, aunque se estimo más de lo que se trabajo, aún cumpliendo con los objetivos.

## Desviaciones ocurridas

- **Análisis/Req:** El equipo de análisis comenzó a analizar ya que en esta etapa se conto con más información de la planeada para comenzar a trabajar con los requerimientos. Por ese motivo se trabajo más horas de las estimadas.
- **Diseño:** De igual forma, se comenzó a investigar y a trabajar en la arquitectura luego de la reunión con el cliente. Por ende se dedicaron más hora de las estimadas para la semana 1.
- **Gestión de calidad:** Se estimo bastante más de lo que se dedico, sin embargo no hubo ninguna afectación en el proyecto.

- **Gestión de SCM:** Nuevamente, se estimo un poco más de las horas trabajadas, asumiendo que se iba a trabajar de forma más fuerte la primer semana, pero no fue así.
- **Gestión de proyecto:** En este item no se tuvo en cuenta la reunión de seguimiento del proyecto, por eso la gran variación de horas.
- **Verificación:** Se estimo que se iba a comenzar a trabajar sobre el área de testing, pero el responsable concluyo que todavía no había información necesaria como para empezar.

## **Incidencias encontradas**

No hubieron incidencias en esta semana.

## **Estado de Riesgos**

No se encontraron riesgos en esta etapa.

## **Evaluación**

En esta primer semana del proyecto, los resultados obtenidos son los esperados y se ha cumplido con lo propuesto para la semana. Se espera un avance más importante para la próxima semana, una vez que se hayan relevado más requerimientos así como se tenga más información sobre la tecnología y la arquitectura.
