

Bizativiti

Grupo 4

Informe de Situación del Proyecto

Versión 2.3

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
26/08/2013	1.0	Revision SQA	Valeria Rocha
01/09/2013	1.1	Iteración 1	Andrés Moreira
01/09/2013	1.1	Revision SQA	Valeria Rocha
08/09/2013	1.2	Revisión Semana 3	Andrés Moreira
15/09/2013	1.3	Actualización Semana 4	Andrés Moreira
22/09/2013	1.4	Actualización Semana 5	Andrés Moreira
29/09/2013	1.5	Actualización Semana 6	Andrés Moreira
07/10/2013	1.6	Actualización Semana 7	Andrés Moreira
07/10/2013	1.6	Revisión SQA	Valeria Rocha
13/10/2013	1.7	Actualización Semana 8	Andrés Moreira
20/10/2013	1.8	Actualización Semana 9	Andrés Moreira
21/10/2013	1.8	Revisión SQA	Valeria Rocha
26/10/2013	1.9	Actualización Semana 10	Andrés Moreira
27/10/2013	1.9	Revisión SQA	Valeria Rocha
3/11/2013	2.0	Actualización Semana 11	Andrés Moreira
3/11/2013	2.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
11/10/2013	2.1	Actualización Semana 12	Andrés Moreira
11/10/2013	2.1	Revisión SQA	Valeria Rocha
17/11/2013	2.2	Actualización Semana 13	Andrés Moreira
18/11/2013	2.2	Revisión SQA	Valeria Rocha
25/11/2013	2.3	Actualización Semana 14	Andrés Moreira
25/11/2013	2.3	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índice

[Mediciones realizadas](#)

[Mediciones de horas](#)

[Esfuerzo por integrante del equipo](#)

[Esfuerzo por disciplina](#)

[Esfuerzo histórico por integrante](#)

[Esfuerzo histórico por Línea de trabajo](#)

[Indicadores](#)

[Indicadores de Esfuerzo y Tiempo](#)

[Indicador de Cumplimiento de entregas](#)

[Entregables de prioridad Alta](#)

[Entregables de prioridad Media/Baja](#)

[Indicador de Desviación de fechas de entregas](#)

[Informe de Situación](#)

[Estado del proyecto](#)

[Desviaciones ocurridas](#)

[Incidencias encontradas](#)

[Estado de Riesgos](#)

[Evaluación](#)


Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado
Armand Ugon, Victoria	15	25.5	210.5
Cardozo, Javier	15	26.5	218.65
Cossio, Diego	15	18.5	216.75
De Munno, Luciano	15	24	211
Der Boghosian, Reyna	15	14	214.5
Dieci, Constanza	15	17.5	210.75
Lorier, Juan Pablo	15	14	228.5
Moreira, Andrés	15	15	220.85
Moreno, Santiago	15	18	215
Mori, Martin	15	15.5	213.25
Picca, Juan	15	15.5	220.25
Rocha, Valeria	15	16	213.5
Roldán, Fabiana	15	14	213.5
Rubio, Martin	15	15.25	211
Techera, Tamara	15	15	210.3
Yemini, Virginia	15	9	261.5


Esfuerzo por Integrante de equipo

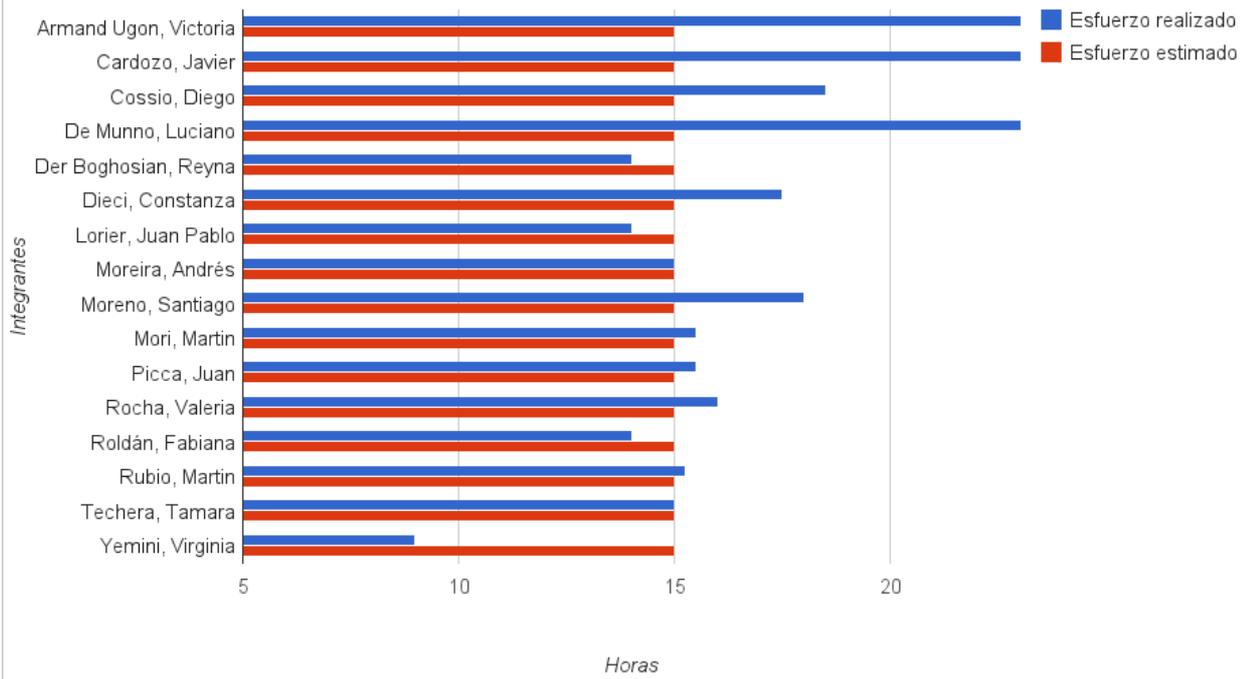


Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.


Disciplina	Esfuerzo realizado	Esfuerzo estimado	Esfuerzo acumulado
Línea Análisis/Req.	0	0	68
Línea Diseño	0	0	83.75
Línea Implementación	131	5	1020
Línea Gestión de Calidad	13	11	142.25
Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	5.5	6	61
Línea Gestión de Proyecto	60.75	66	907.85
Línea Verificación	36	37	324
Línea Comunicación	11	0	248.55
Línea Transición al entorno del usuario	8	12	53.5
Línea de Formación y Entrenamiento	4	0	457.85

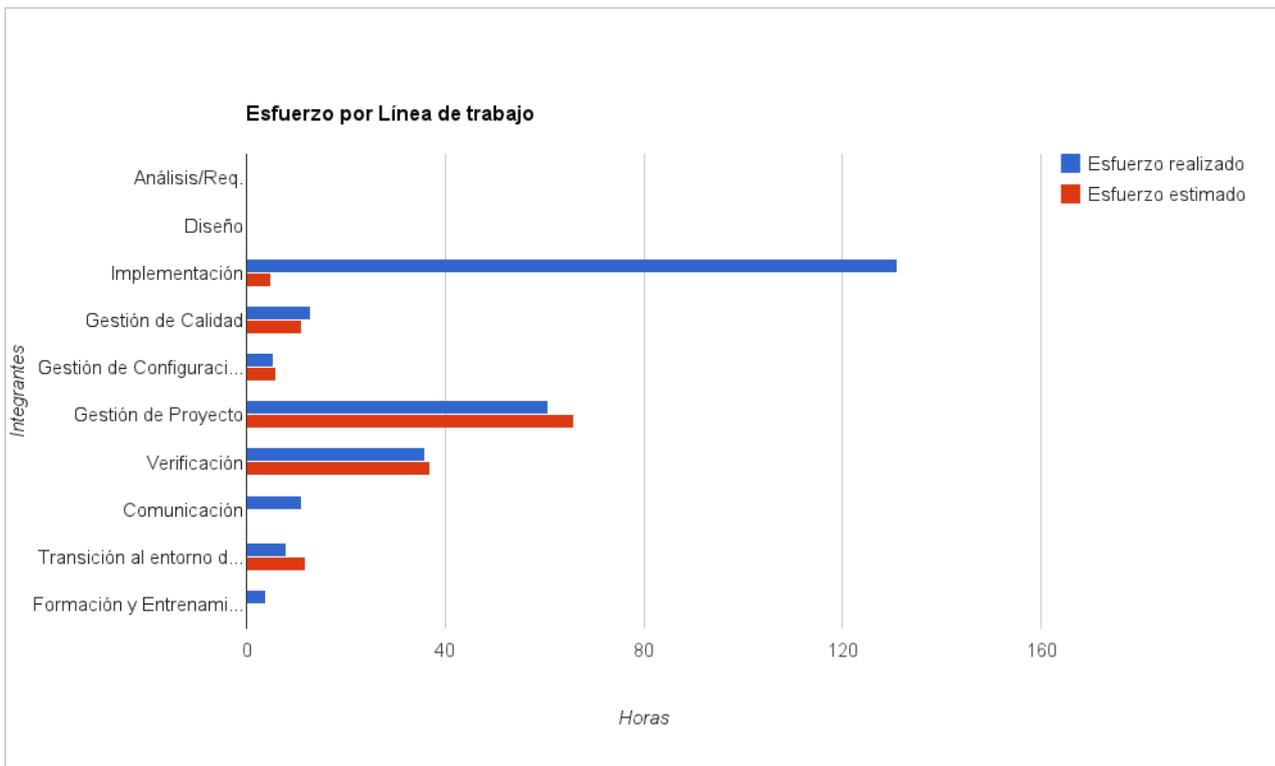

Esfuerzo histórico por integrante

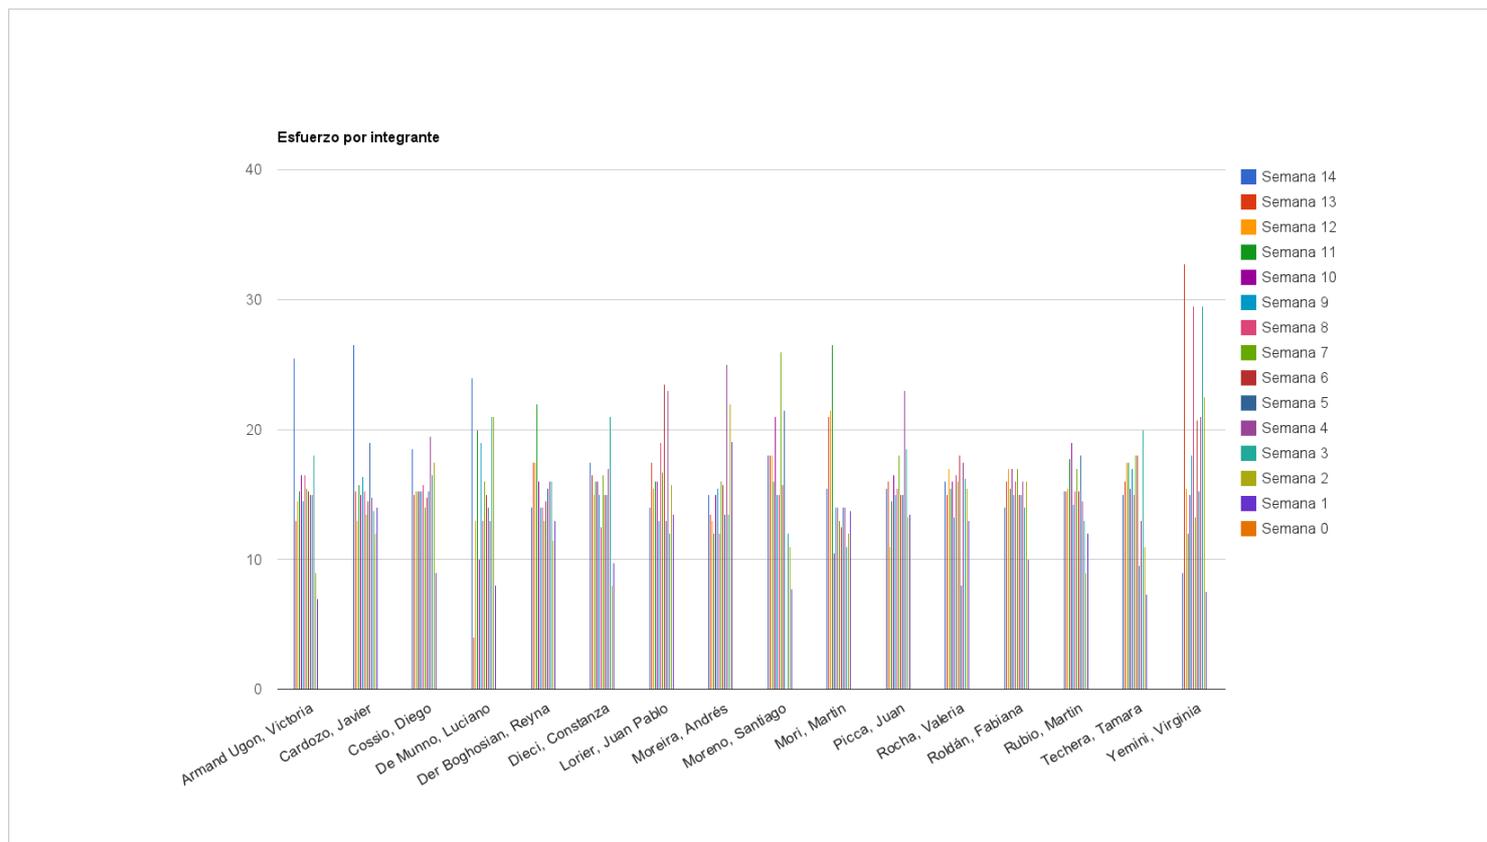

Esfuerzo histórico por Línea de trabajo

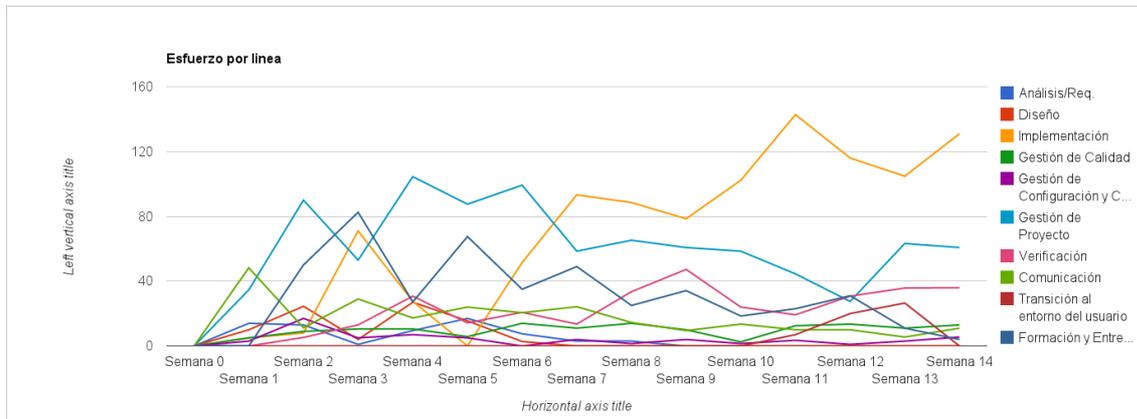

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Horás_estimadas_iteración	137
Avance_logrado_iteración	100 %
Horas_realizadas	273.25
Valor_Planificado	= Horas_estimadas_iteracion * 100% = 137
Valor_ganado	= Avance_logrado_iteración * Horas_estimadas_iteracion = 1 * 137 = 137
Índice_de_Productividad	Valor_Ganado / Hrs_Realizadas = 137 / 273.25 \approx 0.5
Esfuerzo_final	= Horas_estimadas / Índice_de_Productividad = 0hrs
Índice_de_Planificación	= Valor_Ganado / Valor_Planificado = 517 / 517 hrs = 1
Tiempo_Final	= Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación = 0 hrs / 1 = 0 hrs

Indicador de Cumplimiento de entregas

Entregables de prioridad Alta

Entregas en fecha	2
Entregas agendadas	2
Cumplimiento de entregas	= Entregas en fecha / Entregas_Agendadas = 2 / 2 = 100 %

Entregables de prioridad Media/Baja

Entregas en fecha	2
Entregas agendadas	2
Cumplimiento de entregas	= Entregas en fecha / Entregas_Agendadas = 2 / 2 = 100 %

Indicador de Desviación de fechas de entregas

No han habido desvíos hasta el momento en las fechas de entregas.

Informe de Situación

Estado del proyecto

Se completo el desarrollo del producto, y se cerraron todos los bugs reportados en la semana por el equipo de verificación así como algunos otros reportados por el cliente.

Nos queda por obtener de parte del cliente:

- Encuesta de satisfacción
- Aceptación del producto
- Aceptación del los documentos finales

Desviaciones ocurridas

No hubieron desviaciones.

Incidencias encontradas

No hay incidencias encontradas.

Estado de Riesgos

El único riesgo presente en este momento es:

1. Riesgo - Tardía validación para la aceptación del producto con el cliente

La validación con el cliente se demora debido a disponibilidad del cliente o por problemas del que el equipo no tiene las liberaciones en tiempo para validar con el cliente la aceptación del producto.

Evaluación

La fase de transición transcurrió de acuerdo a lo previsto, se trabajo en mejorar el producto, tanto de solucionar bugs y además, se hizo revisión de código y documentos.
