

# Proyecto logO

## Informe de Situación del Proyecto

### Versión 9.0

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/10/2013	9.0	Creación del documento	Lorena Ernst
20/10/2013	9.0	Revisión de SQA	Ezequiel Jardim
20/10/2013	9.0	Revisión	Cecilia Marcora

# Contenido

<b>1. MEDICIONES REALIZADAS .....</b>	<b>3</b>
1.1. MEDICIONES DE HORAS .....	3
<b>2. INFORME DE SITUACIÓN.....</b>	<b>6</b>
2.1. ESTADO DEL PROYECTO .....	6
2.2. DESVIACIONES OCURRIDAS .....	6
2.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS .....	6
2.4. ESTADO DE RIESGOS .....	6
<b>3. EVALUACIÓN.....</b>	<b>7</b>

## 1. Mediciones realizadas

### 1.1. Mediciones de horas


Se especifica la cantidad de horas estimadas en el Plan de Iteración y la cantidad de horas realizadas, por Línea de trabajo y por persona de acuerdo a lo informado en los Registros de Actividad y el procesamiento de los mismos. Por persona también se especifican las horas acumuladas así como el promedio que lleva realizadas.

**Nota:** El esfuerzo estimado es para todo el sprint (mejor dicho, lo asignado hasta el momento por ser scrum), mientras que el realizado es solo de la primera semana (informe semanal)

**Tener en cuenta que el informe pasado se entregó el día martes, por lo cual las horas del lunes y martes entraron en el informe anterior.**

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Lorena Ernst	52,5	13,42	159,8	17,26
Diego Ernst	29	2,5	112,58	12,51
Cecilia Marcora	49	14,5	179,23	19,91
Camila Csery	6	0	83	11,17
Ezequiel Jardim	49	25	171,31	18,94
Christian Bouvier	53	12,08	150,58	16,73
Álvaro Larrosa	23	4,25	152,91	16,77
Nicolás Ramponi	47,5	13,75	161,17	17,91
Agustín Young	49	16,5	147,5	16,39
Sebastián Mateo	12	7,5	149,75	16,64
Liber Dovat	18	10,58	173,03	19,23
Alexander Berguer	29,5	8,5	151,42	16,60
Pablo Cerveñansky	26	17	185,84	20,65
Martin Prino	23	7	146,25	16,25
Diego Pérez	28	12	181,42	20,05
Gonzalo Melgar	36	17,60	166,77	18,53

A continuación se muestra el gráfico de esfuerzo en horas por integrante

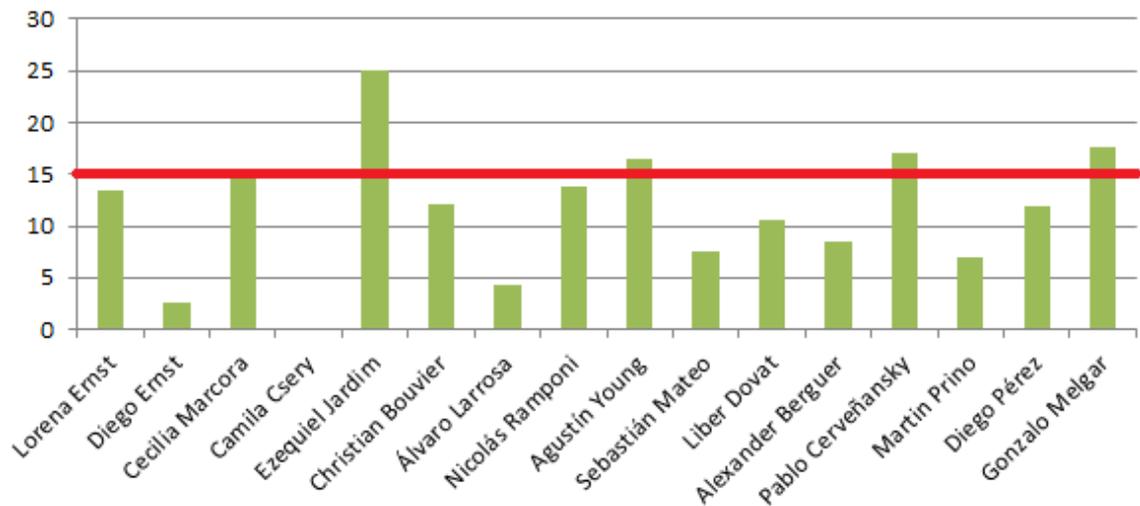

- Muchas de las horas, fueron dedicadas entre lunes y martes (lo cual se incluyó en el informe pasado).
- Camila se encuentra ausente por viaje.
- Diego Ernst y Álvaro tienen entrega de SED este Lunes, por lo cual estuvieron dedicados a eso.
- Sebastián, Martín y Alexander tienen menos horas porque estuvieron dedicados a redes.

Índice de productividad por implementador (productividad en la construcción del producto):

Valor ganado total = horas estimadas de implementación \* % avance iteración.

Puntos completados hasta el momento = 43

Puntos comprometidos en el sprint: 78

% avance iteración = % puntos realizados = 55%

horas estimadas de implementación (hasta el momento) = 215,84

Valor ganado total = 55% de 215,84 = 118,7

Nombre	Indice de productividad = valor_ganado_total / hrs_dedicadas
Gonzalo Melgar	6,74
Diego Ernst	47,48
Cecilia Marcora	8,19
Camila Csery	Sin productividad (0 hs dedicadas)
Diego Pérez	9,89
Christian Bouvier	9,83
Álvaro Larrosa	27,93
Martin Prino	16,96
Agustín Young	7,19
Sebastián Mateo	15,83
Liber Dovat	11,22
Alexander Berguer	13,97
Pablo Cerveñansky	6,98


A **MENOR** valor, mayor productividad.

Esfuerzo por disciplina

**Nota:** El esfuerzo estimado es para todo el sprint y el realizado corresponde a la primera semana (informe semanal)

Disciplina	Esfuerzo estimado (horas/hombre)	Esfuerzo realizado (horas/hombre)
Análisis/requerimientos	0	0
Diseño Gráfico	0	0
Comunicación	130	47
Gestión del proyecto	18	13,5
Implementación	215,84	93,08
SQA	12	5,5
SCM	4	2
Tecnologías	1	1
Verificación	45	24,5
Arquitectura	0	0
Diseño gráfico (logo de la aplicación)	0	0

A continuación se muestra la gráfica del porcentaje de esfuerzo realizado por disciplina.

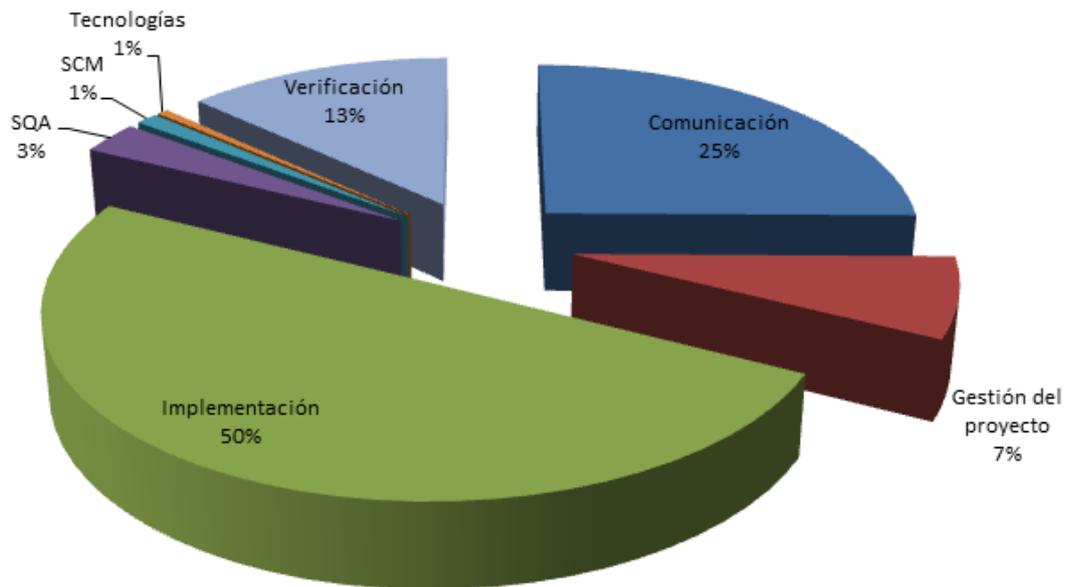

- Se observa que el área con más esfuerzo dedicado es la de Implementación, lo cual es esperado en este sprint, ya que la actividad se centró en finalizar las tareas desviadas del sprint 2 más las comprometidas para el sprint 3.
- Se observa un aumento en el área de comunicación, para abordar los problemas que estaba teniendo el equipo.

## 2. Informe de Situación

### 2.1. Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en la primera semana del sprint 3 (fase de desarrollo), cuyo objetivo es finalizar las historias desviadas del sprint 2 y abordar historias correspondientes al sprint actual.

Respecto a los objetivos de esta etapa, se han logrado completar 43 puntos de 78 comprometidos. (55% del sprint completado).

La próxima semana, se trabajara en completar el resto de las historias.

### 2.2. Desviaciones ocurridas

Se presentó una situación con el cliente, respecto a la visión de evaluación del curso, situación que se comunicó al director vía mail.

### 2.3. Incidencias encontradas

No hubo incidentes.

### 2.4. Estado de Riesgos

-No se espera que hayan entregas en la semana próxima, con lo cual el equipo estará enfocado.

-Se presenta el riesgo derivado de la visión del cliente respecto a la aprobación del curso, ante lo cual se decidió hablar con el director.

-Existe el riesgo de perder a Camila como integrante, ya que debido a los reiterados viajes, no estaría haciendo un aporte significativo al equipo.

### **3. Evaluación**

Se concluye que el equipo se adaptó mejor al trabajo en equipo, fijando horarios y días para reunirse. Por parte de la gestión y coordinación, hay un mayor control de las tareas y los plazos con los implementadores.

Se está haciendo una reunión de stand up diaria vía mail, a partir de lo cual se genera un diagrama de actividades para los implementadores, con plazos de entrega.

Dado el avance del sprint, sin duda esta medida ha logrado un efecto positivo en el equipo.
