

CONNECT! & WHERE IS MY FRIEND? INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO VERSIÓN 12.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/11/2013	12.0	Creación del documento	Valentina Da Silva
11/11/2013	12.1	Revisión SQA	Leonardo Clavijo

CONTENIDO

1.MEDICIONES REALIZADAS.....	3
1.1.MEDICIONES DE HORAS.....	3
1.1.1.Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2.Esfuerzo por disciplina.....	7
1.1.3.Esfuerzo por rol.....	9
2.INFORME DE SITUACIÓN.....	12
2.1.ESTADO DEL PROYECTO.....	12
2.2.DESVIACIONES OCURRIDAS.....	12
2.3.INCIDENCIAS ENCONTRADAS.....	12
2.4.ESTADO DE RIESGOS.....	12
2.5.EVALUACIÓN.....	12



1. MEDICIONES REALIZADAS

1.1. MEDICIONES DE HORAS


1.1.1. ESFUERZO POR INTEGRANTE DEL EQUIPO

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio Fase Inicial	Esfuerzo promedio Fase Elaboración	Esfuerzo promedio Fase Construcción
Valentina Da Silva	17,5	16,8	225,9	22,22	16,33	16,8
Gimena Bernadet	16,5	15	172,5	14	14,58	15
Federico García	19,5	16	184	13,1	17,08	19,5
Cristiano Coehlo	19	12	178,5	9,5	19,83	12
Rafael Olivera	13,5	12,5	198,5	17	16,83	12,5
Víctor Díaz	15	13	230,5	21,1	18,67	13
Dario Britos	16,5	17	210	17,9	17,25	17,9
Adrian Caretti	18,5	15,5	207,8	19,1	16,13	15,5
Emiliano Conti	22	18,5	219,8	16,16	20,08	18,5
Leonardo Clavijo	15,5	16	231	19,36	19,7	16
Nicolas Diaz	10,5	15	219,45	19,26	18,025	15
Martin Gaudioso	22	18	196	13,5	17,33	18
Gabriel Barbatto	23,5	22	176,5	8,9	18,75	22
Samuel Noble	15,5	14	229	15,36	22,5	14


Por más información ver GPRACG6v12 pestañas “Por Rol” y “Trazas por semana”.

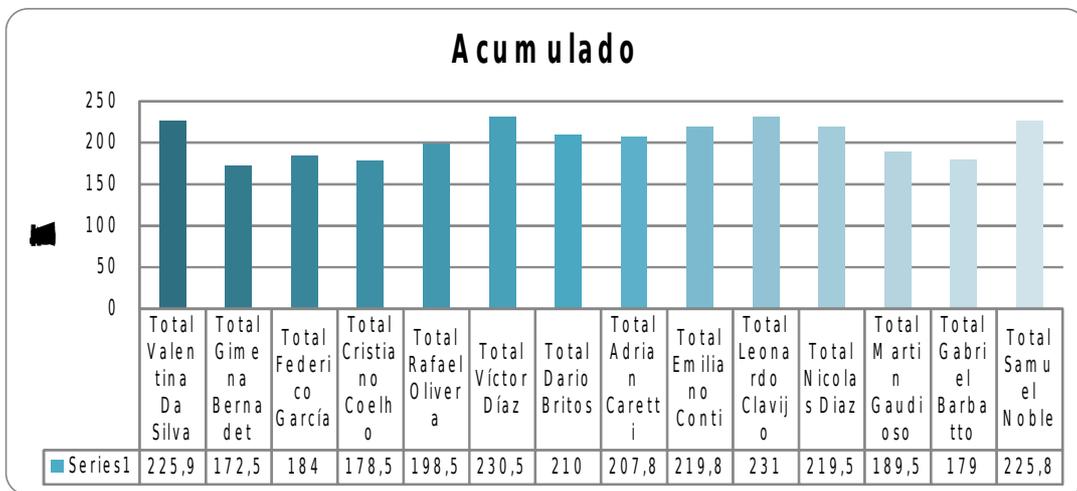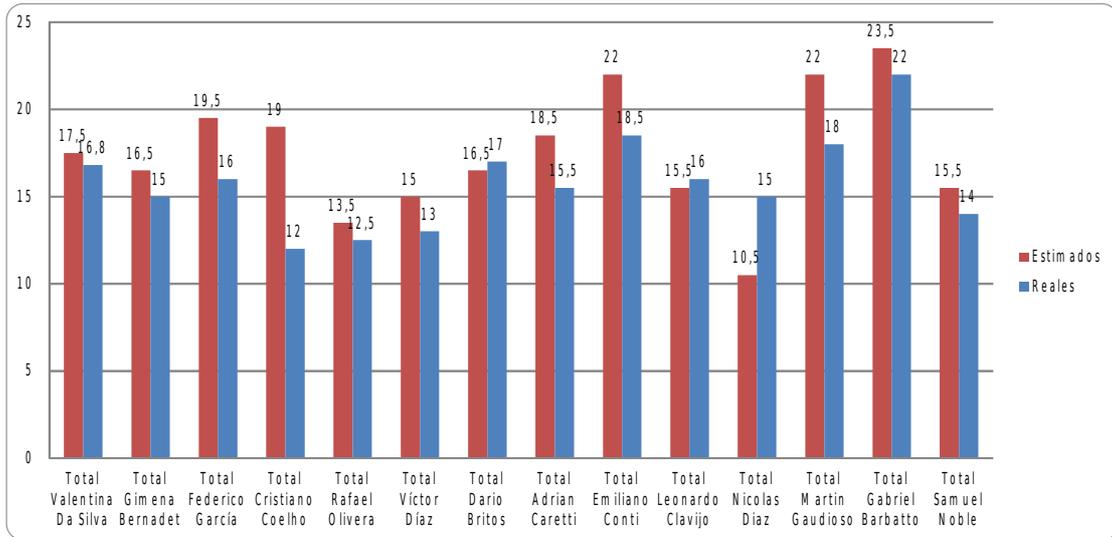


Acumulado en Fase Inicial

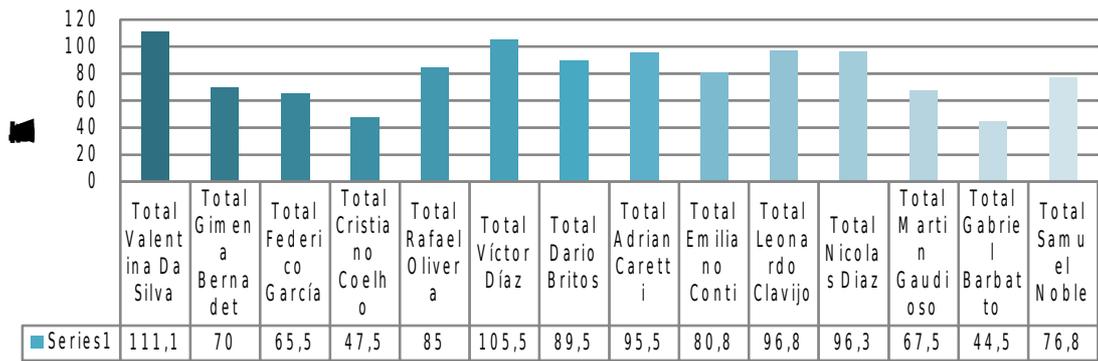


Acumulado en Fase Elaboración

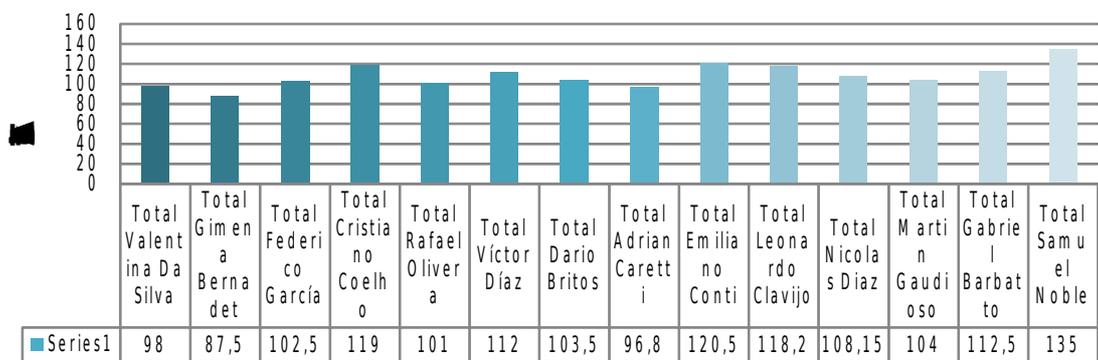

Acumulado en Fase Construcción





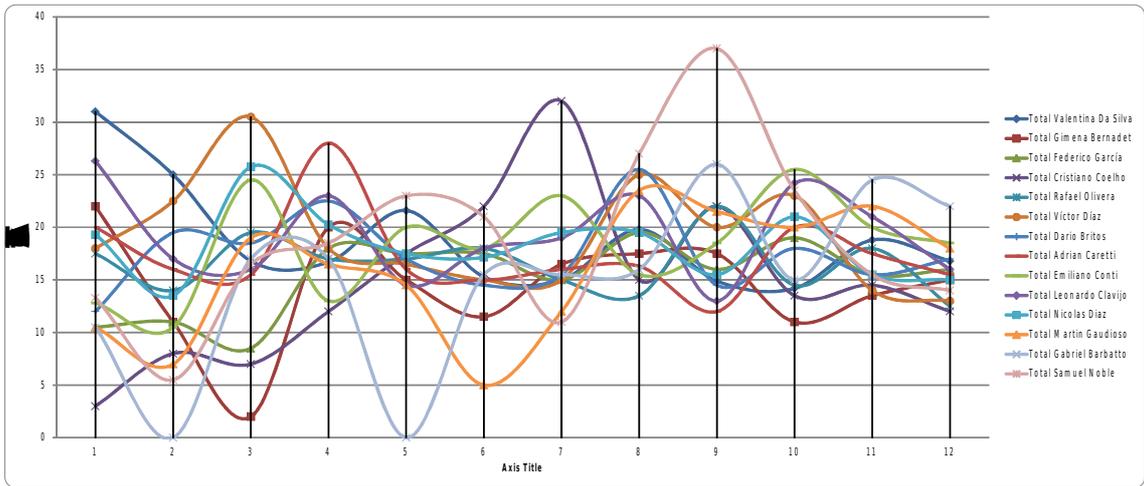


1.1.2. ESFUERZO POR DISCIPLINA


Disciplina	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Total Línea Análisis/Req.	0	0
Total Línea Diseño	9	9,5
Total Línea Implementación	107	91
Total Línea Gestión de Calidad	9	19
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	2	0,5
Total Línea Gestión de Proyecto	92	59,8
Total Línea Verificación	26	31
Total Línea Comunicación	0	9,5
Total Línea Transición al entorno del usuario	0	0

Por más información ver GPRACG6v12 pestañas “Por Línea de Trabajo” y “Trazas por semana”.


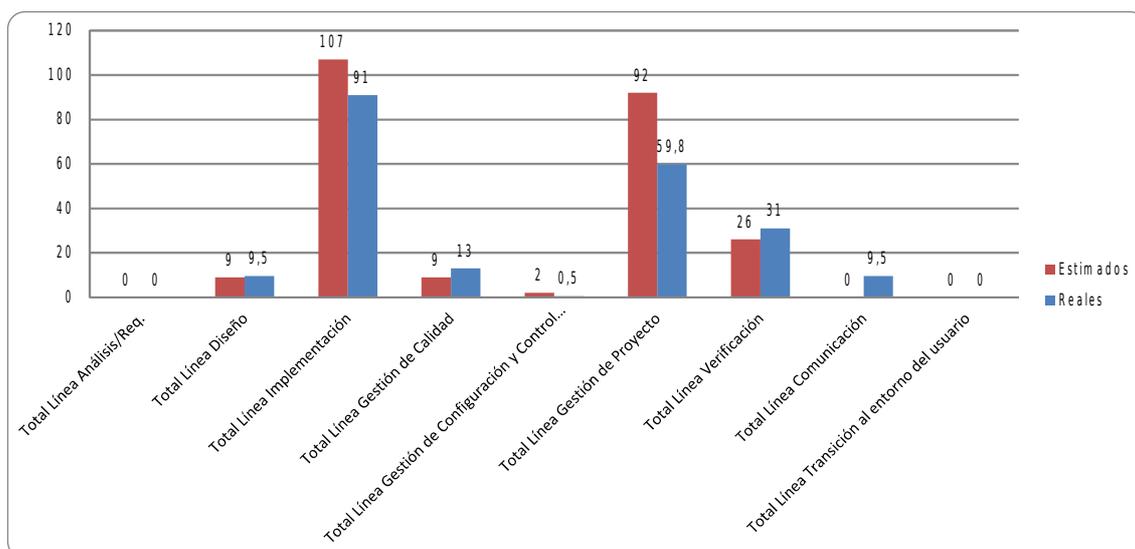


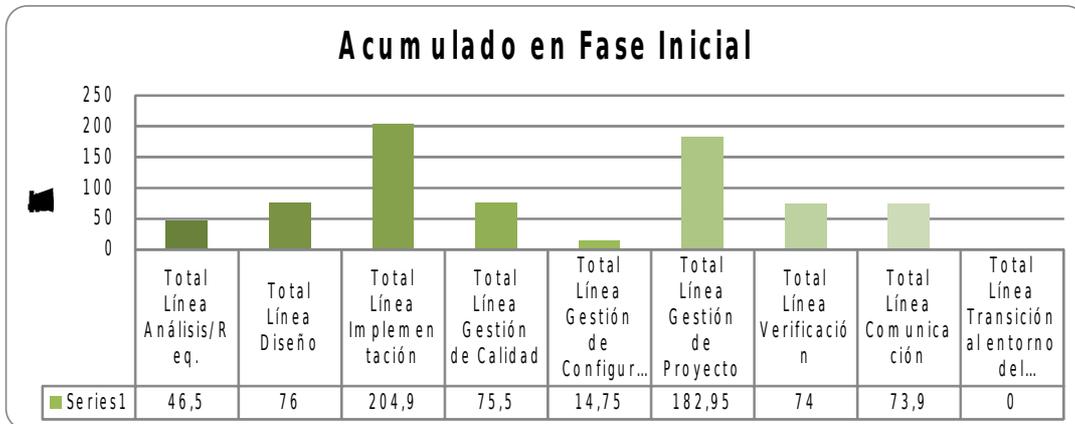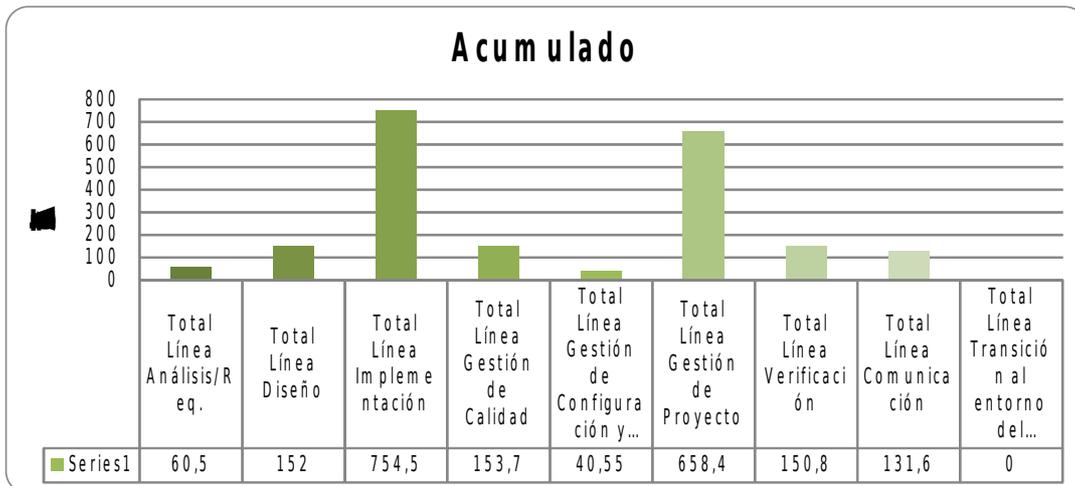

Acumulado en Fase Elaboración


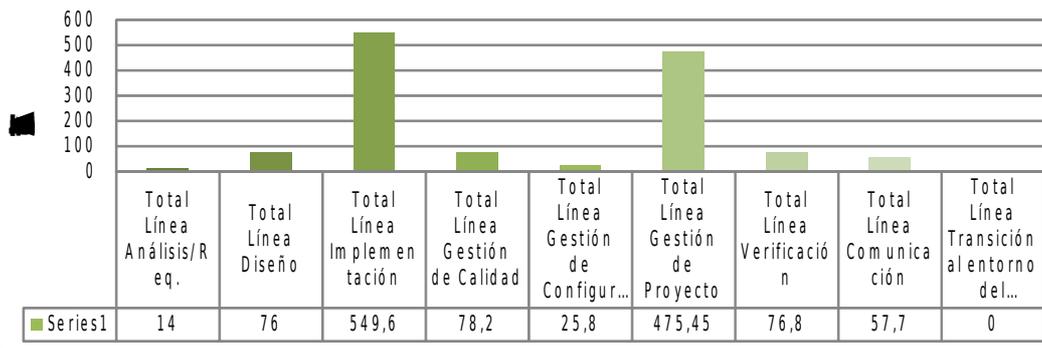


Acumulado en Fase Construcción

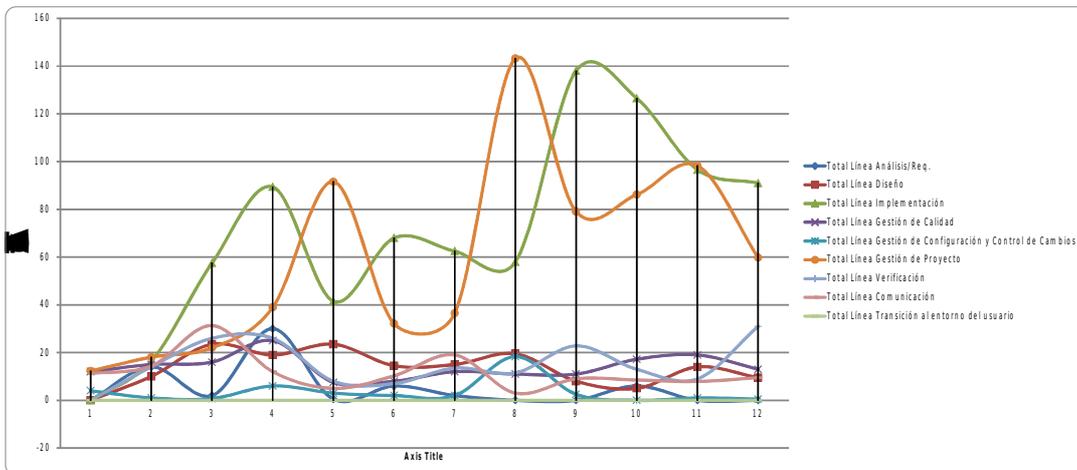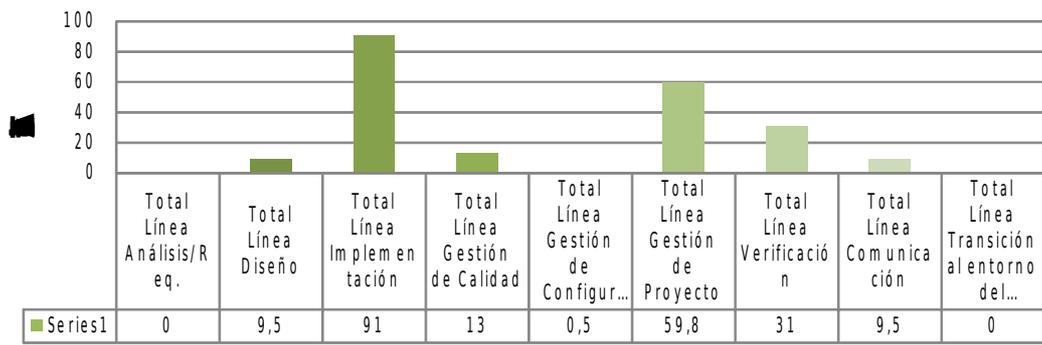


1.1.3. ESFUERZO POR ROL


Por más información ver GPRACG6v12 pestañas “Por Rol” y “Trazas por semana”.

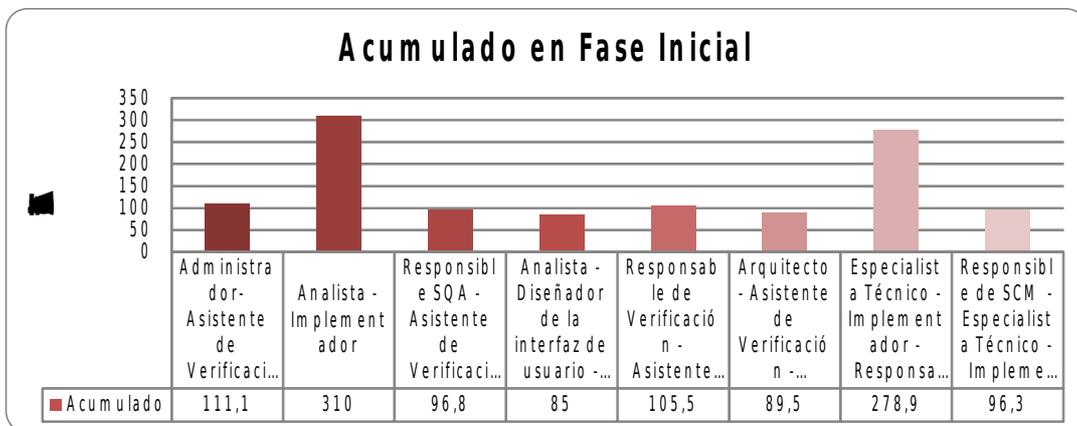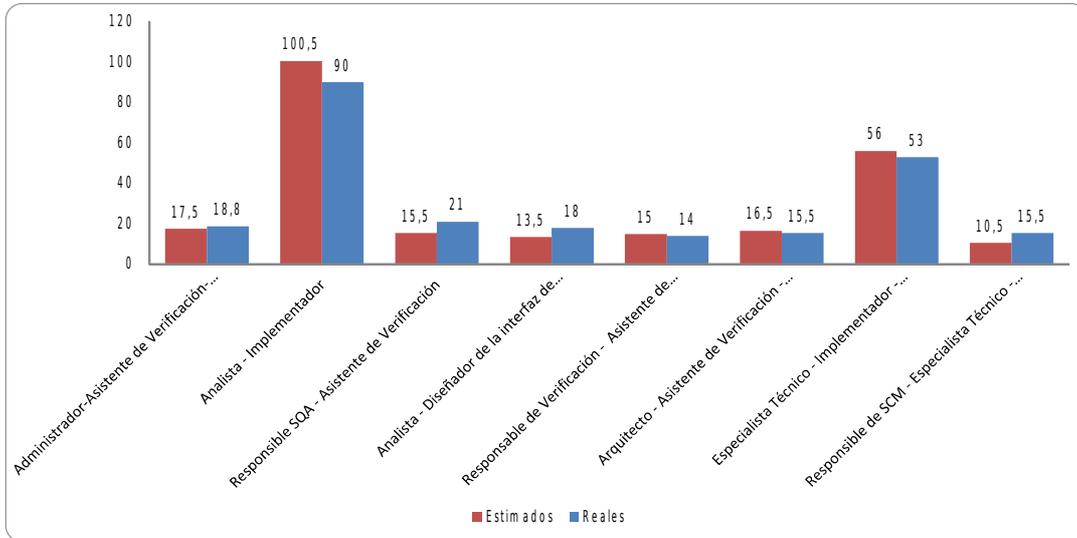


Acumulado en Fase Elaboración

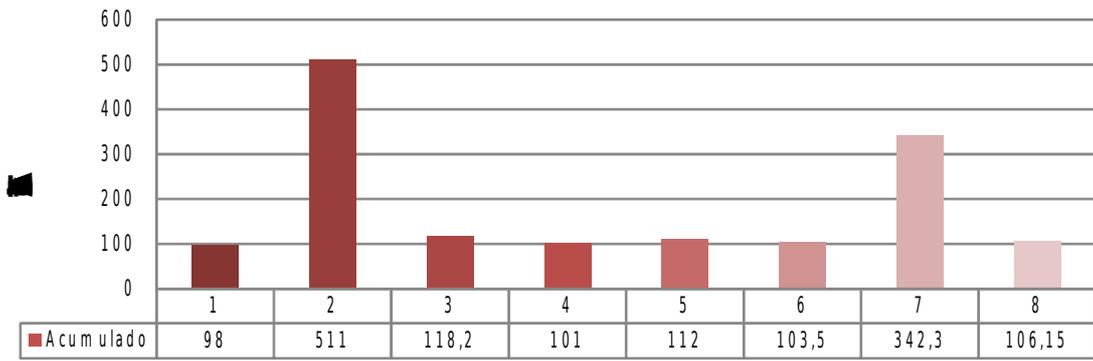


Acumulado en Fase Construcción

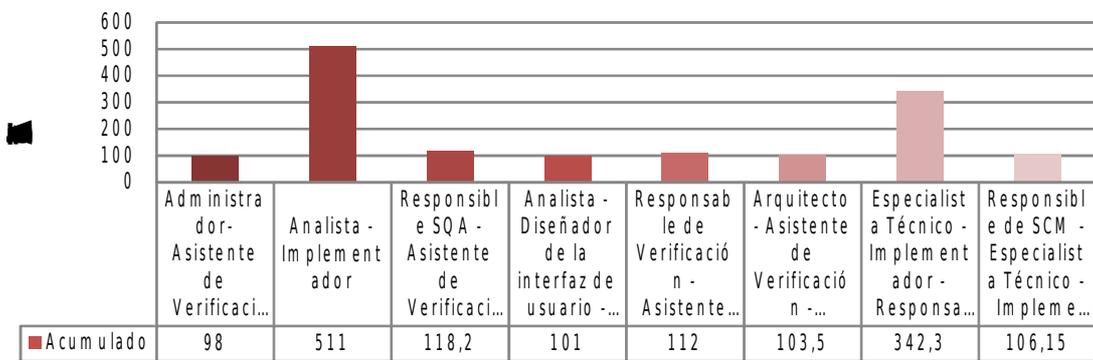

Acumulado

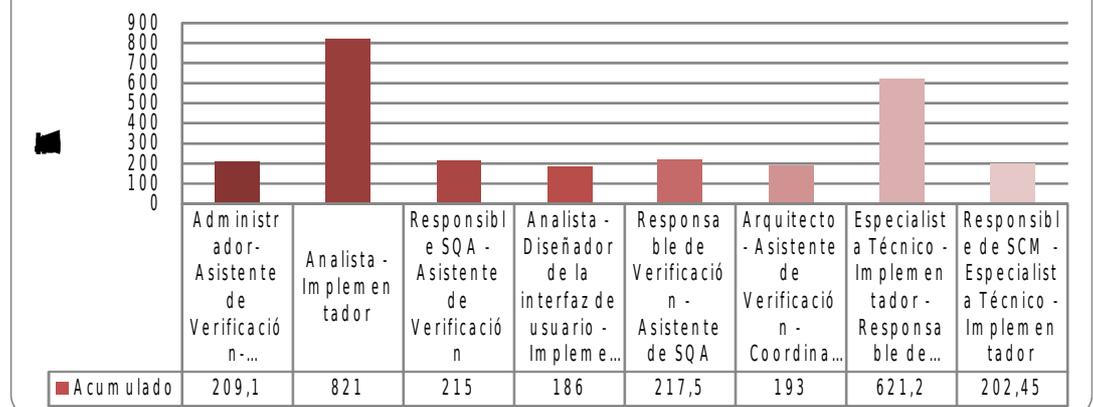

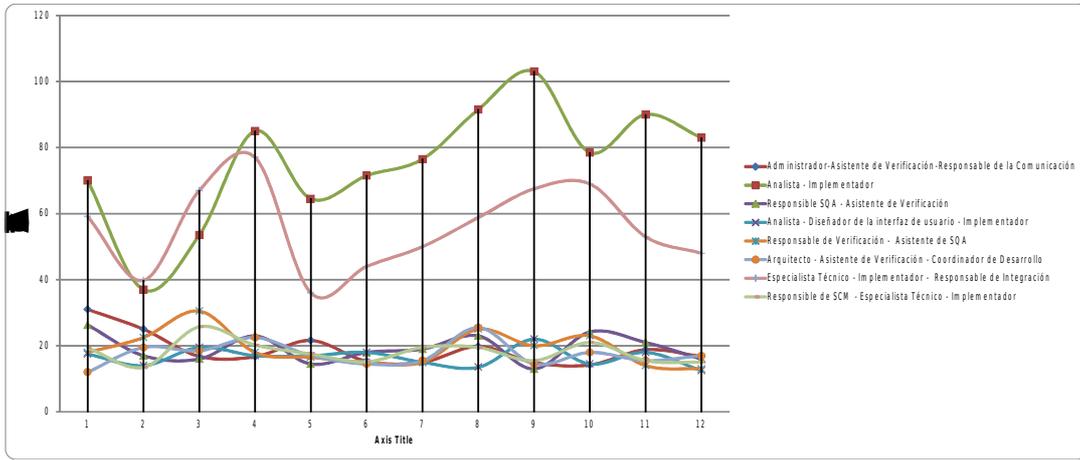

2. INFORME DE SITUACIÓN

2.1. ESTADO DEL PROYECTO

En lo que refiere a lo ocurrido esta semana, se pudo terminar la verificación y reportarle bugs a los programadores como se tenía planificado. El viernes 8 de noviembre se tuvo la reunión con el cliente al cual se le enseñaron videos demo de la aplicación Connect! en las plataformas Iphone, Windows 8, y Windows Phone, para Android se mostró la aplicación en directo mediante Team Viewer.

El cliente expresó su agrado por el diseño de de la interfaz en las plataformas Iphone y Android, y por la navegabilidad de la aplicación en general. Por otra parte, dijo que el diseño de la UI para las plataformas Windows 8 y Windows Phone era muy similar a Android, y estableció que para estas plataformas quería que utilizemos el framework metro.

Ya se han asignado recursos a esta tarea, de investigación del framework correspondiente, para migrar las pantallas correspondientes a las plataformas Windows 8 y Windows Phone, para ambas aplicaciones Connect! y WIMF.

Se estima que la migración UI total en ambas aplicaciones pueda ser culminada el viernes 15 de noviembre, donde se tiene planificado mostrarle nuevamente la aplicación Connect! con los cambios realizados, y mostrarle la aplicación WIMF por primera vez para obtener el feedback del cliente. La aplicación WIMF estaba planificada para ser enseñada al cliente mediante una demo el viernes 8, pero esto no se pudo realizar dado que la interfaz no se veía correctamente, pues no estaba adaptada para los diferentes tamaños de pantalla de los celulares. Se tiene planificado que para el lunes 11 de noviembre esto este culminado.

El martes 12 de noviembre se realizara la ultima liberación para testing.

2.2. DESVIACIONES OCURRIDAS

Existieron desviaciones en lo que se refiere a la linea de verificación, se tenía planificado que los casos de prueba fueran ejecutados por los testers entre el martes 5 y el miércoles 6 de noviembre, y contar con los reportes de prueba de todos los verificadores para el día jueves 7 de noviembre. Esto se vio retrasado por problemas que existieron en algunos ambiente de prueba de algunos verificadores, también uno de los verificadores tuvo problemas con su computadora personal, y no pudo realizar las pruebas en la fecha planificada. La verificación culmino el sábado 9 de noviembre por parte de todos los verificadores.

También se tenía planificado contar con videos de la aplicación WIMF para mostrarle al cliente, esto no se pudo realizar porque la UI de la aplicación no se veía correctamente en todas las plataformas. Se estima que esta tarea este finalizada el lunes 11 de noviembre.

2.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS

Luego de la demo realizada con el cliente el viernes 8 de noviembre, este expresó que quería que la UI de las aplicaciones Connect! Y WIMF utilizaran la interfaz METRO. Este hecho, hizo que se reviera la planificación de la semana que arranca el lunes 11 de noviembre, y se asignaron recursos para migrar la UI de esas plataformas. Se tiene planificado para el viernes 15 de noviembre culminar dicha migración.

2.4. ESTADO DE RIESGOS

Los riesgos se encuentran bastante estables a esta altura del proyecto.

2.5. EVALUACIÓN

Estamos llegando a la culminación del proyecto, lo que queda en esta etapa es realizar la última liberación para testing, y reportar los últimos bugs. Después perfeccionar la UI todo lo que se pueda dado que es una prioridad para el cliente.
