

CONNECT! & WHERE IS MY FRIEND?

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

VERSIÓN 14.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/11/2013	14	Creación del documento	Valentina Da Silva
24/11/2013	14.0	Revisión SQA	Leonardo Clavijo

CONTENIDO

1.MEDICIONES REALIZADAS.....	3
1.1.MEDICIONES DE HORAS	3
1.1.1.Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2.Esfuerzo por disciplina.....	6
1.1.3.Esfuerzo por rol.....	8
2.INFORME DE SITUACIÓN.....	11
2.1.ESTADO DEL PROYECTO	11
2.2.DESVIACIONES OCURRIDAS	11
2.3.INCIDENCIAS ENCONTRADAS	11
2.4.ESTADO DE RIESGOS	11
2.5.EVALUACIÓN	11




1. MEDICIONES REALIZADAS

1.1. MEDICIONES DE HORAS


1.1.1. ESFUERZO POR INTEGRANTE DEL EQUIPO

Nombre1	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio Fase Inicial	Esfuerzo promedio Fase Elaboración	Esfuerzo promedio Fase Construcción	Esfuerzo promedio Fase de Transición
Valentina Da Silva	11.5	10.3	256.5	22.22	16.33	18.55	10.3
Gimena Bernadet	14.5	12	200	14	14,58	15.25	12
Federico García	26.5	39.25	249.75	13,1	17,08	21.25	26.5
Cristiano Coehlo	16.5	10	194.5	9,5	19,83	9	10
Rafael Olivera	22.5	32	243.5	17	16,83	12.75	32
Víctor Díaz	27	20	264.5	21,1	18,67	13.5	20
Dario Britos	14.5	15.5	236.5	17,9	17,25	17.7	15.5
Adrian Caretti	17.5	11	235.3	19,1	16,13	16	11
Emiliano Conti	27.5	34	268.8	16,16	20,08	16.75	34
Leonardo Clavijo	24.5	28	274	19,36	19,7	15.5	28
Nicolas Diaz	14.5	9.5	246.45	19,26	18,025	16.5	9.5
Martin Gaudioso	6.5	3.5	207.5	13,5	17,33	13	3.5
Gabriel Barbatto	24.5	22.5	220	8,9	18,75	21.5	22.5
Samuel Noble	18.5	18	255.8	15.36	22.5	13	18


Por más información ver GPRACG6v14 pestañas "Por Rol" y "Trazas por semana".

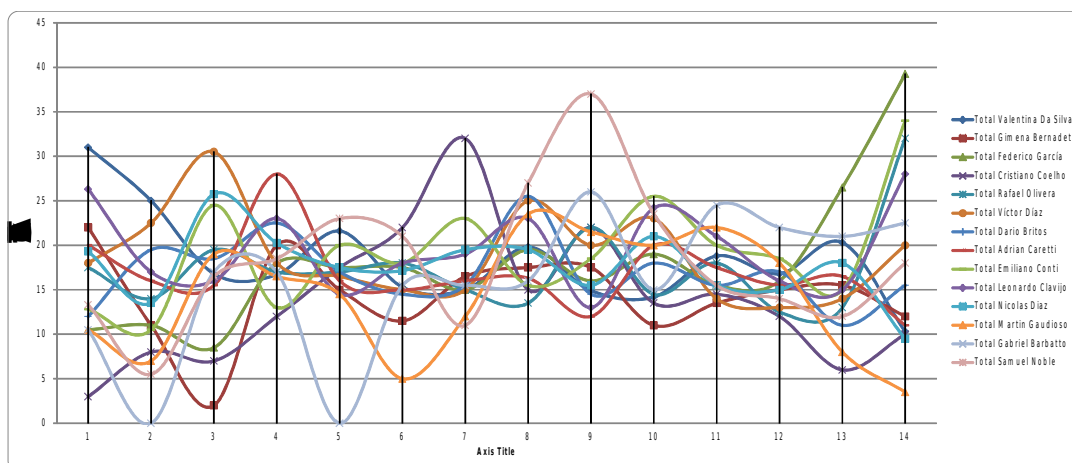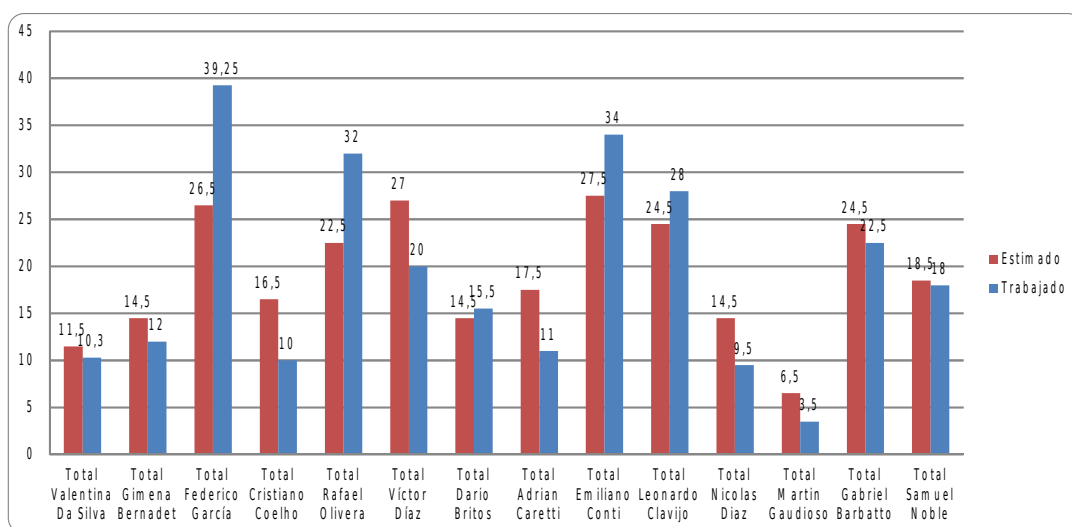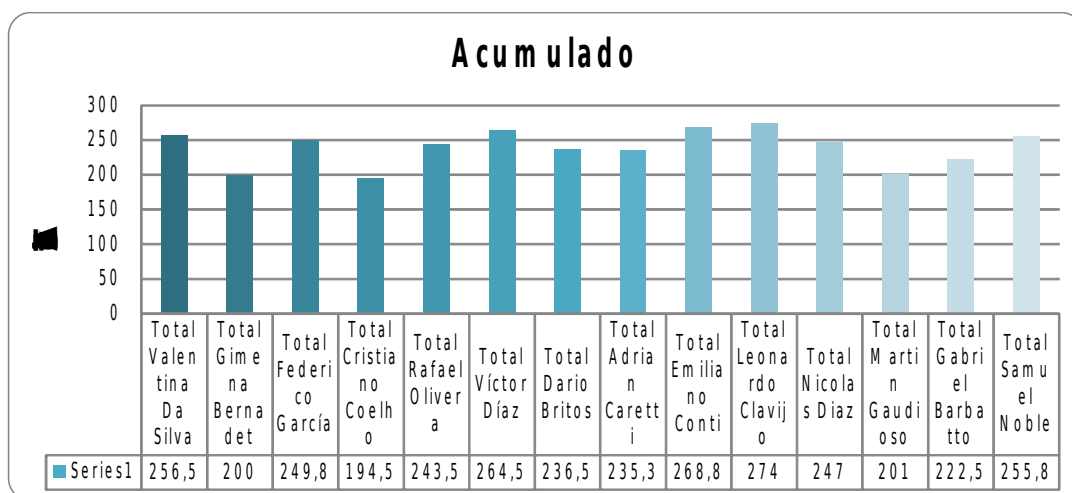


Acumulado en Fase Inicial

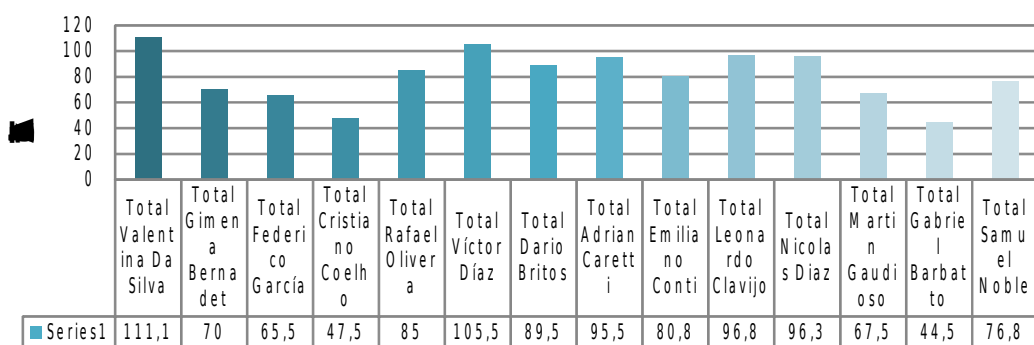

Acumulado en Fase Elaboración

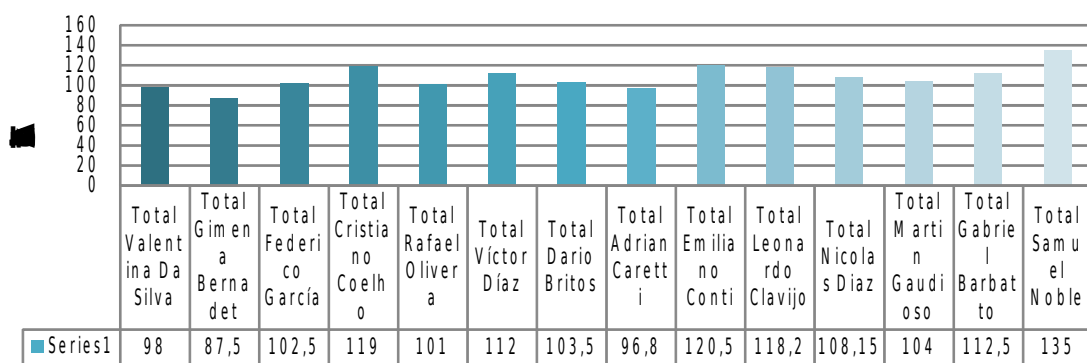


Acumulado en Fase Construcción

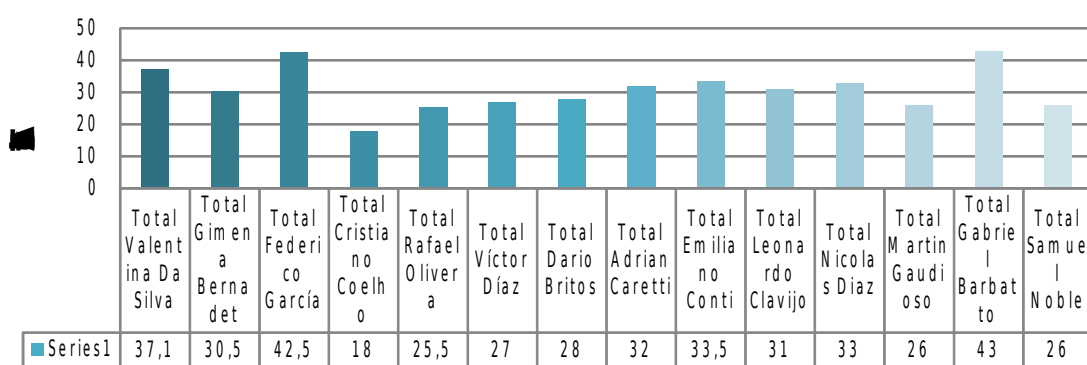


1.1.2. ESFUERZO POR DISCIPLINA

Disciplina	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Total Línea Análisis/Req.	0	0
Total Línea Diseño	3	8
Total Línea Implementación	102.5	129.75
Total Línea Gestión de Calidad	18	21
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	1	0
Total Línea Gestión de Proyecto	107	55.3
Total Línea Verificación	38	37
Total Línea Comunicación	0	22.5
Total Línea Transición al entorno del usuario	0	0


Por más información ver GPRACG6v14 pestañas "Por Línea de Trabajo" y "Trazas por semana".

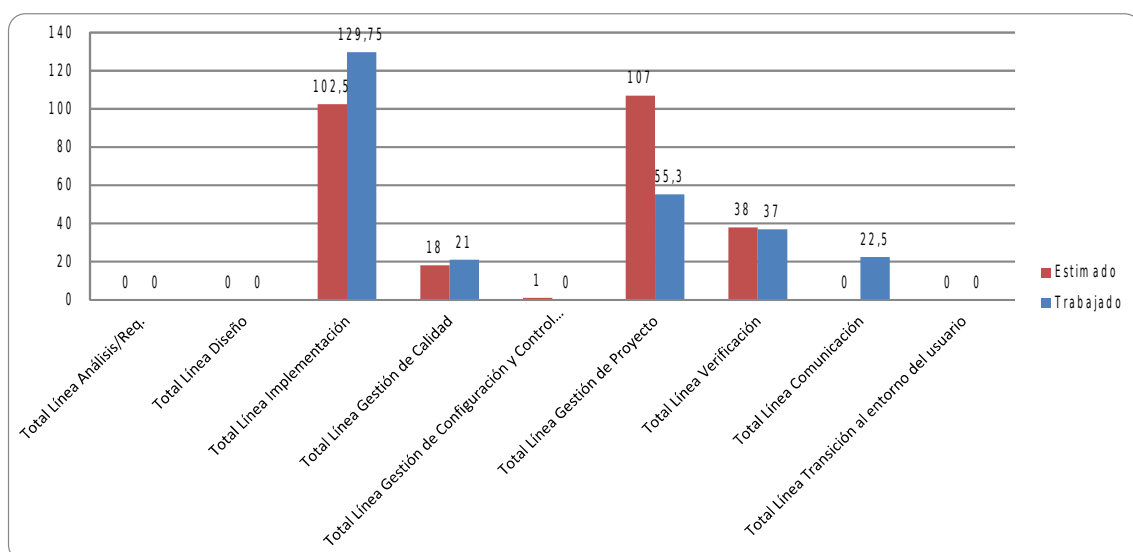


Acumulado en Fase Inicial

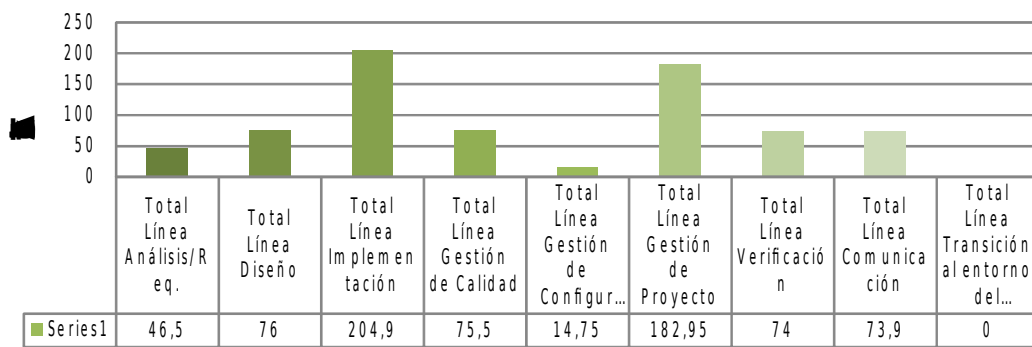


Acumulado en Fase Elaboración

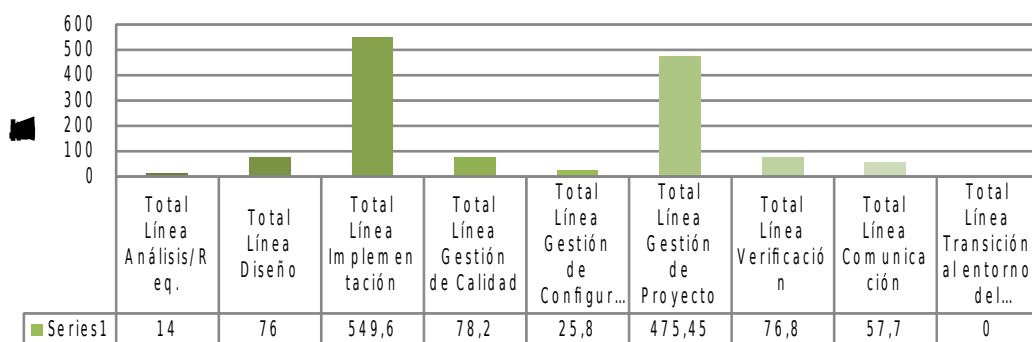


Acumulado en Fase Construcción



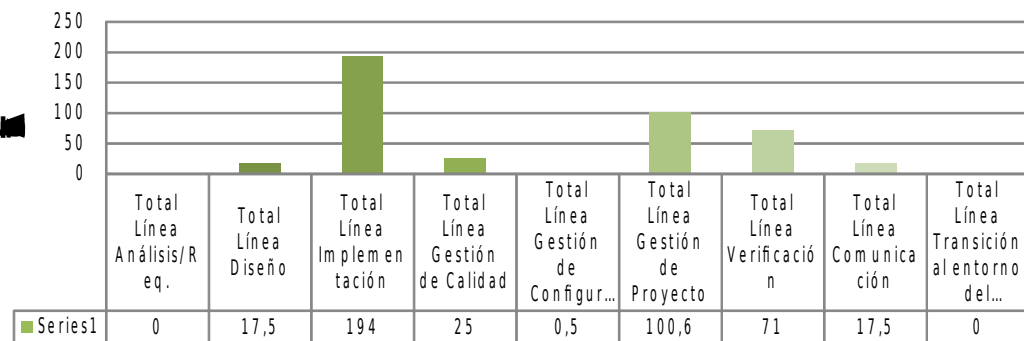


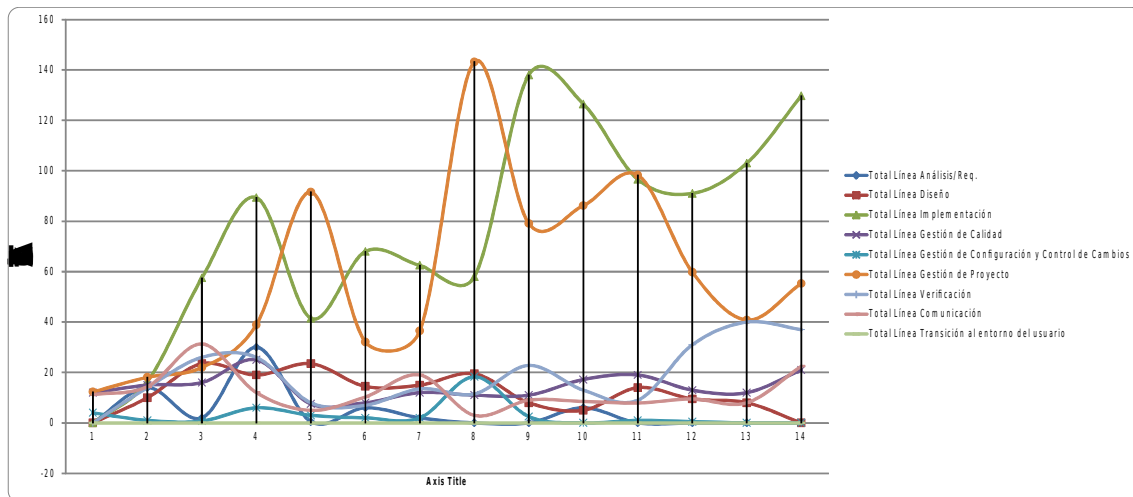



1.1.3. ESFUERZO POR ROL

Por más información ver GPRACG6v14 pestañas "Por Rol" y "Trazas por semana".

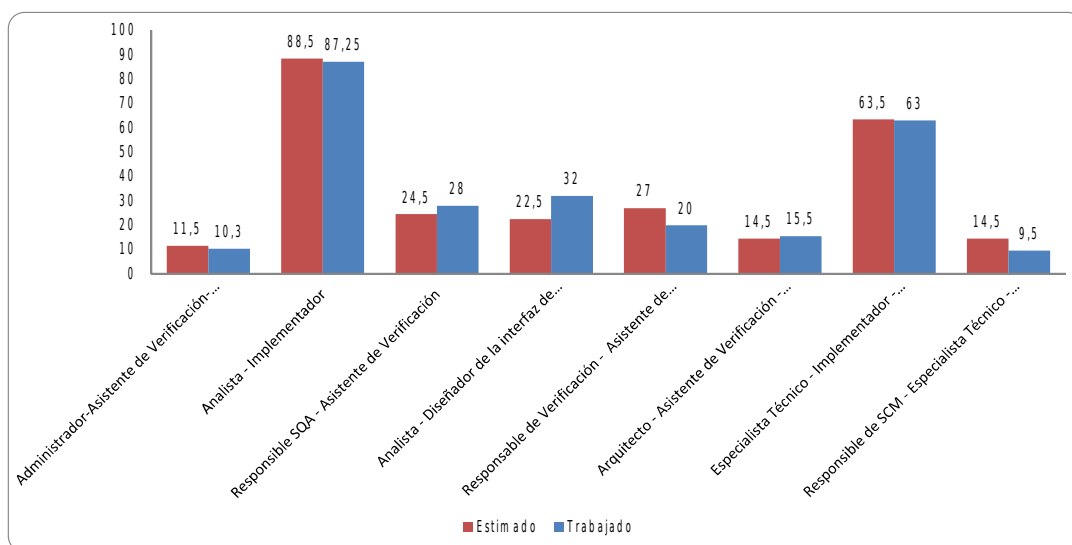

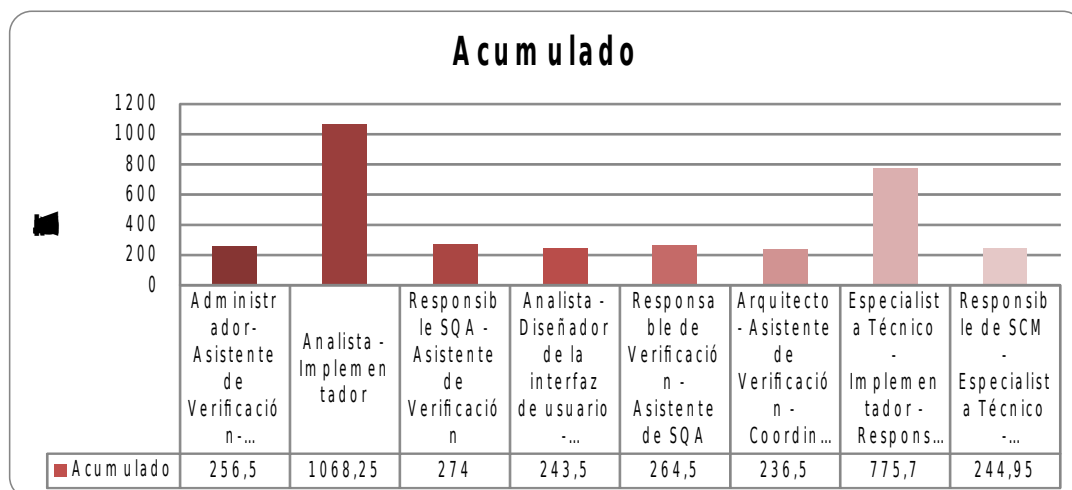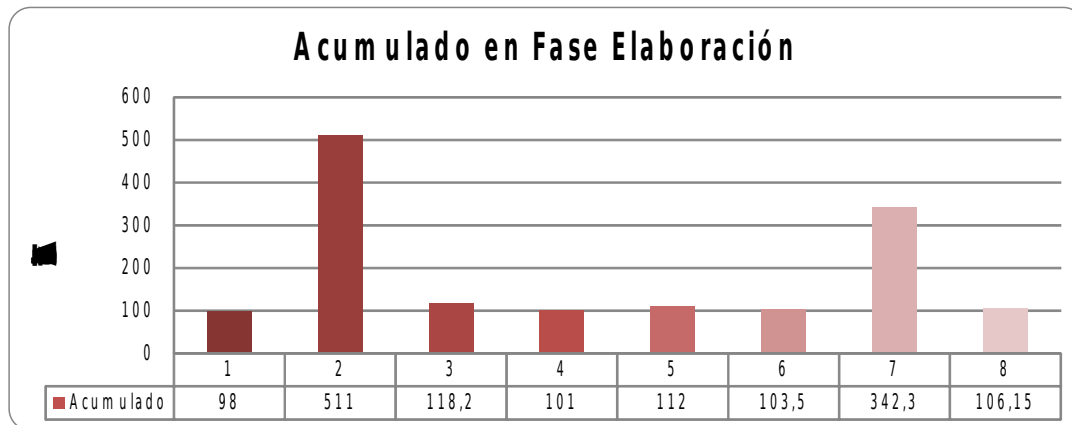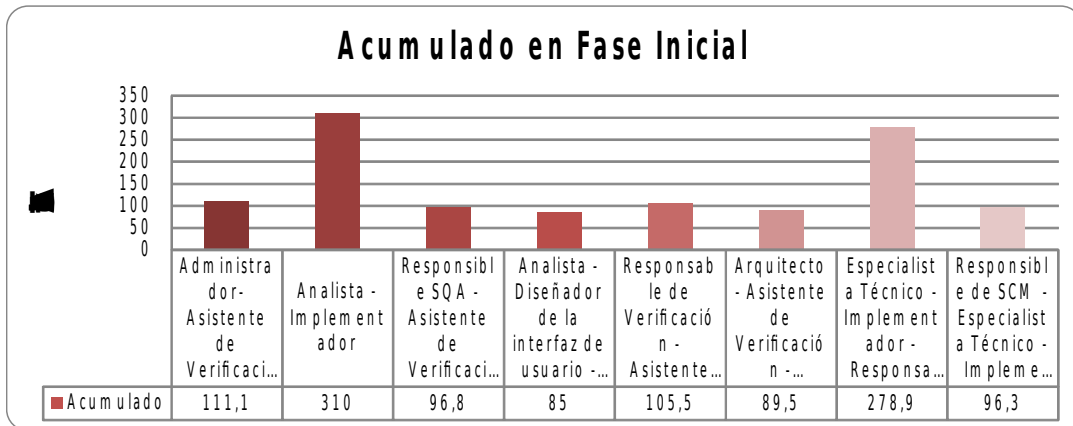

Acumulado en Fase Construcción

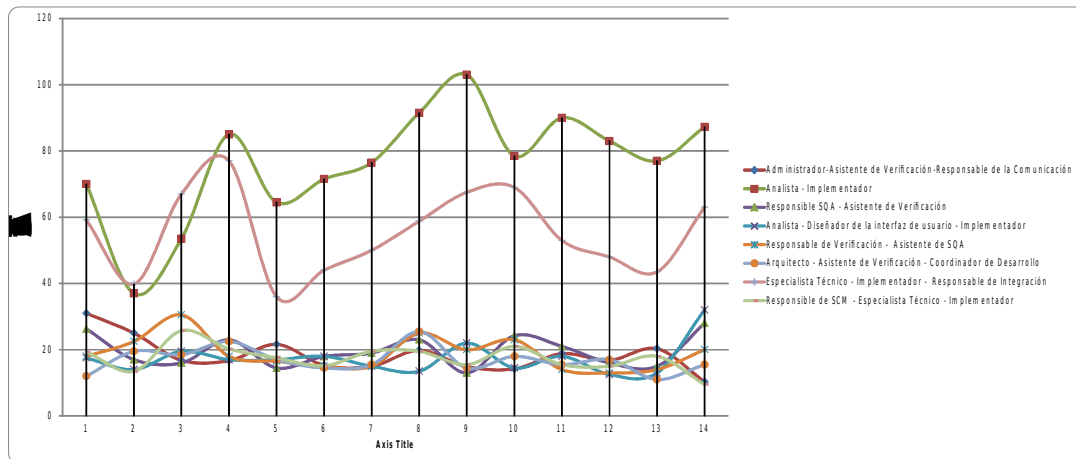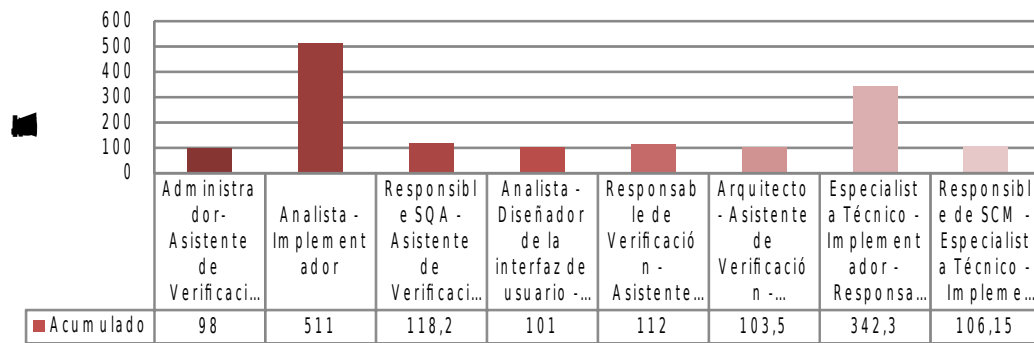

2. INFORME DE SITUACIÓN

2.1. ESTADO DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra por finalizar restando solamente realizar la presentación final y entregar todo el material requerido para la Memoria Organizacional. También se espera poder remontar la evaluación del director del proyecto ante el grupo con la presentación final.

2.2. DESVIACIONES OCURRIDAS

No han existido desviaciones respecto a lo planificado esta semana.

2.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS

No han existido incidencias no planificadas esta semana en general.

2.4. ESTADO DE RIESGOS

Ya estamos llegando a la culminación del proyecto, el producto final será entregado al cliente el lunes 24 de noviembre de 2013, junto con documentación técnica y de verificación correspondiente. En esta altura del proyecto los riesgos están estables. Todo lo que se pudo hacer para mitigar los riesgos que se presentaron a lo largo del proyecto ya se realizó, ahora no queda más que esperar la devolución del cliente y realizar la presentación final.

2.5. EVALUACIÓN

Hemos llegado a la culminación del proyecto, como grupo supimos sobrellevar las dificultades que se nos presentaron al comienzo del mismo. Establecimos una planificación que sirvió como guía de trabajo para todos, comenzamos a utilizar estimaciones que nos fueron de gran utilidad a la hora de asignar tareas a los integrantes del equipo. En resumen supimos asimilar el proceso y sacar ventaja del mismo. Ahora nos queda preparar la presentación final, y entregar todo el material requerido para la Memoria Organizacional.
