


BeatIt!

Informe de Situación del Proyecto

Versión 3.1.4

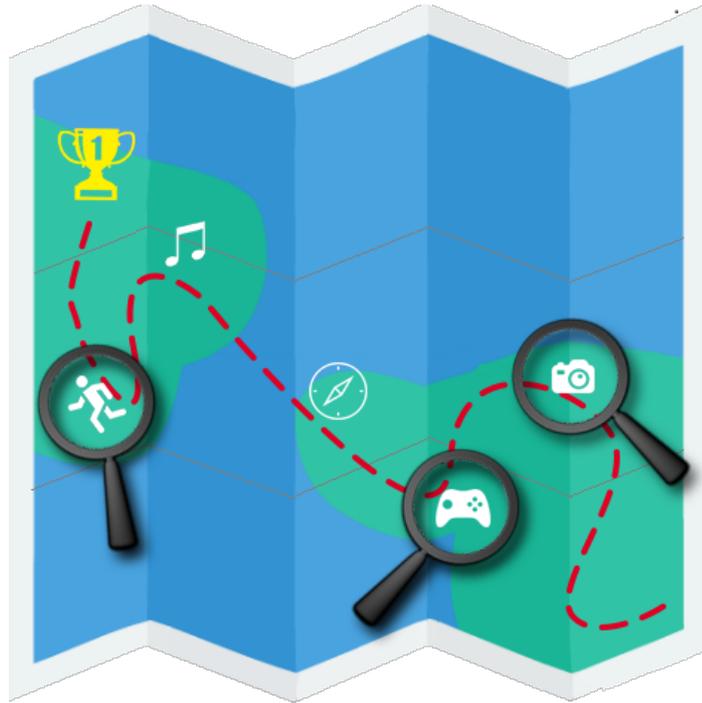

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	0	Primer Versión	Raúl Speroni
24/08/2014	1	Revisión de SQA	Pablo Olivera
30/08/2014	2	Segunda Versión	Raúl Speroni
31/08/2014	3	Revisión de SQA	Pablo Olivera
07/09/2014	4	Tercer Versión	Raúl Speroni
07/09/2014	5	Revisión de SQA	Pablo Olivera
13/09/2014	1.2.1	Cuarta Versión	Raúl Speroni
14/09/2014	1.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
21/09/2014	2.1.1	Quinta versión	Raúl Speroni
21/09/2014	2.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera

28/09/2014	2.1.3	Sexta Versión	Raúl Speroni
05/10/2014	2.2.1	Septima Version	Raúl Speroni
05/10/2014	2.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
12/10/2014	2.2.3	Octava Versión	Raúl Speroni
12/10/2014	2.2.4	Revisión SQA	Pablo Olivera
19/10/2014	3.1.1	Novena Versión	Raúl Speroni
19/10/2014	3.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.3	Actualización de los datos a la semana 10.	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.4	Revisión SQA	Emiliano Vázquez

Contenido

- [1. Mediciones realizadas](#)
 - [1.1 Mediciones de horas](#)
 - [1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo](#)
 - [1.1.2 Esfuerzo por disciplina](#)
- [2. Indicadores](#)
 - [2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo](#)
 - [2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas](#)
 - [2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas](#)
- [3. Informe de Situación](#)
 - [3.1 Estado del proyecto](#)
 - [3.2 Desviaciones ocurridas](#)
 - [3.3 Incidencias encontradas](#)
 - [3.4 Estado de Riesgos](#)
- [4. Evaluación](#)


1. Mediciones realizadas

Se utiliza Redmine como apoyo a la gestión del proceso, se miden cantidad de tareas por iteración, largo de tareas por día, horas estimadas por tarea, horas dedicadas por tarea, horas dedicadas por persona.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Semana 10	Total
Alejandro Brusco	20,00	173,25
Cristian Bauza	9,00	147,50
Emiliano Vazquez	5,00	174,50
Felipe García	29,00	143,50
Gonzalo Javiel	12,50	151,00
Joaquin Velazquez	8,50	142,50
Luciana Martinez	23,00	137,50
Martin Alayon	13,50	148,50
Martin Berguer	18,00	202,00
Martin Steglich	17,00	153,00
Pablo Olivera	14,80	148,50
Raúl Speroni	3,00	148,55
Total	173,30	1.870,30

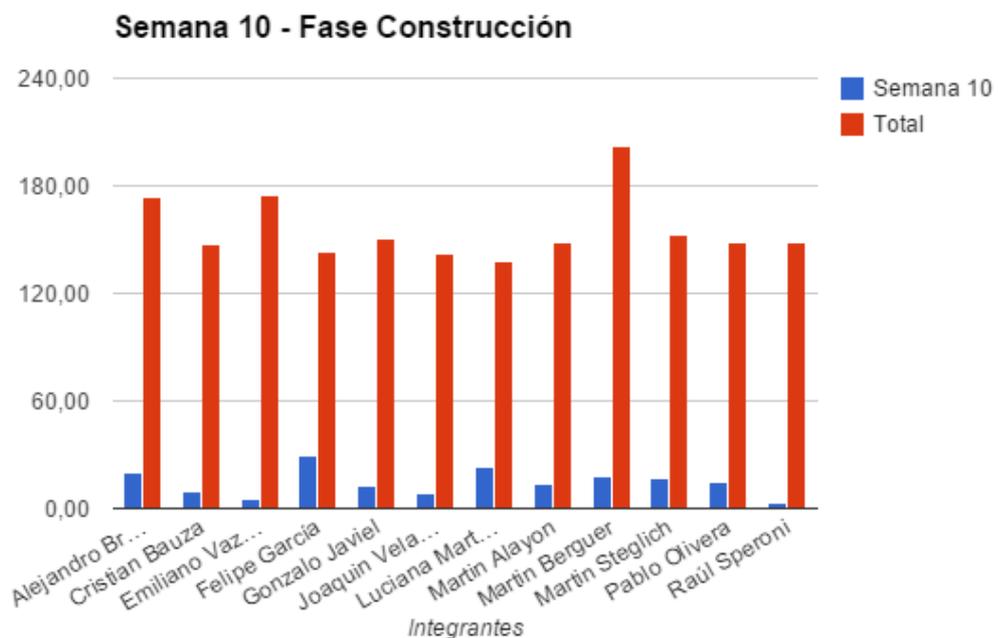

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

N/A

2. Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

Entregas_en_Fecha = 17

Entregas_Agendadas = 23

Cumplimiento de Entregas = $17/23 = 0.74$

2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

3. Informe de Situación

3.1 Estado del proyecto

La implementación va avanzando bien, según los desvíos de las estimaciones, el esfuerzo requerido para terminar el desarrollo todavía es menor al esfuerzo disponible estimado. Luego de la presentación del segundo prototipo al cliente se deberá completar la fase Beta del producto en cuatro semanas.

3.2 Desviaciones ocurridas

N/A

3.3 Incidencias encontradas

No hubieron eventos no planificados que afectaron el desarrollo de esta iteración.

3.4 Estado de Riesgos

Se están monitoreando todos los riesgos identificados hasta el momento, han ocurrido algunos y han variado otros. La ocurrencia y la evolución de los riesgos se detalla en el documento de Riesgos.

4. Evaluación

La situación del proyecto es positiva y el avance estable. Los equipos de implementación están funcionando correctamente. En líneas generales desde el punto de vista de la gestión del proyecto debemos hacer un seguimiento más de cerca a la implementación para ayudar lo más posible a su correcto desempeño.
