

# BeatIt!

## Informe de Situación del Proyecto

### Versión 3.2.4



## Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	0	Primer Versión	Raúl Speroni
24/08/2014	1	Revisión de SQA	Pablo Olivera
30/08/2014	2	Segunda Versión	Raúl Speroni
31/08/2014	3	Revisión de SQA	Pablo Olivera
07/09/2014	4	Tercer Versión	Raúl Speroni
07/09/2014	5	Revisión de SQA	Pablo Olivera
13/09/2014	1.2.1	Cuarta Versión	Raúl Speroni
14/09/2014	1.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
21/09/2014	2.1.1	Quinta versión	Raúl Speroni
21/09/2014	2.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera

28/09/2014	2.1.3	Sexta Versión	Raúl Speroni
05/10/2014	2.2.1	Septima Version	Raúl Speroni
05/10/2014	2.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
12/10/2014	2.2.3	Octava Versión	Raúl Speroni
12/10/2014	2.2.4	Revisión SQA	Pablo Olivera
19/10/2014	3.1.1	Novena Versión	Raúl Speroni
19/10/2014	3.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.3	Actualización de los datos a la semana 10.	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.4	Revisión SQA	Emiliano Vázquez
02/11/2014	3.2.1	Actualización de los datos a la semana 11.	Raúl Speroni
02/11/2014	3.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
09/11/2014	3.2.3	Actualización de los datos a la semana 12	Raúl Speroni
09/11/2014	3.2.4	Revisión SQA	Pablo Olivera

# Contenido

- [1. Mediciones realizadas](#)
  - [1.1 Mediciones de horas](#)
    - [1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo](#)
    - [1.1.2 Esfuerzo por disciplina](#)
- [2. Indicadores](#)
  - [2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo](#)
  - [2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas](#)
  - [2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas](#)
- [3. Informe de Situación](#)
  - [3.1 Estado del proyecto](#)
  - [3.2 Desviaciones ocurridas](#)
  - [3.3 Incidencias encontradas](#)
  - [3.4 Estado de Riesgos](#)
- [4. Evaluación](#)

## 1. Mediciones realizadas


Se utiliza Redmine como apoyo a la gestión del proceso, se miden cantidad de tareas por iteración, largo de tareas por día, horas estimadas por tarea, horas dedicadas por tarea, horas dedicadas por persona.

### 1.1 Mediciones de horas

#### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Semana 12	Total
Alejandro Brusco	1.00	181.25
Cristian Bauza	12.50	164.00
Emiliano Vazquez	10.50	195.00
Felipe García	0.00	154.00
Gonzalo Javiel	15.50	171.50
Joaquin Velazquez	23.00	165.50
Luciana Martinez	14.00	164.50
Martin Alayon	15.50	174.50
Martin Berguer	5.00	227.00
Martin Steglich	20.50	181.50
Pablo Olivera	15.40	175.30
Raúl Speroni	22.35	181.90

#### Esfuerzo por Integrante - Iteración 2 - Fase Construcción

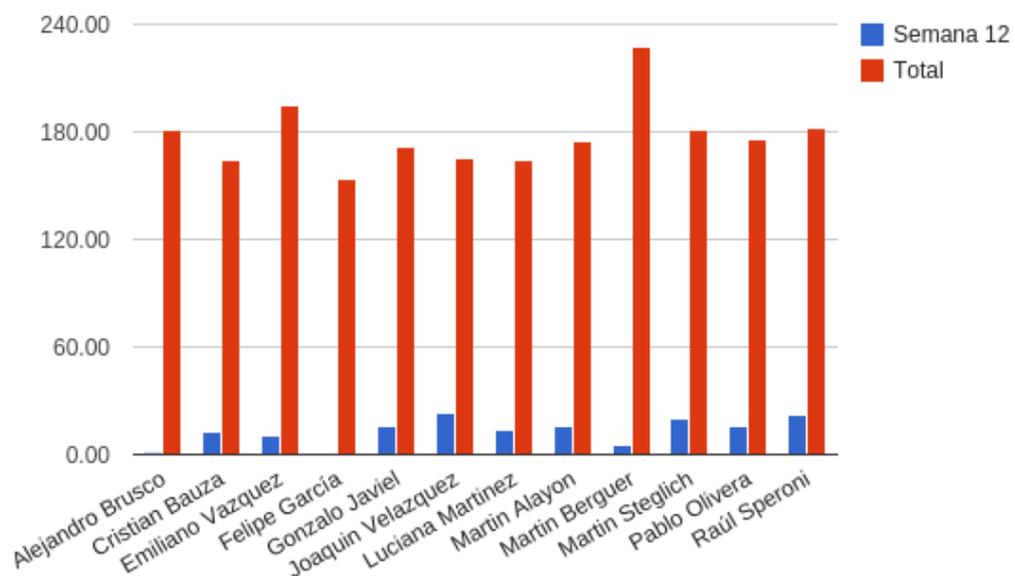

### **1.1.2 Esfuerzo por disciplina**

N/A

## **2. Indicadores**

### **2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo**

N/A

### **2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas**

**Entregas\_en\_Fecha = 16**

**Entregas\_Agendadas = 23**

**Cumplimiento de Entregas =  $16/21 = 0.76$**

### **2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas**

N/A

### **3. Informe de Situación**

#### **3.1 Estado del proyecto**

El Proyecto cumplió con todos los hitos del cronograma, resta la validación del cliente, la corrección de posibles errores y la elaboración de la presentación final.

#### **3.2 Desviaciones ocurridas**

N/A

#### **3.3 Incidencias encontradas**

No hubieron eventos no planificados que afectaron el desarrollo de esta iteración.

#### **3.4 Estado de Riesgos**

Se están monitoreando todos los riesgos identificados hasta el momento, han ocurrido algunos y han variado otros. La ocurrencia y la evolución de los riesgos se detalla en el documento de Riesgos.

### **4. Evaluación**

El cronograma fue cumplido según lo previsto y se cumplió con el alcance original.
