

Id	
----	--

Proyecto: Sensores_Flni_Ilt2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	08 sep '14
87			E1.2 Clase para Arquitectos	1 hora	vie 05/09/14	vie 05/09/14		Diego S	L	M
88			E1.3 Clase para Resp. V&V	1 hora	mié 10/09/14	mié 10/09/14		Fernando P	X	J
89			Gestión de Calidad						V	S
90			Q1 - Identificar las propiedades de calidad	3 horas			127;12	Oscar M	D	L
91			Q2 - Plan de calidad	5 horas			126;12	Oscar M		
92			Q5 - Revisar las entregas	5 horas				Oscar M		
93			Q6 - Revisar el ajuste del proceso	2 horas			91	Oscar M		
94			Q7 - Evaluar la calidad de los productos	3 horas			91	Oscar M		
95			Gestión de Configuración							
96			C1 - Planificar la configuración del SCM	3 horas			2	Emiliano T		
97			C2 - Definir la línea base del proyecto	5 horas			2	Emiliano T;Mathias B;M		
98			Plan de Configuración	0 días			96;97			

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	08 sep '14
99			C4 - Definir el ambiente controlado	4 horas			98	Emiliano T;Mathias B;M	L	M
100			C5 - Control de cambios	4 horas			2;98	Emiliano T	X	J
101			Gestión de Proyecto						V	S
102			G1 - Planificar el proyecto	4 horas			110;10	Ignacio A	D	L
103			G13 - Evaluar la fase	4 horas				Ignacio A		
104			G15 - Revisión técnica y administrativa	1 hora			106;11	Diego S;Fernando P;Os		
105			G16 - Reunión de responsables por área	1 hora				Diego S;Emiliano T;Ferna		
106			Plan de la Iteración	0 días			105			
107			G18 - Presentación al director de proyec	1 hora				Ignacio A		
108			G2 - Seguimiento del proyecto	5 horas				Diego S;Ignacio A		
109			G3 - Estimaciones y mediciones	5 horas				Ana Clara E;Diego S;Fab		
110			G4 - Gestión de riesgo	3 horas			2;109;	Ignacio A		

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14							08 sep '14	
									L	M	X	J	V	S	D		L
111			G5 - Registrar esfuerzo	1 hora				TODOS		TODOS							
112			G6 - Reunión de equipo	1 hora	vie 12/09/14	vie 12/09/14		TODOS									
113			G7 - Elaborar Acta de reunión de equipo	1 hora	vie 12/09/14	vie 12/09/14	112	Diego S									
114			G8 - Reunión de seguimiento	1 hora				Diego S;Fernando P;Igr		Diego S;Fernando P;Igr							
115			G9 - Ajustar y controlar el desarrollo	4 horas			2;106;	Diego S;Fabricio G;Ferra		Diego S;Fabricio G;Ferra							
116			Plan de Desarrollo	0 días			115			02/09							
117			Implementación														
118			I1 - Definir estándares de documentación técnica	2 horas			2	Mathias B;Mathias F;Rolando L;Santiago F		Mathias B;Mathias F;Rol							
119			I2 - Implementar el prototipo	3 días			81;116	Mathias B;Mathias F;Ro		Mathias B;Mathias F;Ro							
120			I3 - Corregir la implementación	0,67 días				Mathias B;Mathias F;Ro		Mathias B;Mathias F;Ro							
121			I4 - Planificar la integración de la iteración	4 horas			127;81	Mathias B;Mathias F;Ro		Mathias B;Mathias F;Ro							
122			I5 - Integrar el sistema (del prototipo)	2 días			81;116	Diego S;Mathias B;Mat		Diego S;Mathias B;Mat							

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	08 sep '14
123			I7 - Verificación unitaria del módulo	0,67 días			127;13	Fabricio G;Fernando P;		Fabricio G;Fernando P;Ju
124			Requerimientos							
125			R1 - Reunión de requerimientos	1 hora	mié 03/09/14	mié 03/09/14		Mathias B;Mathias F;R		Mathias B;Mathias F
126			R2 - Especificar requerimientos	2 horas			125	Ana Clara E;Fabricio G;		Ana Clara E;Fabricio G;Ju
127			R3 - Especificar casos de uso	3 horas			126	Ana Clara E;Fabricio G;		Ana Clara E;Fabricio G;Ju
128			R4 - Priorizar casos de uso	1 hora			126	Ana Clara E;Fabricio G;		Ana Clara E;Fabricio G;Ju
129			Descripción de la arquitectura (vista de	0 días			128			02/09
130			R5 - Validación con el cliente	1 hora			126	Diego S		Diego S
131			R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario	5 horas			125	Fabricio G;Juan C		Fabricio G;Juan C
132			R7 - Definir alcance del sistema	1 hora			126;12	Diego S;Ignacio A		Diego S;Ignacio A
133			R8 - Definir glosario	1 hora				Ana Clara E;Fabricio G;		Ana Clara E;Fabricio G;Ju
134			Verificación							

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	08 sep '14
135			V1 - Planificar la verificación	5 horas			2;127	Fernando P		
136			V3 - Planificar las pruebas de la iteració	5 horas			81;127	Diego S;Fernando P		
137			V4 - Especificar los casos de prueba	2 días			126;12	Fernando P		
138			V5 - Verificar documento	5 horas			127;13	Fernando P		
139			V6 - Generar entorno de prueba	4 horas				Diego S;Emiliano T		
140			V7 - Ejecutar las pruebas	2 días			116;13			
141			Comunicación							
142			CM4 - Gestión de "Lecciones Aprendida	1 hora			108;11	Ignacio A		
143			CM2 - Definición del documento de "Vis	1 hora			126;12	Ana Clara E;Fabricio G;Ju		
144			CM3 - Elaboración del documento "Registro de Rastreo"	1 hora			81;126	Ana Clara E;Fabricio G;Juan C;Santiago		
145			Fin de Fase Inicial	0 días	lun 15/09/14	lun 15/09/14				
146			Fase Elaboración	51,17 días	mar 16/09/14	lun 13/10/14				

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	L	M	X	J	V	S	D	08 se
147			Iteración 1	25,5 días	mar 16/09/1	lun 29/09/14											
148			Diseño														
153			Gestión de Calidad														
159			Gestión de Configuración														
165			Gestión de Proyecto														
178			Plan de Implantación														
180			Implementación														
188			Requerimientos														
194			Verificación														
202			Comunicación														
204			Iteración 2	25,5 días	mar 30/09/1	lun 13/10/14											
205			Diseño														

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	L	M	X	J	V	S	D	08 se
210		Gestión de Calidad														
216		Gestión de Configuración														
221		Gestión de Proyecto														
235		Plan de Implantación														
237		Implementación														
243		Requerimientos														
246		Verificación														
255		Comunicación														
257		Fin de Fase Elaboración	0 días	lun 29/09/14	lun 29/09/14											
258		Fase Construcción	51,17 días	mar 14/10/14	lun 10/11/14											
259		Iteración 1	25,5 días	mar 14/10/14	lun 27/10/14											
260		Diseño														

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14							08 se
									L	M	X	J	V	S	D	
264			Gestión de Calidad													
269			Gestión de Configuración													
274			Gestión de Proyecto													
286			Plan de Implantación													
291			Implementación													
297			Requerimientos													
300			Verificación													
307			Comunicación													
308			CM4 - Gestión de "Lecciones Aprendida													
309			Iteración 2	25,5 días	mar 28/10/1	lun 10/11/14										
310			Gestión de Calidad													
316			Gestión de Configuración													

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14	L	M	X	J	V	S	D	08 se
321			Gestión de Proyecto														
334			Plan de Implantación														
341			Implementación														
346			Verificación														
354			Comunicación														
356			Fin de Fase	0 días	lun 10/11/14	lun 10/11/14											
357			Fase Transición	25,5 días	mar 11/11/1	lun 24/11/14											
358			Iteración 1	25,5 días	mar 11/11/1	lun 24/11/14											
359			Satisfacción del Cliente	12,67 días	mar 11/11/1	lun 17/11/14											
360			CU2 - Seguimiento de satisfacción del cliente														
361			Gestión de Calidad	12,67 días	mar 18/11/1	lun 24/11/14											
362			Q5 - Revisar las entregas														

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14							08 se
									L	M	X	J	V	S	D	
363			Q7 - Evaluar la calidad de los productos													
364			Q8 - Realizar el informe final de SQA													
365			Gestión de Configuración	1,83 días	mar 11/11/1	mar 11/11/1										
366			C3 - Seguimiento de la línea base													
367			C6 - Realizar el informe final de SCM													
368			C7 - Describir la versión													
369			C8 - Escribir las notas de la versión													
370			Gestión de Proyecto	1,83 días	mar 11/11/1	mar 11/11/1										
371			G11 - Realizar el informe final del proye													
372			G12 - Preparar el cierre del proyecto													
373			G13 - Evaluar la fase													
374			G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto													

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14							08 se
									L	M	X	J	V	S	D	
375			G15 - Revisión técnica y administrativa													
376			G18 - Presentación al director de proye													
377			G2 - Seguimiento del proyecto													
378			G5 - Registrar esfuerzo													
379			G6 - Reunión de equipo													
380			G7 - Elaborar acta de reunión de equipo													
381			G8 - Reunión de seguimiento													
382			Plan de Implantación	1,83 días	mar 11/11/1	mar 11/11/1										
383			P10 - Desarrollar los materiales para capacitación													
384			P11 - Preparar el entorno de capacitación													
385			P12 - Capacitación													
386			P2 - Documentación de usuario													

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 sep '14							08 se
									L	M	X	J	V	S	D	
387			P4 - Producir la versión del producto a liberar													
388			P5 - Puesta en producción													
389			P6 - Realizar las pruebas de aceptación													
390			P7 - Verificar la versión del producto a liberar													
391			P8 - Pruebas beta del producto													
392			Implementación	1,83 días	mar 11/11/1	mar 11/11/1										
393			I6 - Documentación técnica													
394			Verificación	1,83 días	mar 11/11/1	mar 11/11/1										
395			V10 - Realizar el informe final de verificación													
396			V6 - Generar entorno de prueba													
397			V7 - Ejecutar las prueba													
398			V8 - Pruebas del sistema													

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN

Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Nombres de los recursos	01 sep '14							08 sep '14
									L	M	X	J	V	S	D	
399			V9 - Evaluar la verificación													
400			Comunicación	1,83 días?	mar 11/11/1	mar 11/11/1										
401			CM4 - Gestión de "Lecciones Aprendid													
402			Fin de Fase	0 días												
403			Fin de proyecto	0 días												

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

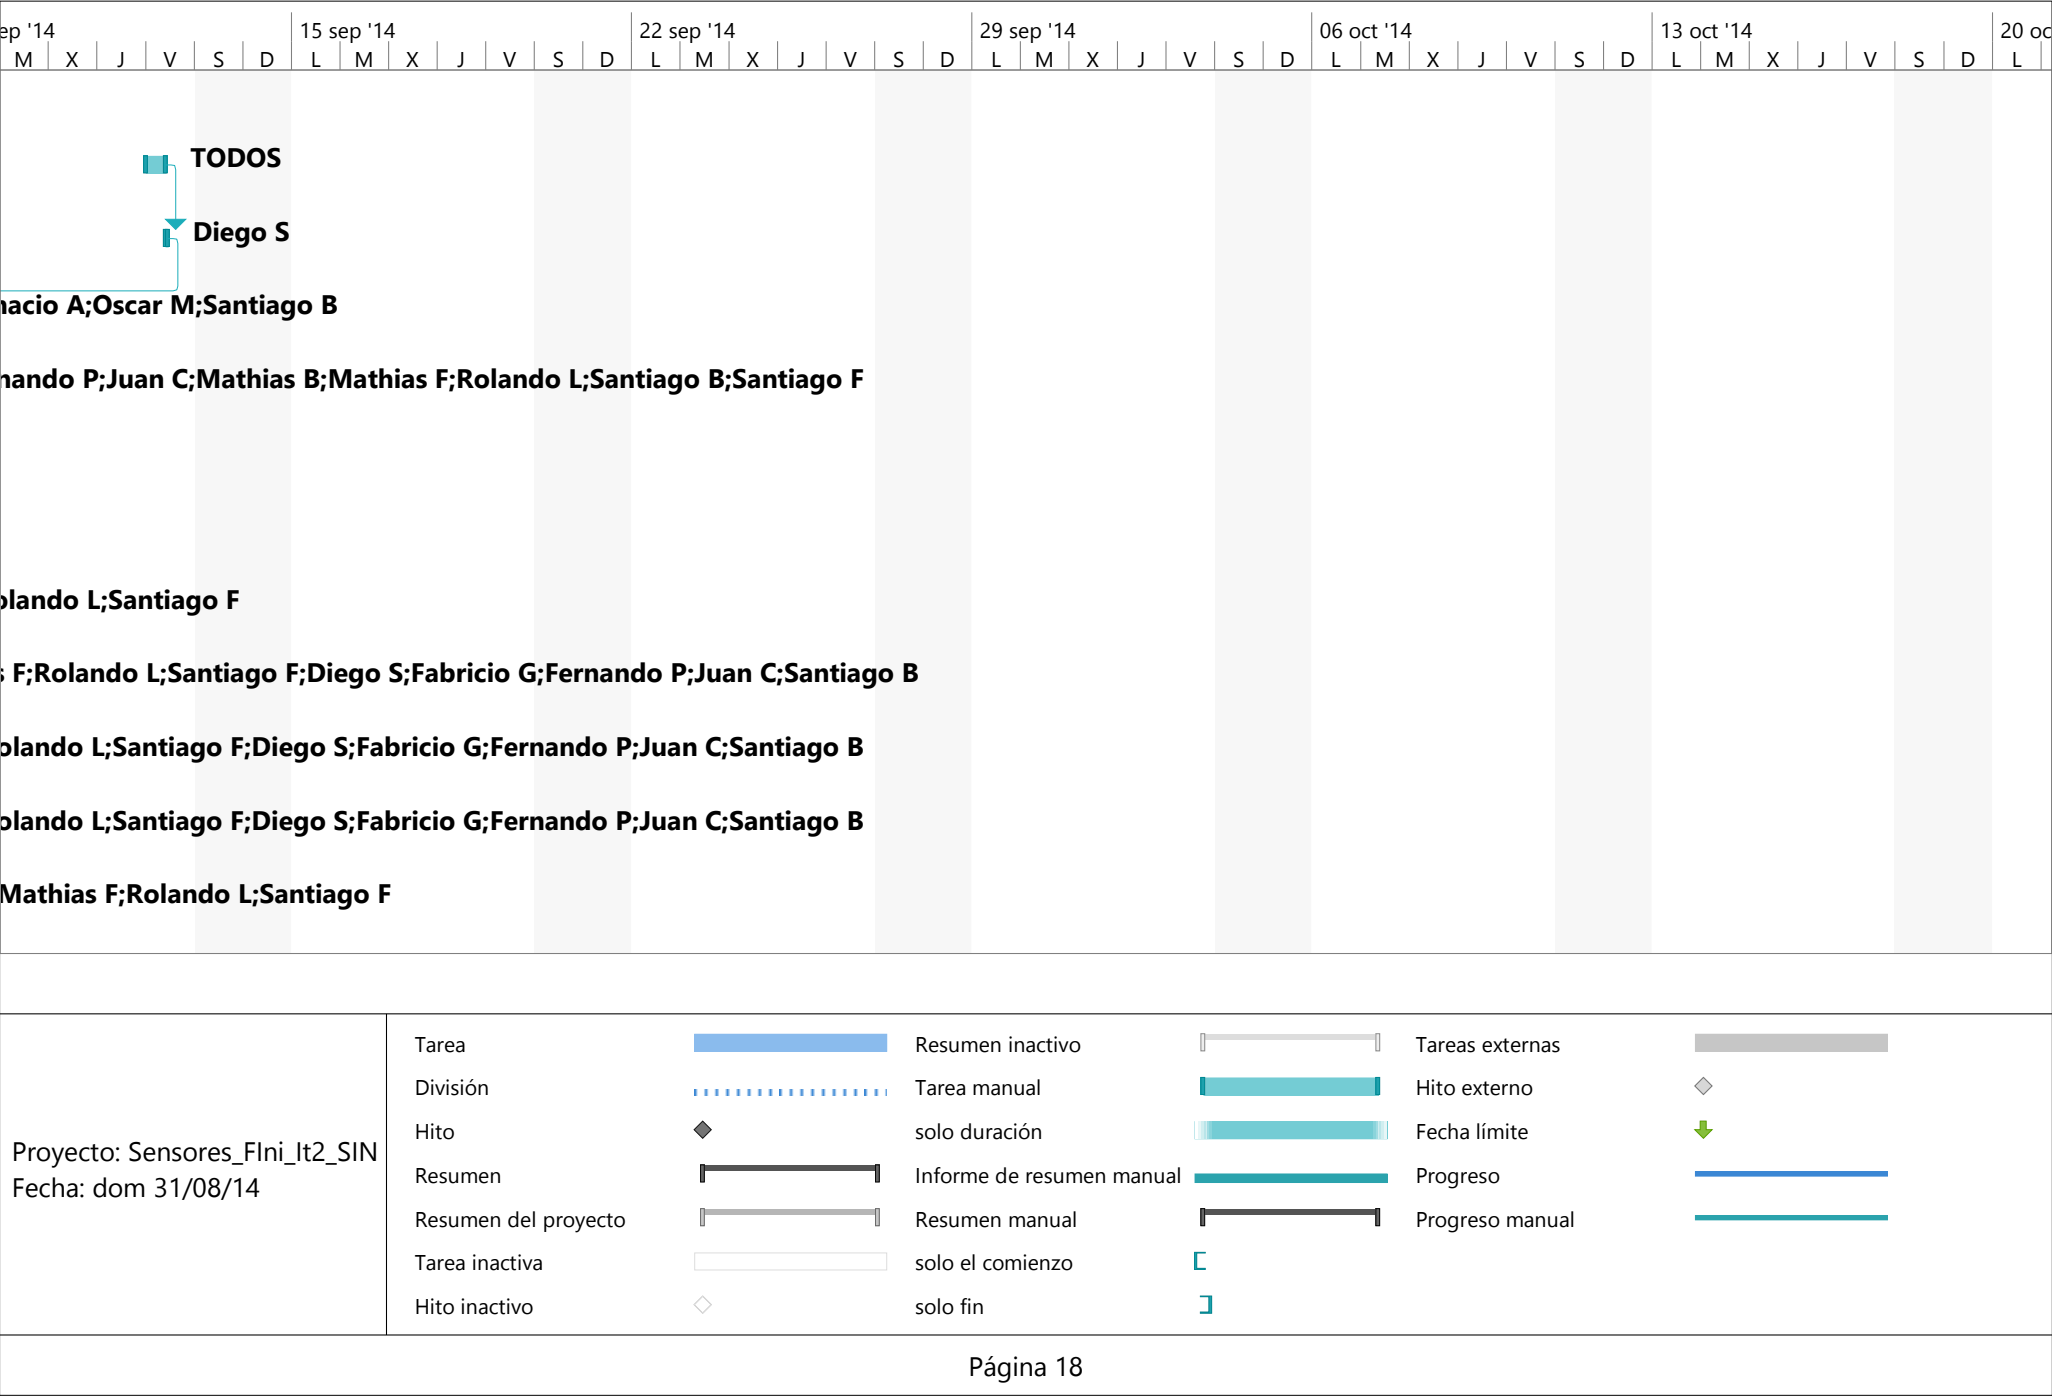


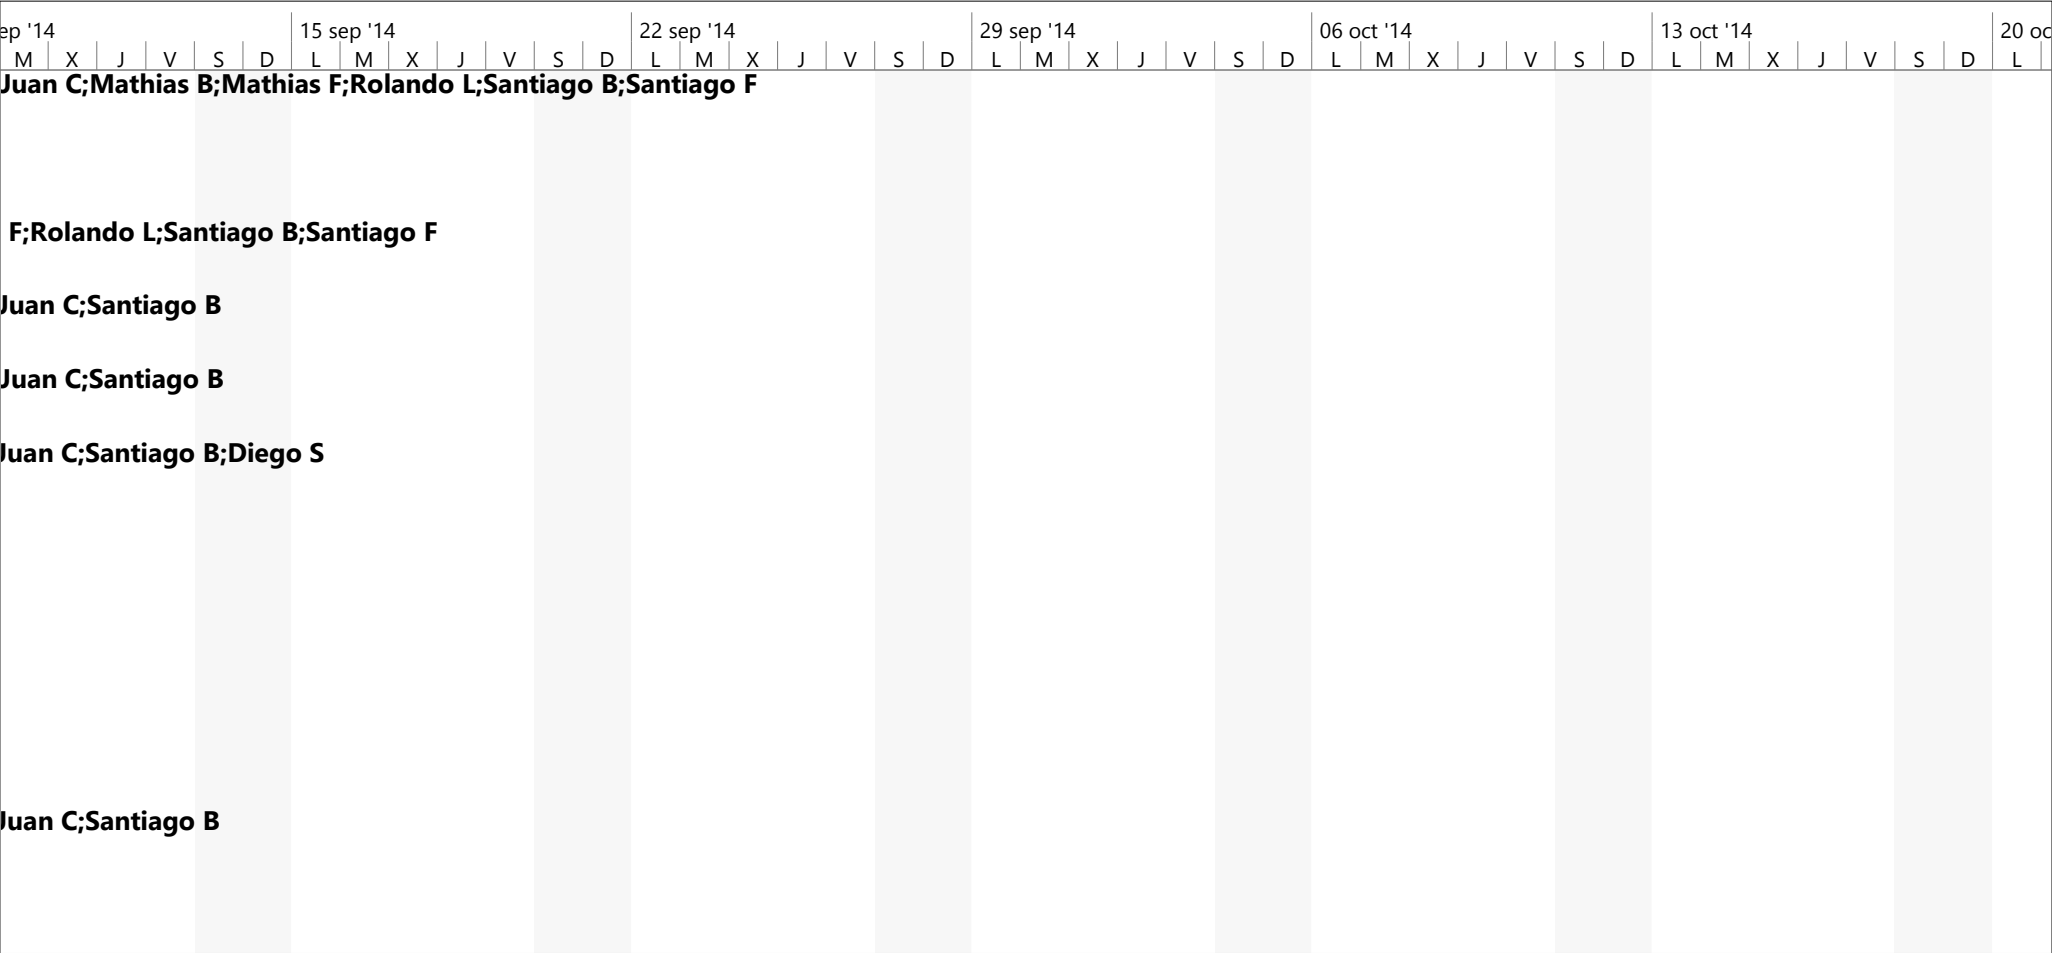



Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

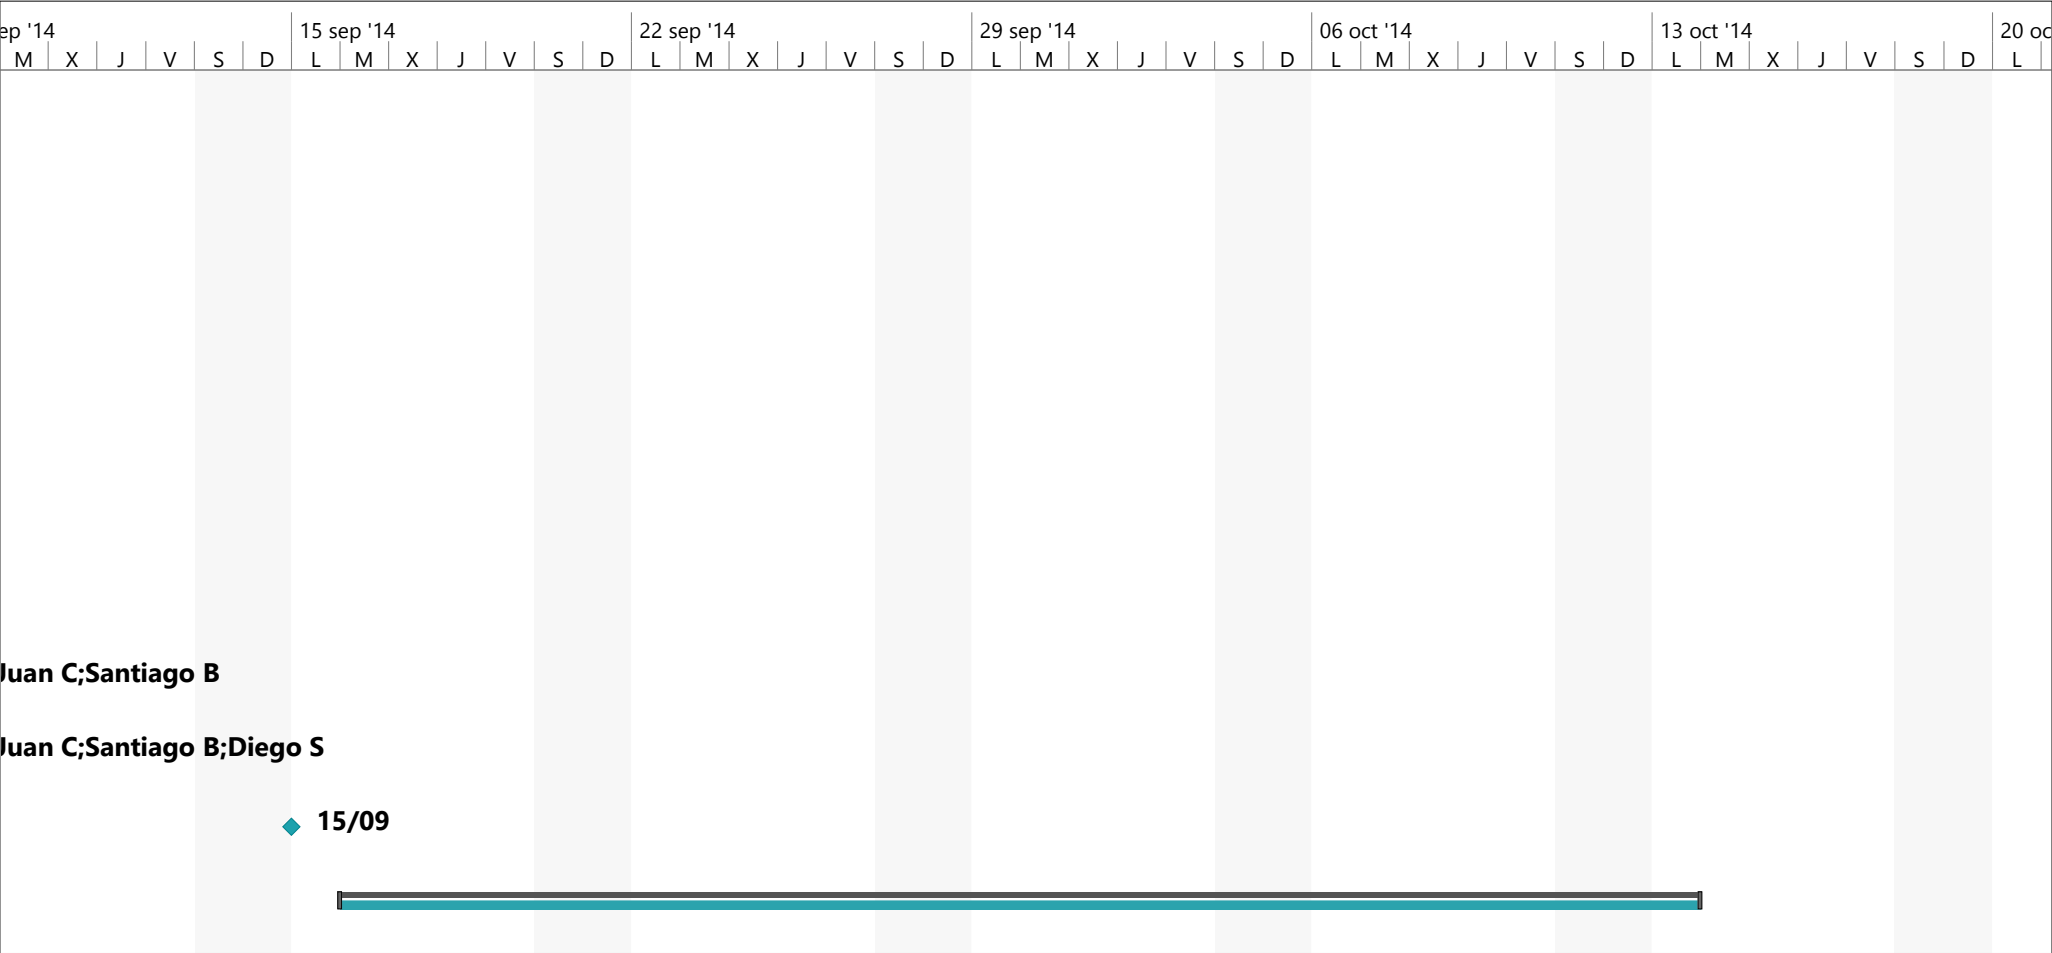


Proyecto: Sensores_Flni_Ilt2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

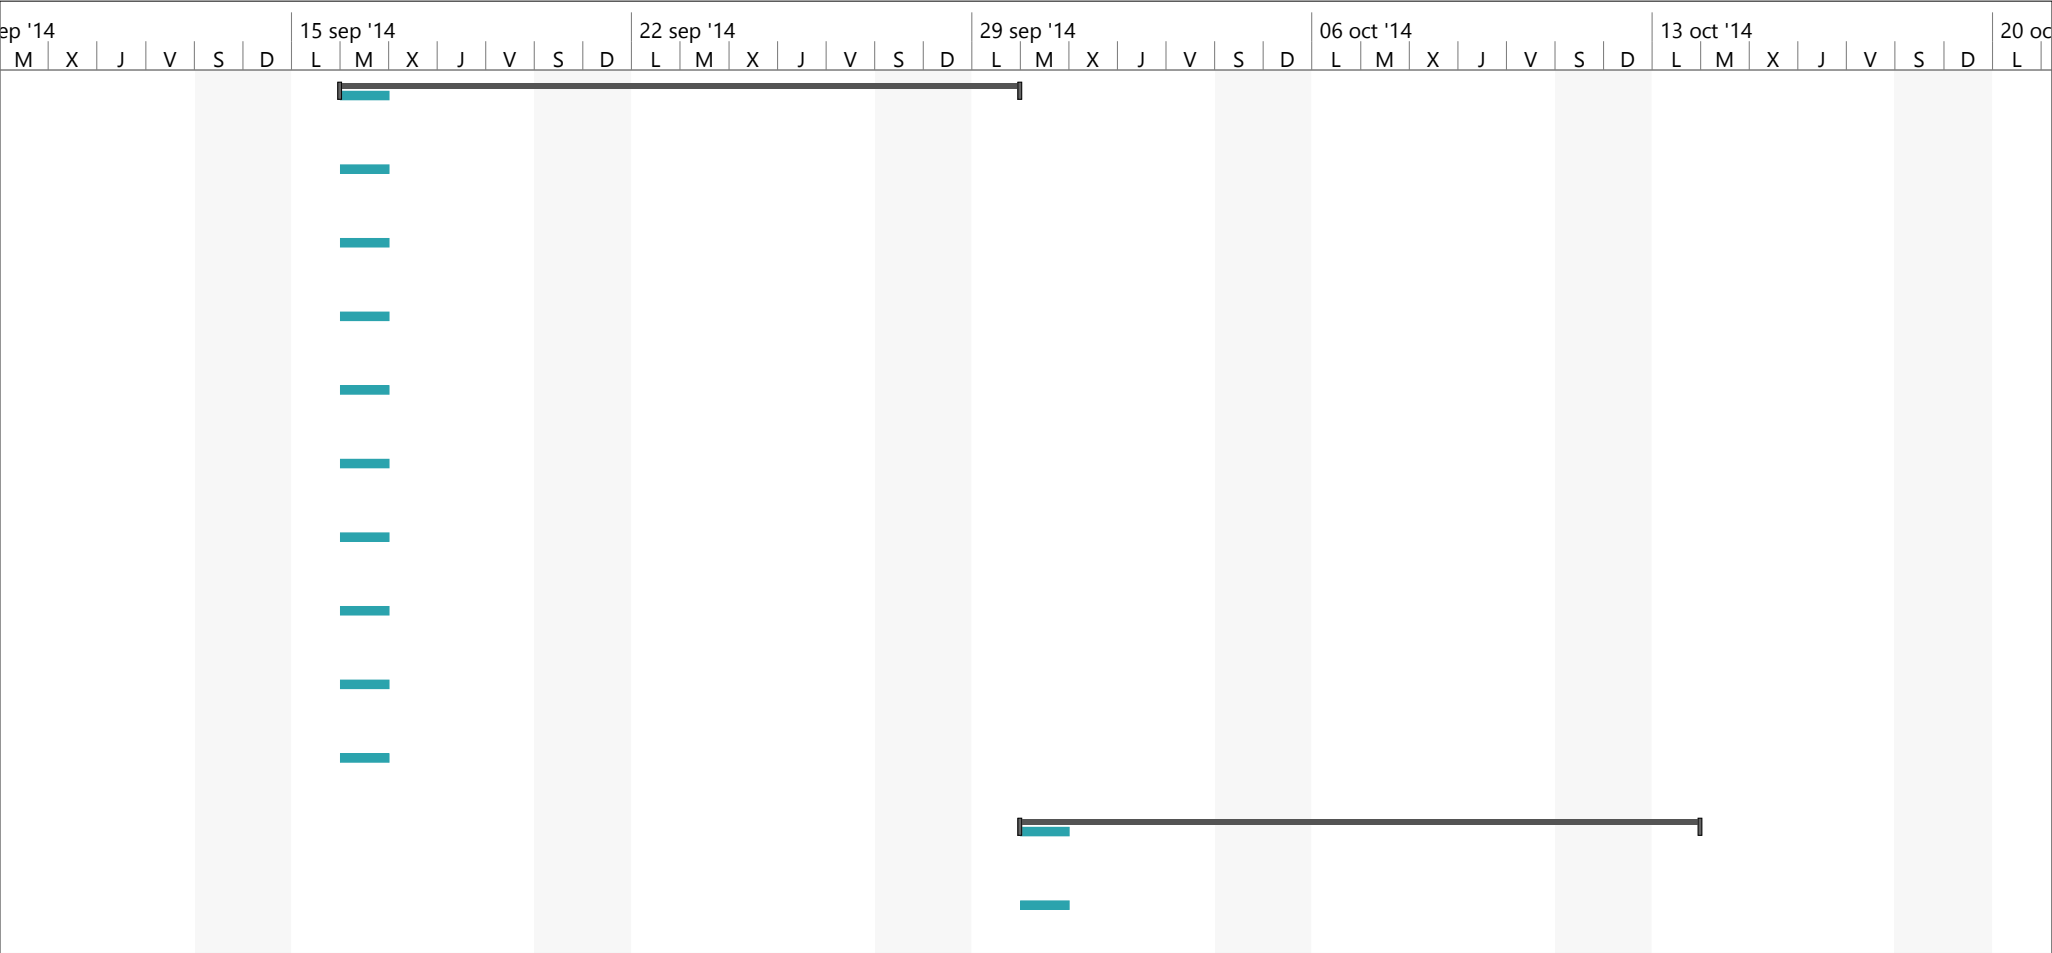


Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

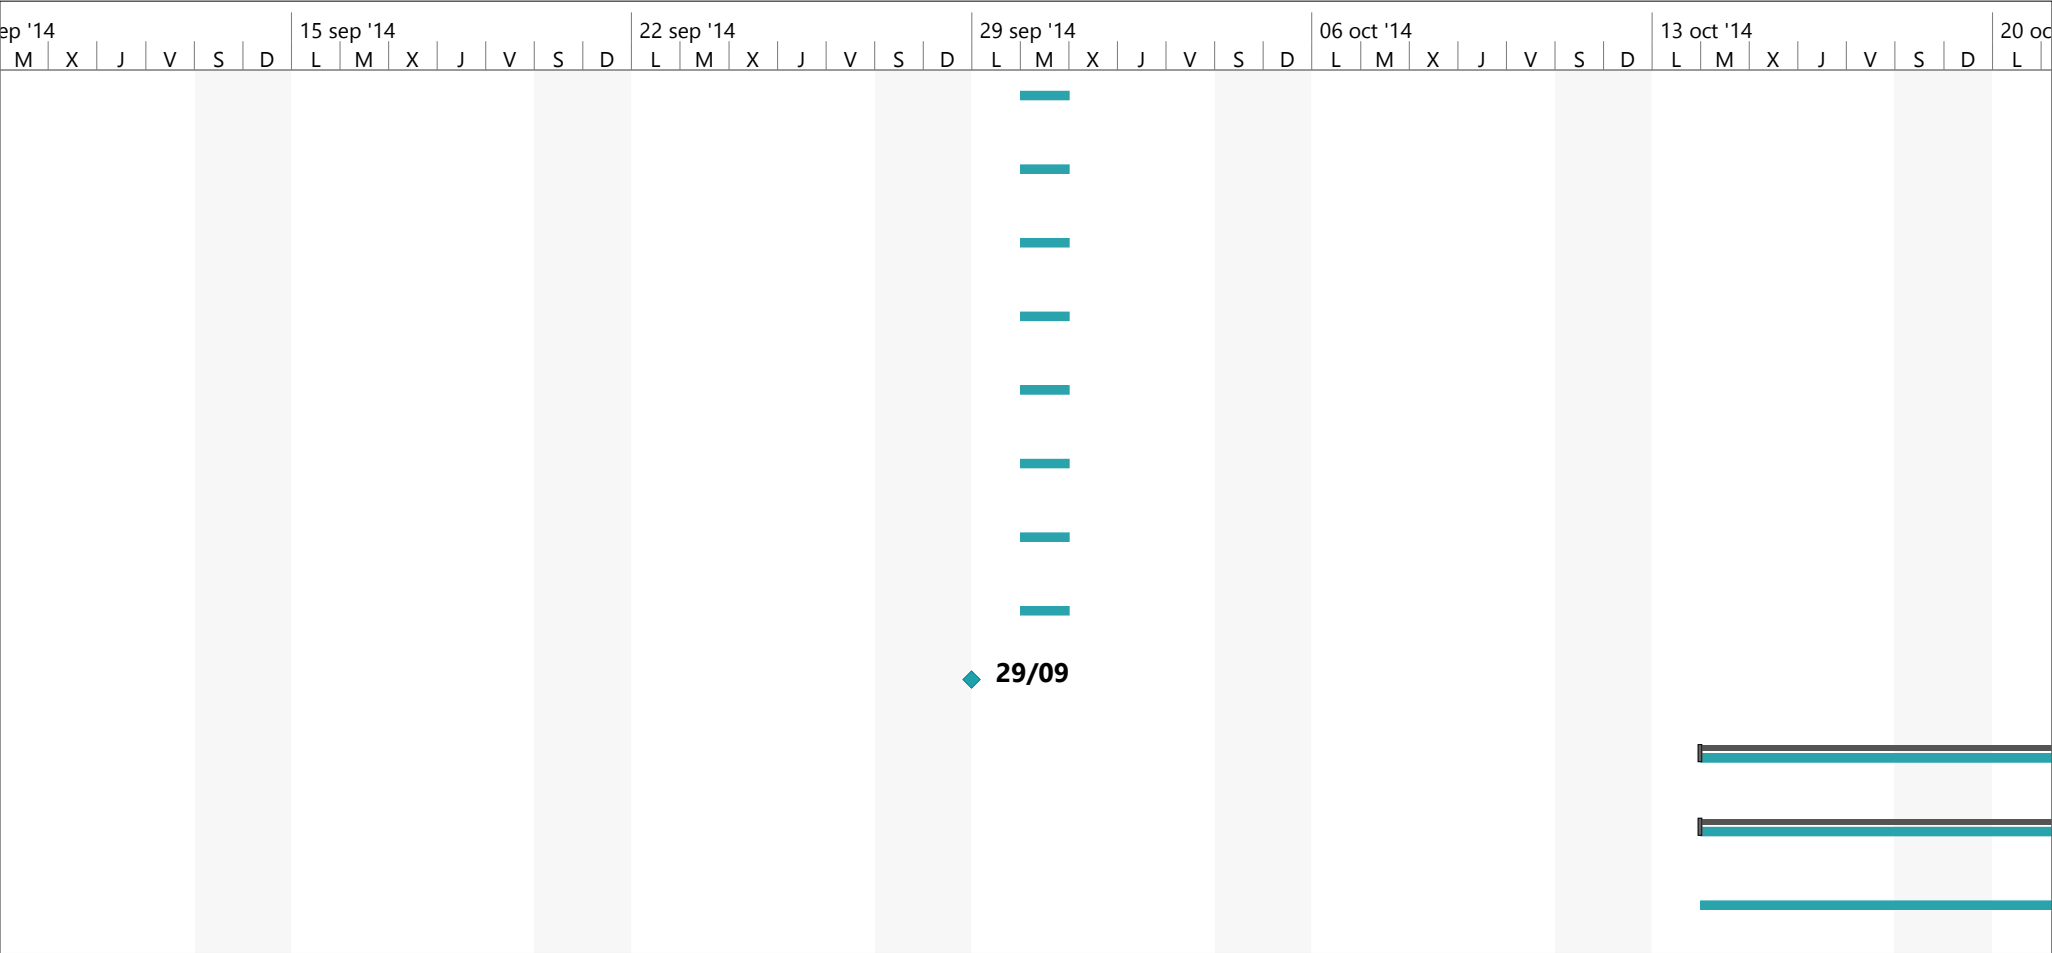

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

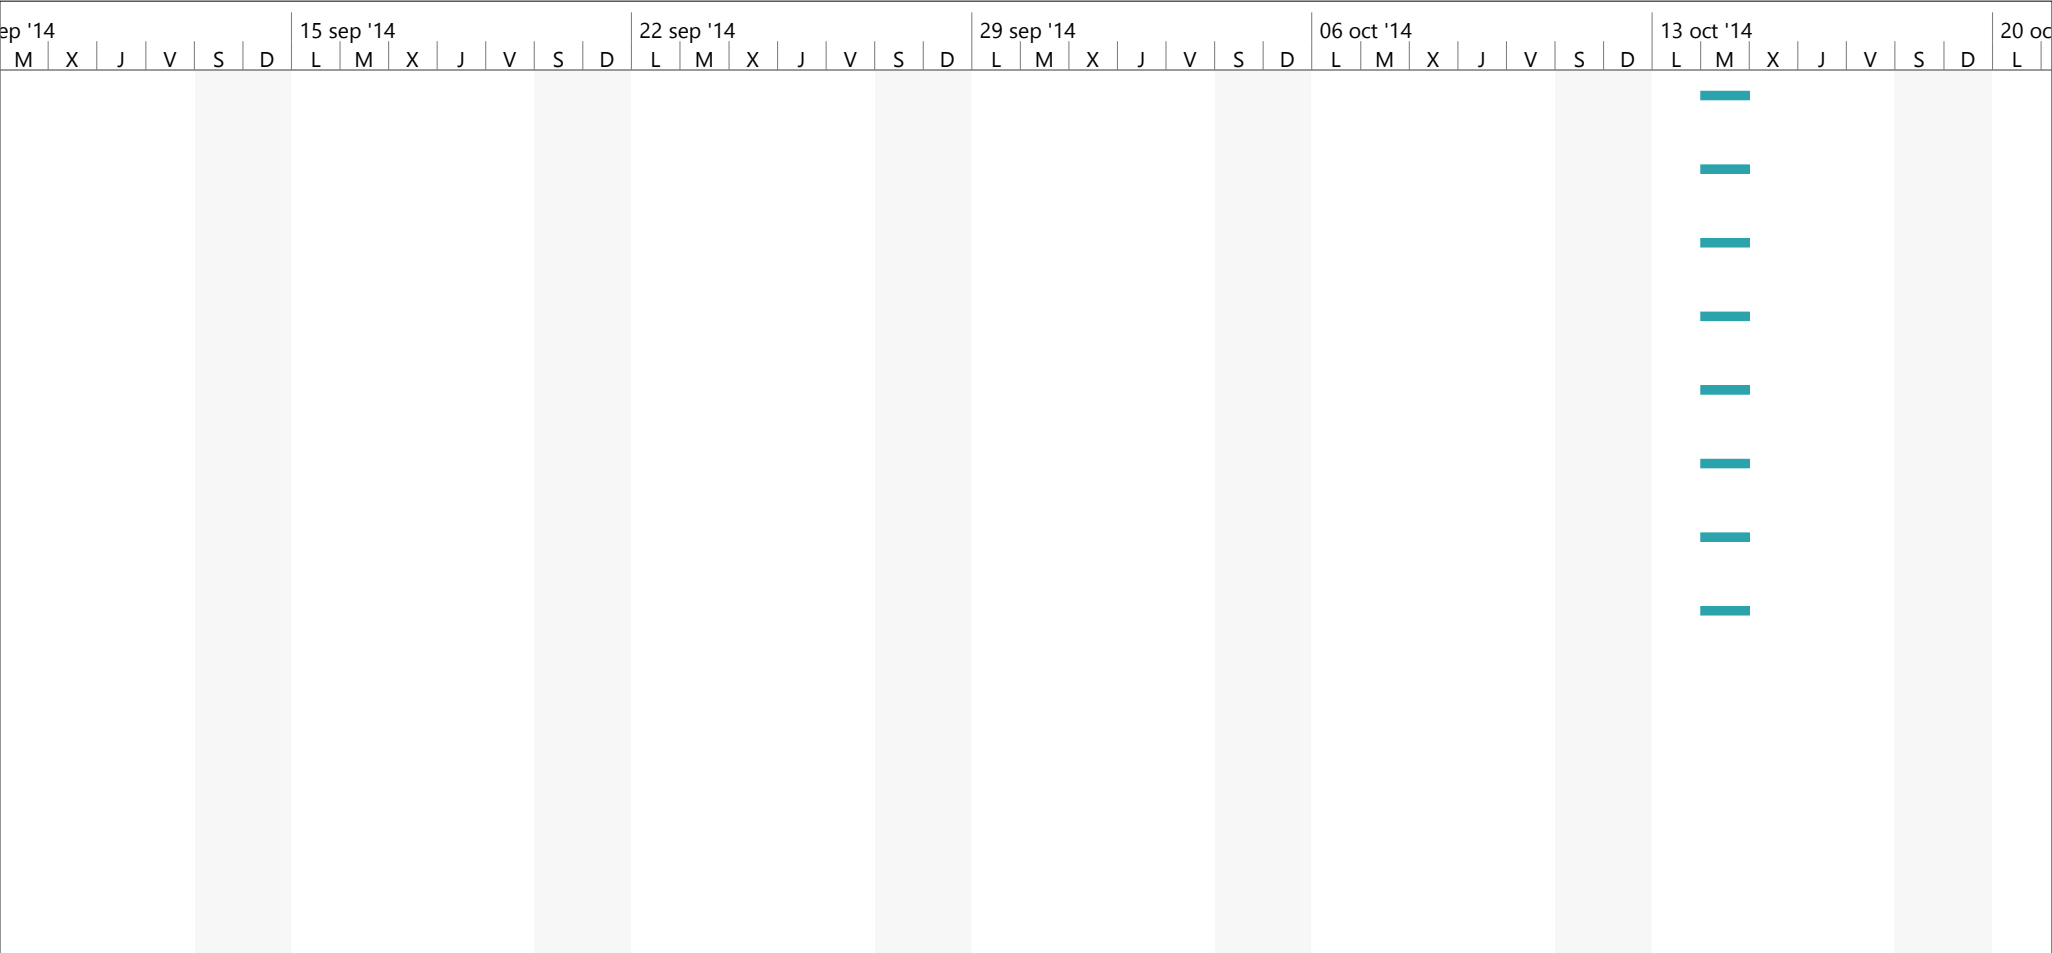


Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

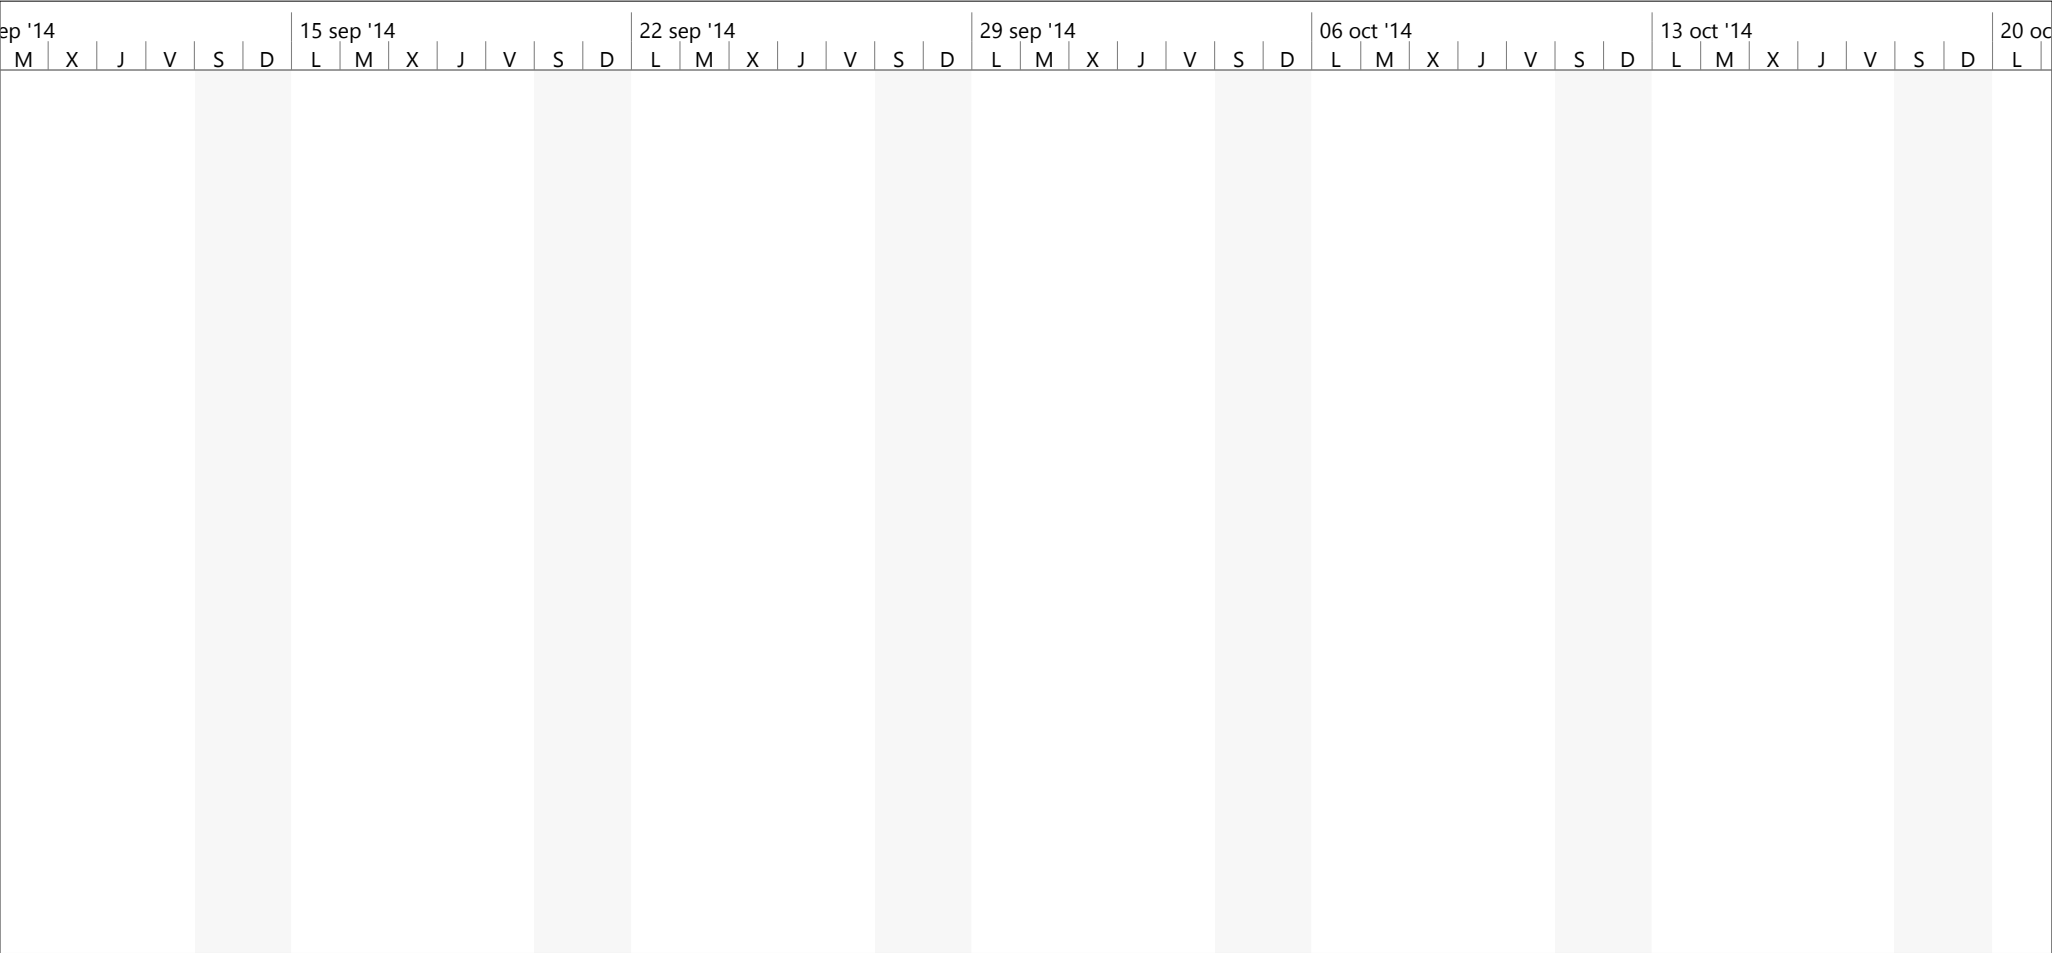


Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN
Fecha: dom 31/08/14


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

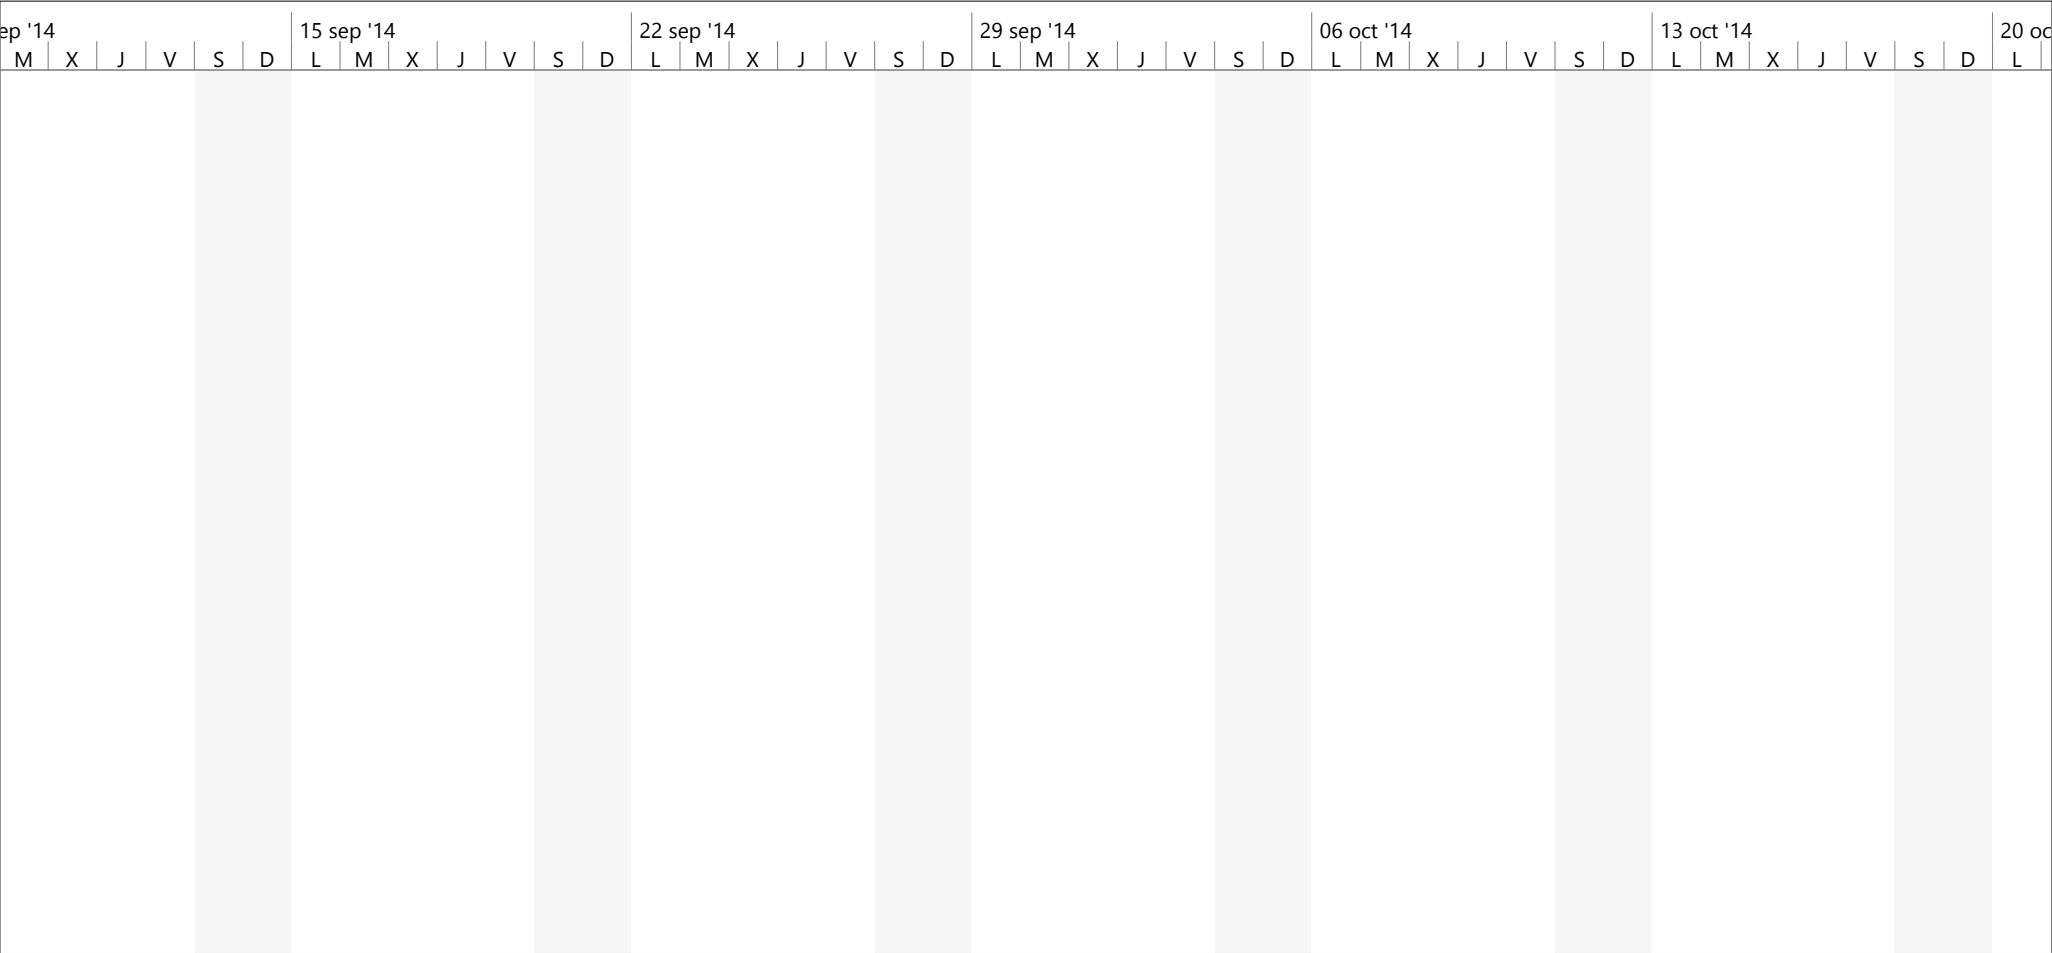


Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

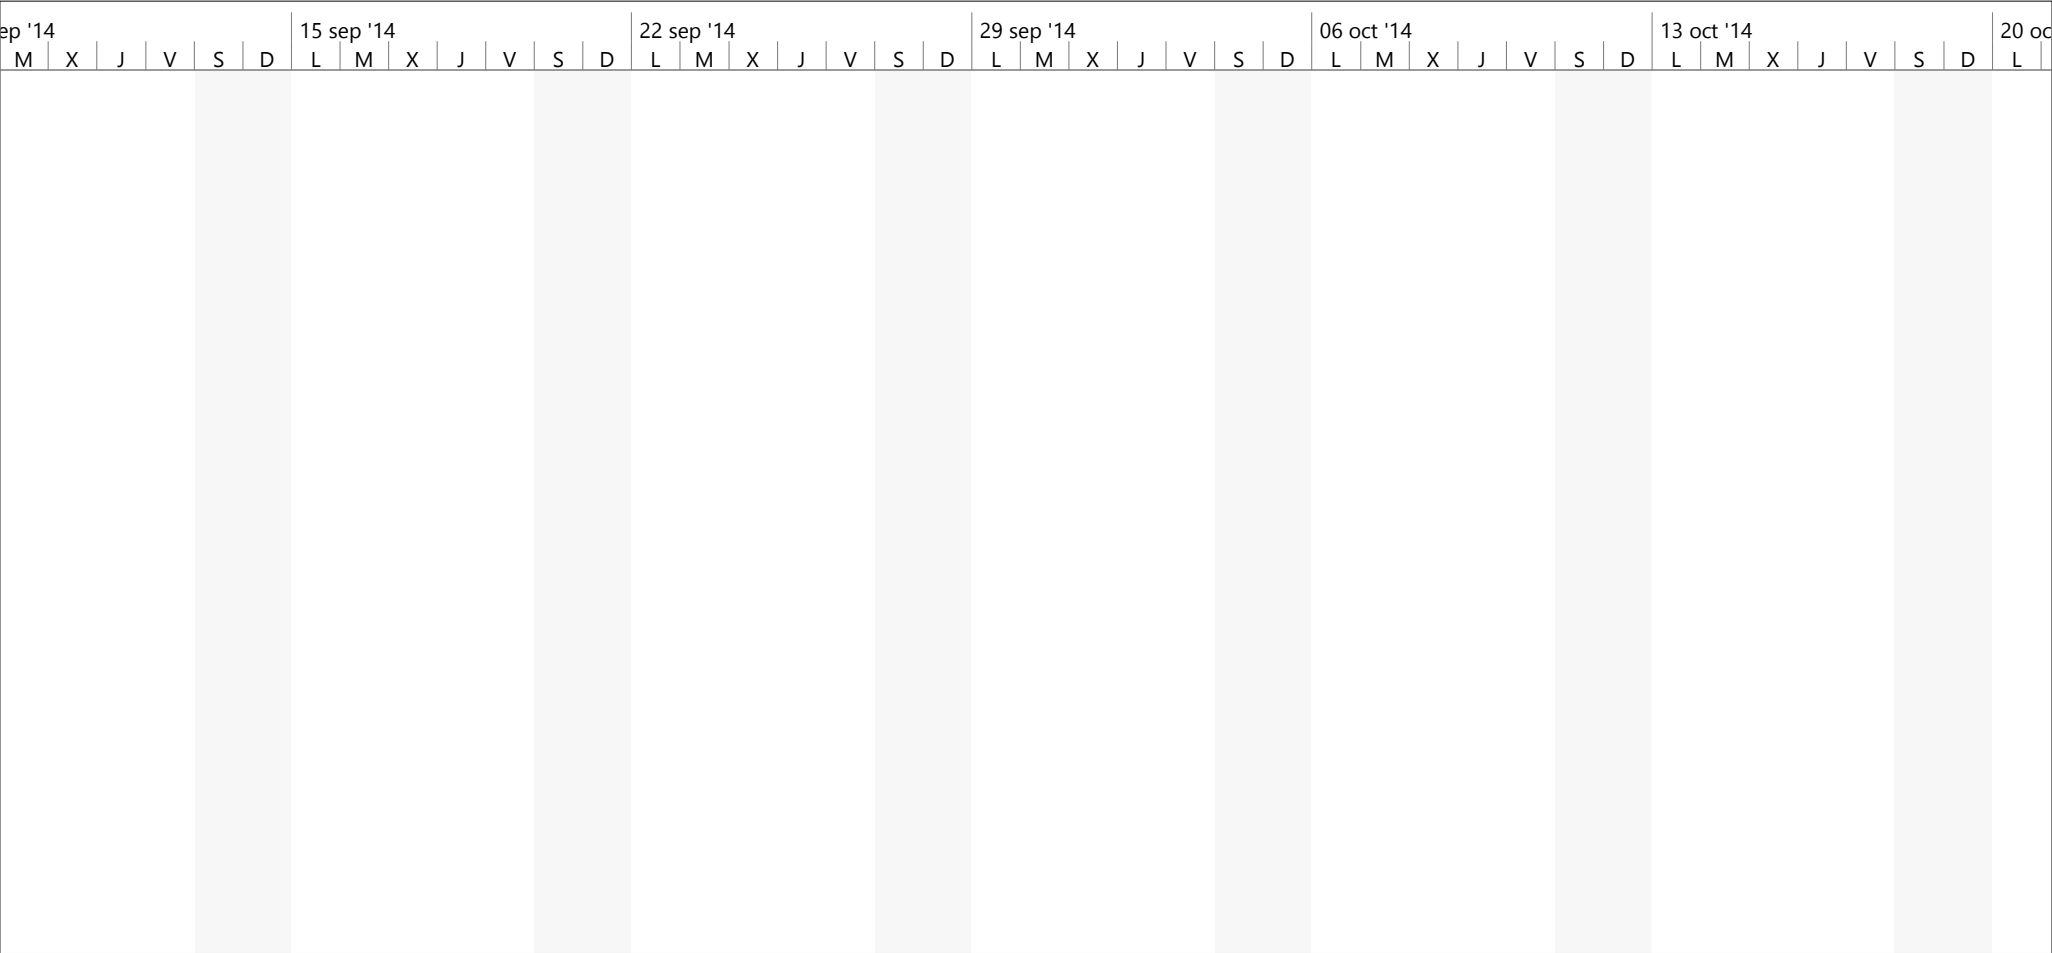

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

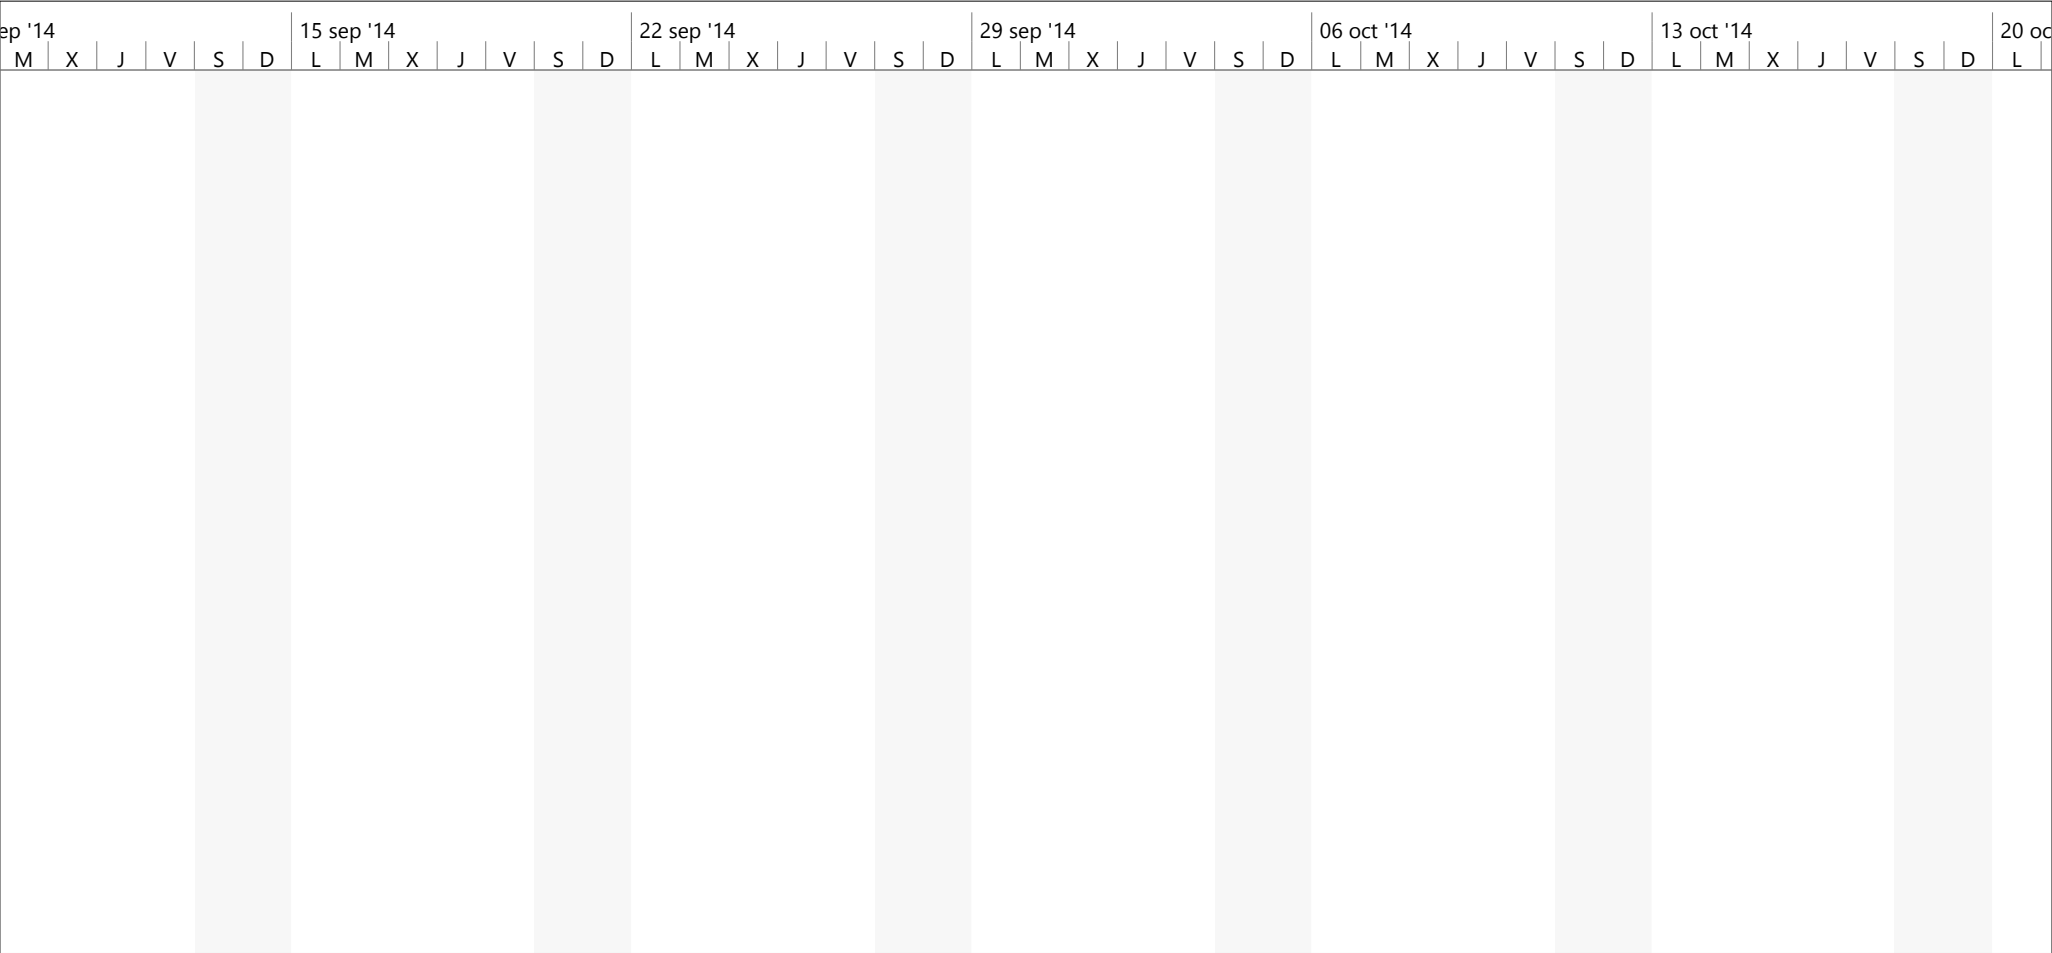

Proyecto: Sensores_Flni_It2_SIN Fecha: dom 31/08/14	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

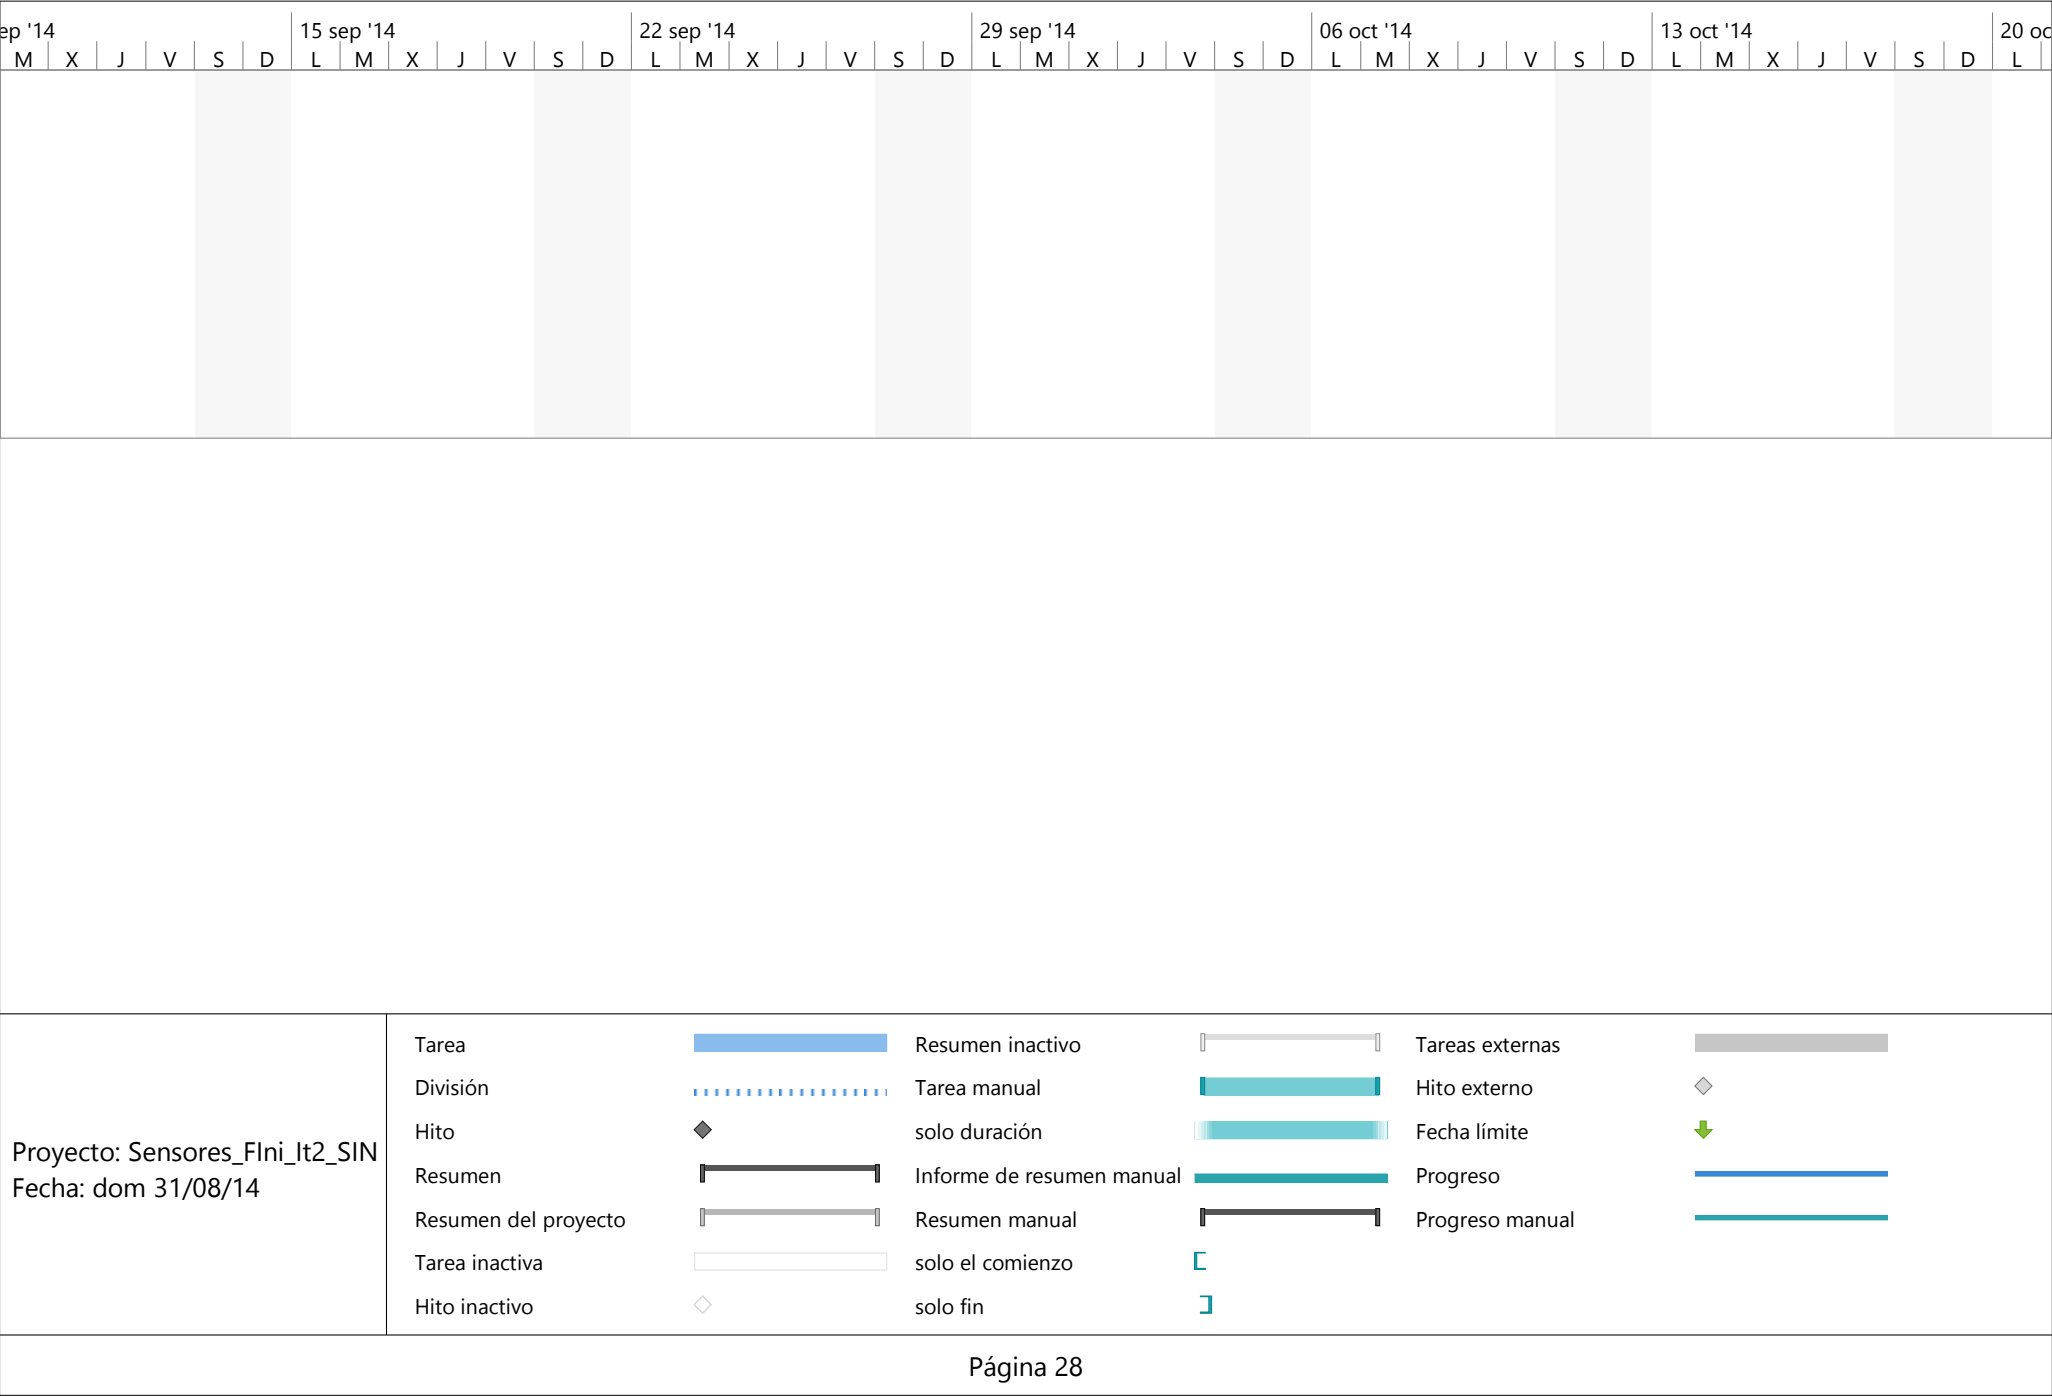

Página 28
