

SICC

Informe de Situación de Proyecto

Versión 5.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
21/08/2016	1.0	Creación del documento	Belén Techera
21/08/2016	1.1	Revisión del documento	Juan Nogueira
27/08/2016	2.0	Actualización del documento	Matías Cadepont
28/08/2016	2.1	Revisión del documento	Juan Nogueira
04/09/2016	3.0	Actualización del documento	Belén Techera
11/09/2016	4.0	Actualización del documento	Belén Techera
17/09/2016	4.1	Actualización del documento	Belén Techera

Contenido

Mediciones Realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por Línea de trabajo

Esfuerzo por Rol

Esfuerzo por Integrante

Informe de Situación

Estado del Proyecto

Desviaciones ocurridas e incidencias encontradas.

Estado de Riesgos

Evaluación


Mediciones Realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por Línea de trabajo

LÍNEA DE TRABAJO	ESFUERZO ESTIMADO	ESFUERZO REALIZADO	% (ESFUERZO SOBRE LO TOTAL DE LO ACUMLADO)	TOTAL ACUMULADO
ANÁLISIS / REQUERIMIENTOS	9	18,5	13,30%	113
COMUNICACIÓN	30	29	18,00%	152,5
DISEÑO	20	13,5	7,90%	67
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	42	43	31,80%	269,5
GESTIÓN DE CALIDAD	4	2	4,60%	39,5
GESTIÓN DE PROYECTO	8	7	8,90%	75,5
IMPLANTACIÓN	0	0	0,00%	0
IMPLEMENTACIÓN	52	62,5	9,70%	82,5
SCM Y CONTROL DE CAMBIOS	2	1,5	1,80%	15,5
VERIFICACIÓN	9	7,5	4,00%	33,5

Total de horas en disciplinas: 184,5

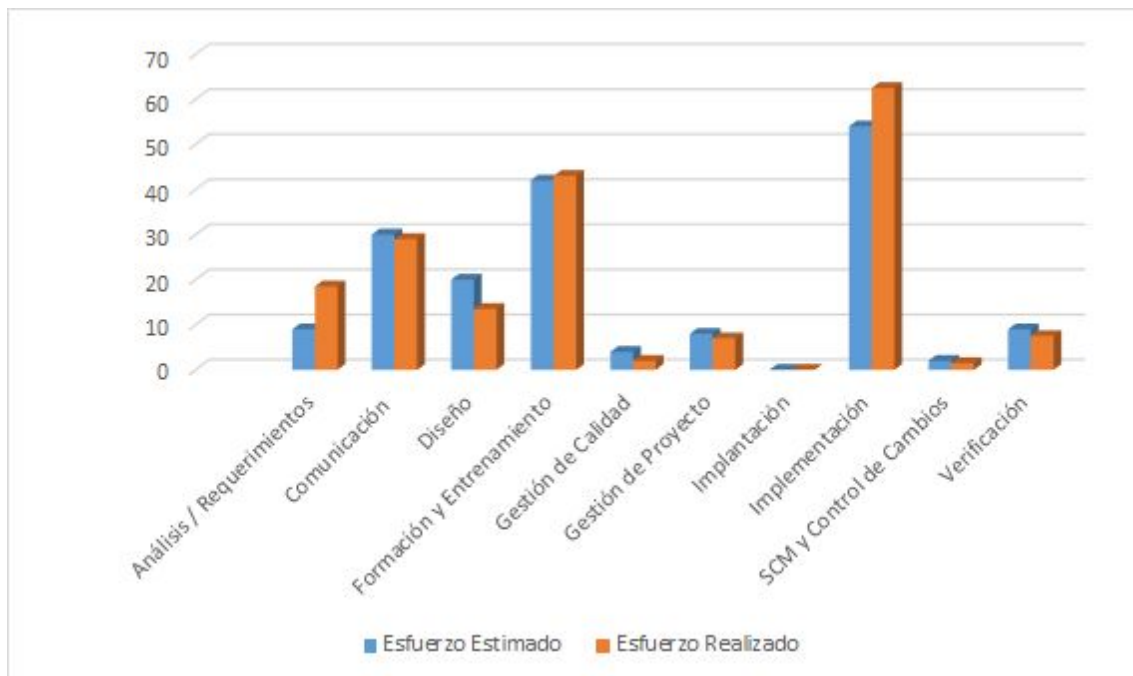





Esfuerzo por Rol

ROL	ESFUERZO ESTIMADO	ESFUERZO REALIZADO	% (ESFUERZO SOBRE LO TOTAL DE LO ACUMLADO)	TOTAL ACUMULADO
ADMINISTRADOR	10	9	6,60%	56,5
ANALISTA	15	16	20,30%	172
ARQUITECTO	9	9	7,10%	60
COORDINADOR DE DESARROLLO	0	0,5	0,80%	6,5
DISEÑADOR DE INTERFAZ DE USUARIO	10	26	7,50%	63,5
ASISTENTE ARQUITECTO	5	2	1,90%	16
IMPLEMENTADOR	91	77	18,00%	153
ESPECIALISTA TÉCNICO	3	11,5	18,60%	158
RESPONSABLE INTEGRACIÓN	0	0	0,00%	0
RESPONSABLE COMUNICACIÓN	1	1	1,20%	10
RESPONSABLE SCM	3	2	2,50%	21
RESPONSABLE SQA	7	5	6,20%	53
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	9	15,5	7,80%	66
ASISTENTE DE VERIFICACIÓN	15	10	1,50%	13

Total de horas roles: 184,5

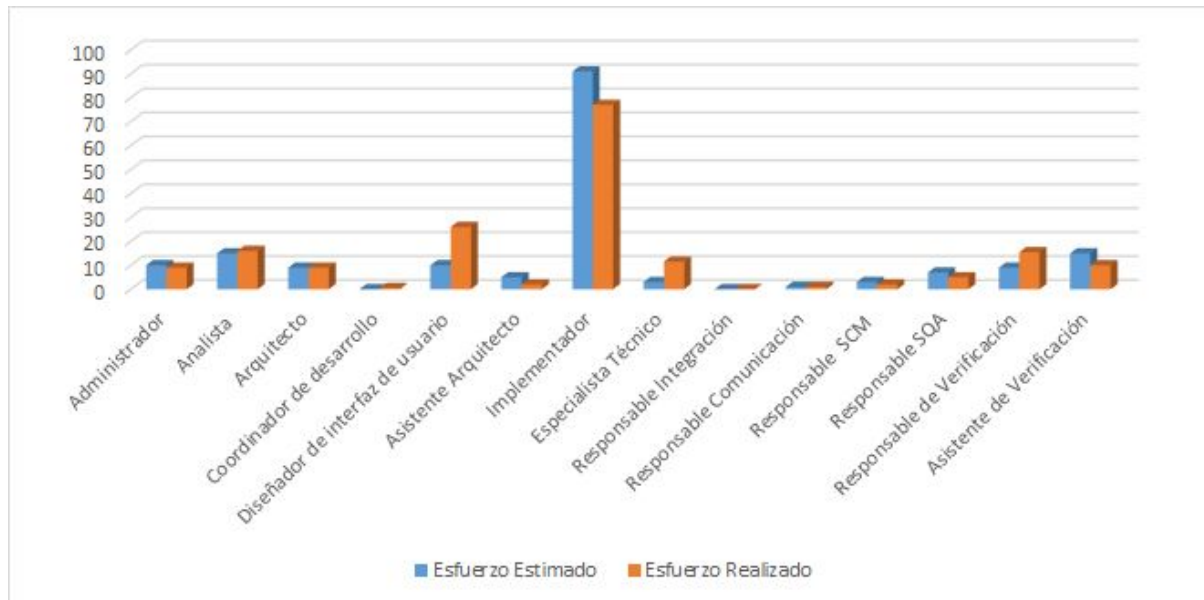


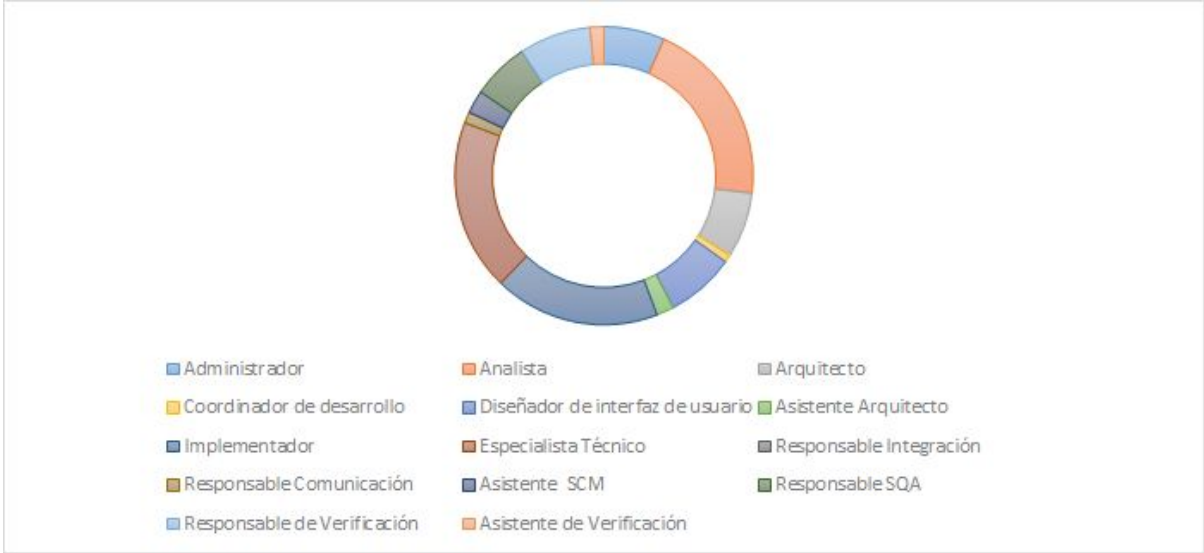


Esfuerzo por Integrante

NOMBRE	ESFUERZO ESTIMADO	ESFUERZO REALIZADO	% (ESFUERZO SOBRE LO TOTAL DE LO ACUMULADO)	TOTAL ACUMULADO
ALEXIS	14	14	8,20%	69,5
ANDRÉS	15	18,5	9,80%	83,5
CONSTANZA	14	15,5	8,30%	70,5
BELÉN	15	11,5	7,80%	66
JUAN	15	17	7,30%	62
MANUEL	15	15	8,20%	69,5
MATÍAS CADEPONT	15	16	9,30%	79
MATÍAS SCLAVI	15	13	8,10%	68,5
NICOLÁS	15	19	8,30%	70,5
SABRINA	15	15	8,60%	73
SERGIO	16	16,5	7,30%	62
STEPHANIE	14	14,5	8,80%	74,5

Esfuerzo total dedicado por el : 184,5

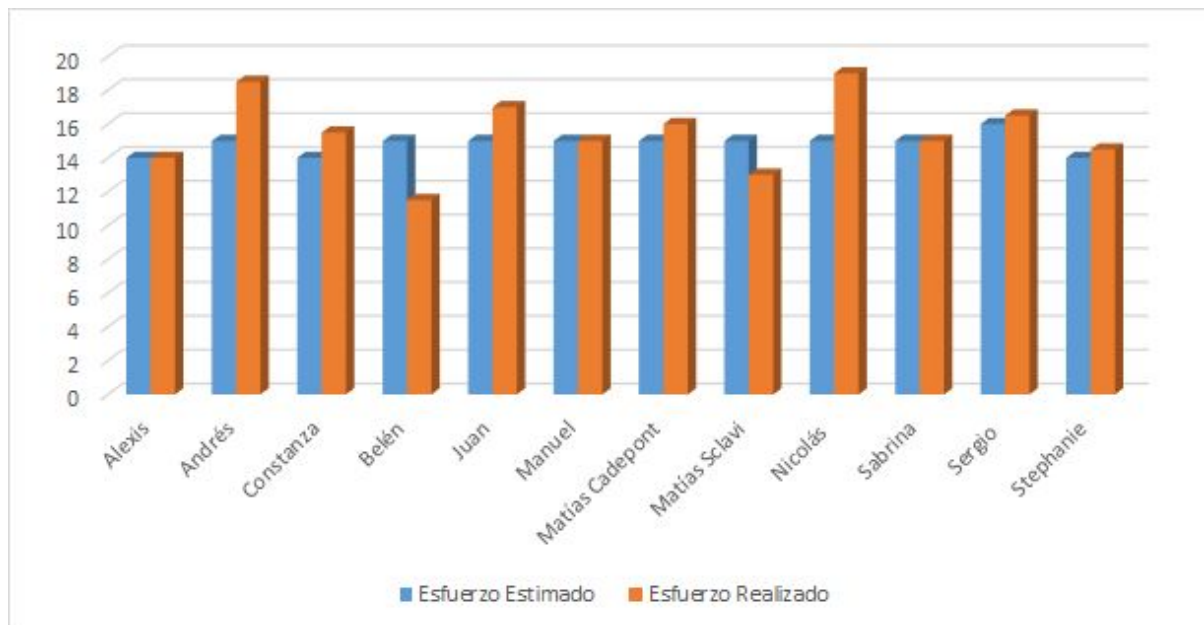

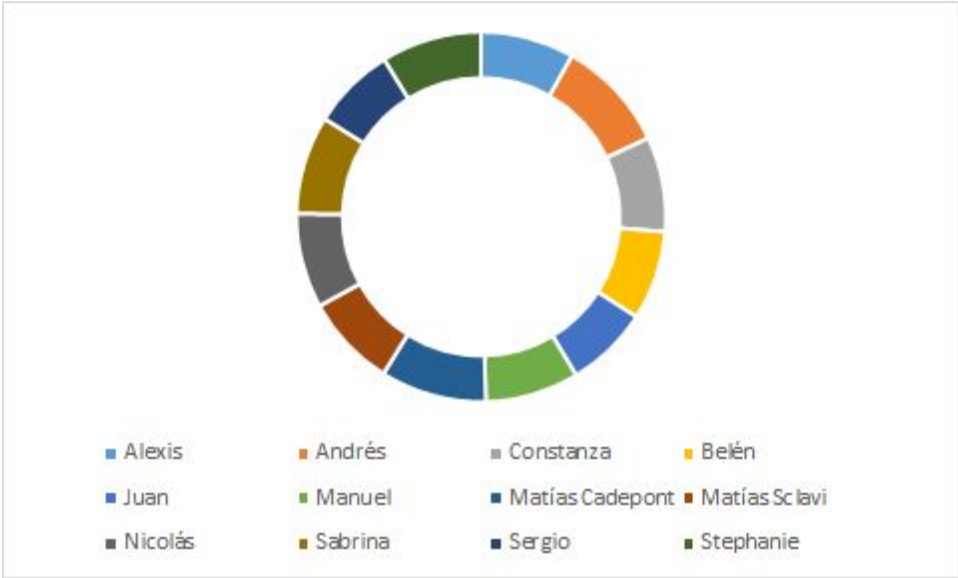

Informe de Situación

Estado del Proyecto

El proyecto se encuentra finalizando la semana 5, la cual pone fin a la primera iteración del Sprint 2 del proyecto.

Se considera que se terminó la recabación básica de requisitos que el sistema debe cumplir, a excepción de un nuevo requerimiento que aún se encuentra en etapa de evaluación: integración con la plataforma Moodle. Esto se debe a que aún no se cuenta con la suficiente información, tanto lo que se encontró en línea como la brindada por el cliente.

Se tiene una idea de cómo será la arquitectura de la aplicación y se están realizando prototipos técnicos para mitigar los riesgos asociados. También se tiene definido lo que se hará en la siguiente iteración con los respectivos roles asignados.

Desviaciones ocurridas e incidencias encontradas.

Durante la reunión de finalización de fase con el director de proyecto nos dimos cuenta de una mala planificación del sprint, eso se debe a que no se tienen objetivos claros de finalización de iteración.

Estado de Riesgos

Acorde.

Evaluación

El avance del proyecto es el adecuado acorde a las implementaciones de prototipos, se espera que en la siguiente semana se terminen y se comience una etapa de verificación.

Se considera que existe un pequeño atraso con respecto a la verificación y validación del sistema, ya que dentro del equipo no se tiene claro dentro del equipo cuáles serán las estrategias a utilizar. Se propone tener una mejor comunicación con el Responsable de Verificación durante la semana al igual que brindarle el apoyo correspondiente por parte de los asistentes.

