


Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Informe de Situación del Proyecto
Versión 1.3

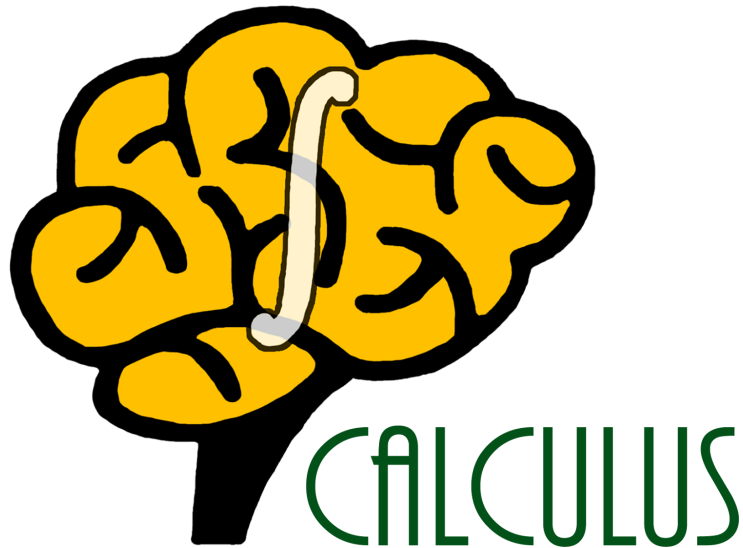

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/09/2016	1.0	Primera versión del documento	Danilo Amaral
16/09/2016	1.1	Se agrega información de desarrollo	Danilo Amaral
17/09/2016	1.2	Se agrega información de la planificación semanal	Danilo Amaral
18/09/2016	1.3	Versión final del documento	Danilo Amaral

Contenido

Contenido	2
1.Informe de Situación	3
1.1.Estado del proyecto	3
1.2.Desviaciones ocurridas	3
1.3.Incidencias encontradas	3
1.4.Estado de Riesgos	3
2.Evaluación	4

1. Informe de Situación

A continuación se describe el progreso del Proyecto.

1.1. Planificación Iteración

La siguiente tabla indica la definición de los Sprints tanto en cada iteración como a nivel semanal:

	SPRINTS						
	Fase Sprint 0	Fase Sprint 1	Fase Sprint 2	Fase Sprint 3	Fase Sprint 4	Fase Sprint 5	Fase Sprint 6
Iteración	iter1 / iter2 / iter3	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1
Semanas	1 / 2 / 3	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 13	14

Estamos parados al final de la Fase Sprint 1, concierne al segundo Sprint del Proyecto, en su segunda iteración y en la quinta semana del PIS; la misma a su vez está definida en la Semana del Lunes 12 de Septiembre.

La planificación semanal es la misma que estamos definiendo en la iteración anterior, con la salvedad de que el monitoreo en vez de realizarse el Martes 13 se realizó el Jueves 15 debido a un cambio de horario por parte del Administrador del grupo.

Las reuniones con el cliente son bisemanales donde el primer Lunes de cada comienzo de Fase (al comienzo de la Fase Sprint 2) el Lunes 19 de septiembre, se tiene planificada una reunión con el cliente para mostrarle lo realizado este Sprint, lo que queda por hacer y las actividades a realizar la próxima semana.

Cada reunión con el cliente viene seguido de un Monitoreo con el docente donde le contamos lo validado y las acciones que vamos a tomar y por último, al finalizar el Monitoreo, los integrantes del grupo tienen un Meeting donde discuten la planificación semanal y las tareas asignadas a los integrantes de cada línea de trabajo.

1.2. Estado del proyecto

El proyecto se encuentra al final del Sprint 01 (Segundo Sprint del Proyecto). Los integrantes del grupo de desarrollo están implementando el conjunto de historias asociadas al Sprint como lo indica el Backlog.

En este sprint están comprendidas las siguientes historias:

- 200 Autenticación jugador
- 275 Listado de temas
- 300 Listado de preguntas
- 400 Planteo de pregunta
- 500 Explicación pregunta
- 600 Consultar profesor
- 1900 Aumentar puntaje
- 1200 Profesor, agregar pregunta y explicación
- 1100 Profesor, gestión de preguntas y explicaciones
- 2000 Facilidad de uso

Las historias a implementar para esta iteración son las siguientes:

- 600 Consultar profesor
- 1900 Aumentar puntaje
- 1200 Profesor, agregar pregunta y explicación
- 1100 Profesor, gestión de preguntas y explicaciones
- 2000 Facilidad de uso

Se realizaron reuniones semanales con el arquitecto de manera de profundizar en la planificación. Se acordó realizar el documento de desarrollo con un Gantt para que se permita visualizar la asignación de tareas.

1.3. Desviaciones ocurridas

La única desviación ocurrida fue el monitoreo que pasó de ser el Martes 13 a las 16:30 a ser el Jueves 15 a la misma hora.

EL único integrante del equipo ausente la próxima semana seré yo ya que el Martes 27 rindo parcial en la facultad. Se le va a delegar ciertas tareas concernientes a la gestión al encargado de desarrollo para mitigar que el impacto del riesgo no sea tan grave.

1.4. Incidencias encontradas

No se han encontrado incidencias hasta el momento.

1.5. Estado de los Riesgos

El riesgo manifestado será la pérdida de disponibilidad de los miembros del equipo. Esto es debido a la semana de parciales de la facultad.

Se aplica el plan de contingencia concerniente a la reorganización de las actividades del integrantes y la asignación de las mismas al resto del grupo. En particular el Administrador le está delegando tareas de gestión al encargado de desarrollo de manera de realizar un mejor proceso de gestión. Todo esto estará más monitorizado de lo habitual de modo de que ante una ocurrencia de un riesgo, el mismo pueda ser mitigado.

2. Evaluación

El Sprint finaliza con un nuevo Product Backlog para entregarle al cliente el día Lunes 19, para que el mismo lo valide, y de ahí realizar la planificación para lo que resta del tercer Sprint. El mismo entre otras cosas contiene la implementación de las historias validadas por el cliente, esto es la vista del Alumno. Se tiene planificado hablar con el Product Owner para que valide la creación de la vista del Profesor entre otras cosas. El grupo sigue encaminado a entregar el producto de software en tiempo y forma.
