


Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Informe de Situación del Proyecto
Versión 3.1

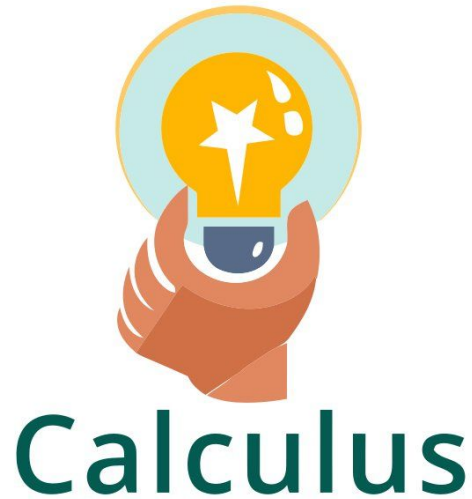

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06/10/2016	1.0	Primera versión del documento	Danilo Amaral
09/10/2016	1.1	Versión final del documento	Danilo Amaral
09/10/2016	1.2	Revisión de SQA	Manuel Alzugaray
23/10/2016	2.0	Fase Sprint 04	Danilo Amaral
23/10/2016	2.1	Revisión de SQA	Manuel Alzugaray
30/10/2016	3.0	Fase Sprint 05	Danilo Amaral
30/10/2016	3.1	Revisión de SQA	Manuel Alzugaray

Contenido

Contenido	2
1.Informe de Situación	3
1.1.Estado del proyecto	3
1.2.Desviaciones ocurridas	3
1.3.Incidencias encontradas	3
1.4.Estado de Riesgos	3
2.Evaluación	4

Informe de Situación

A continuación se describe el progreso del Proyecto.

1.1. Planificación Iteración

La siguiente tabla indica la definición de los Sprints tanto en cada iteración como a nivel semanal:

	SPRINTS						
	Fase Sprint 0	Fase Sprint 1	Fase Sprint 2	Fase Sprint 3	Fase Sprint 4	Fase Sprint 5	Fase Sprint 6
Iteración	iter1 / iter2 / iter3	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1 / iter2	iter1
Semanas	1 / 2 / 3	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 13	14

Estamos parados al final de la Fase Sprint 4, concerniente al quinto Sprint del Proyecto, en su segunda iteración y en la onceava semana del PIS; la misma a su vez está definida en la Semana del Lunes 24 de Octubre.

1.2. Estado del proyecto

Los integrantes del grupo de desarrollo están implementando el conjunto de historias asociadas al Sprint como lo indica el Backlog.

En este sprint están comprendidas las siguientes historias:

- Historia 2300: Teclado ingresar fórmulas
- Historia 900: Correcciones en el portal del administrador
- Historia 902: Detalles en el Backend
- Historia 903: Testing previo a la puesta en Producción
- Historia 2004: Migrar vistas

El Product Owner ordenó las mismas de la siguiente manera, asignando prioridad a cada una:

ID	Título	Prioridad
2300	Teclado ingresar fórmulas	83
900	Correcciones en el portal del administrador	18
902	Detalles en el Backend	60
903	Testing previo a la puesta en Producción	25
2400	Migrar vistas	60

Las historias a implementar para esta iteración son, entonces, las siguientes:

- Historia 900: Correcciones en el portal del administrador
- Historia 902: Detalles en el Backend
- Historia 903: Testing previo a la puesta en Producción
- Historia 2004: Migrar vistas

Para más información sobre las nuevas historias añadidas al backlog se recomienda leer el documento **Fase Sprint 04 (Quinto) - Product Backlog** adjuntado en la documentación.

1.3. Desviaciones ocurridas

No se encontraron ninguna desviación detectada.

1.4. Incidencias encontradas

No se encontró ninguna incidencia.

1.5. Estado de los Riesgos

No se manifestó ningún riesgo.

2. Evaluación

El Sprint empieza con nuevas historias definidas por el cliente. Se están realizando las mismas de manera de poder terminar la mayor cantidad de historias posibles ya que se negoció con el cliente que el backlog ya no iba a cambiar. Se destinará los próximos Sprint a finalizar todo el backlog, preparar una presentación final y realizar testing de la aplicación.

La evaluación es positiva, se espera terminar el proyecto con un producto de una muy buena calidad ya valorada por el cliente.
