

BeatIt!

Informe de Situación del Proyecto

Versión 4.1.2



Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	0	Primer Versión	Raúl Speroni
24/08/2014	1	Revisión de SQA	Pablo Olivera
30/08/2014	2	Segunda Versión	Raúl Speroni
31/08/2014	3	Revisión de SQA	Pablo Olivera
07/09/2014	4	Tercer Versión	Raúl Speroni
07/09/2014	5	Revisión de SQA	Pablo Olivera
13/09/2014	1.2.1	Cuarta Versión	Raúl Speroni
14/09/2014	1.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
21/09/2014	2.1.1	Quinta versión	Raúl Speroni
21/09/2014	2.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera

28/09/2014	2.1.3	Sexta Versión	Raúl Speroni
05/10/2014	2.2.1	Septima Version	Raúl Speroni
05/10/2014	2.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
12/10/2014	2.2.3	Octava Versión	Raúl Speroni
12/10/2014	2.2.4	Revisión SQA	Pablo Olivera
19/10/2014	3.1.1	Novena Versión	Raúl Speroni
19/10/2014	3.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.3	Actualización de los datos a la semana 10.	Pablo Olivera
26/10/2014	3.1.4	Revisión SQA	Emiliano Vázquez
02/11/2014	3.2.1	Actualización de los datos a la semana 11.	Raúl Speroni
02/11/2014	3.2.2	Revisión SQA	Pablo Olivera
09/11/2014	3.2.3	Actualización de los datos a la semana 12	Raúl Speroni
09/11/2014	3.2.4	Revisión SQA	Pablo Olivera
16/11/2014	4.1.1	Actualización de los datos a la semana 13	Raúl Speroni
16/11/2014	4.1.2	Revisión SQA	Pablo Olivera

Contenido

- [1. Mediciones realizadas](#)
 - [1.1 Mediciones de horas](#)
 - [1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo](#)
 - [1.1.2 Esfuerzo por disciplina](#)
- [2. Indicadores](#)
 - [2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo](#)
 - [2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas](#)
 - [2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas](#)
- [3. Informe de Situación](#)
 - [3.1 Estado del proyecto](#)
 - [3.2 Desviaciones ocurridas](#)
 - [3.3 Incidencias encontradas](#)
 - [3.4 Estado de Riesgos](#)
- [4. Evaluación](#)


1. Mediciones realizadas

Se utiliza Redmine como apoyo a la gestión del proceso, se miden cantidad de tareas por iteración, largo de tareas por día, horas estimadas por tarea, horas dedicadas por tarea, horas dedicadas por persona.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Semana 13	Total
Alejandro Brusco	9.50	205.25
Cristian Bauza	8.00	172.00
Emiliano Vazquez	18.00	213.00
Felipe García	16.00	170.00
Gonzalo Javiel	15.50	187.00
Joaquin Velazquez	15.50	181.00
Luciana Martinez	15.00	181.50
Martin Alayon	14.50	189.00
Martin Berguer	3.00	230.00
Martin Steglich	17.00	198.50
Pablo Olivera	15.50	190.80
Raúl Speroni	20.00	202.00
Total	167.50	2320.05

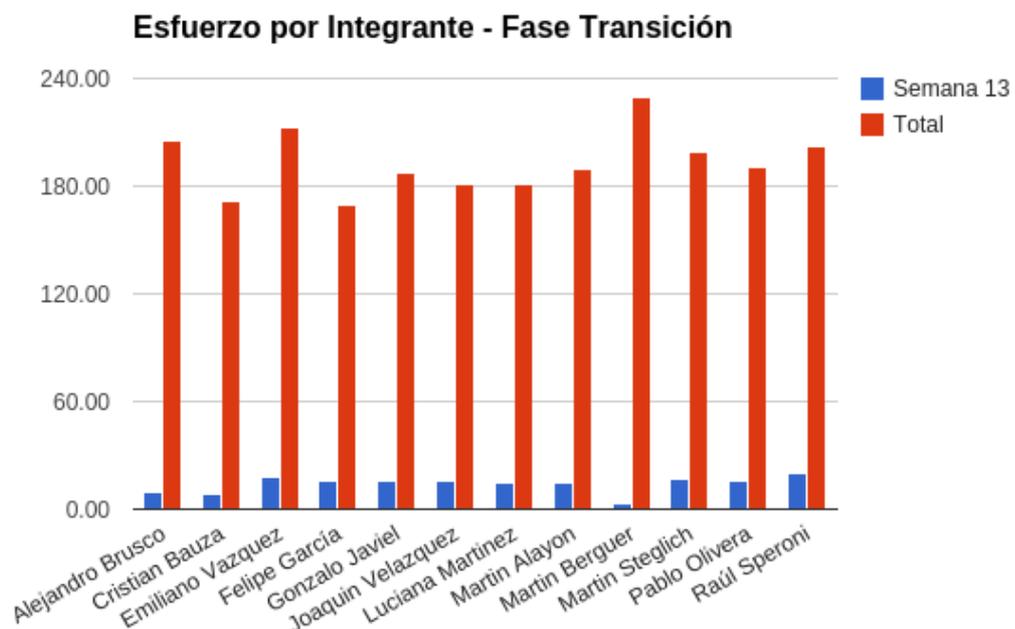

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

N/A

2. Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

Entregas_en_Fecha = 10

Entregas_Agendadas = 18

Cumplimiento de Entregas = $10/18 = 0.55$

2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

3. Informe de Situación

3.1 Estado del proyecto

El Proyecto cumplió con todos los hitos del cronograma, resta la validación del cliente, la corrección de posibles errores y la elaboración de la presentación final.

3.2 Desviaciones ocurridas

N/A

3.3 Incidencias encontradas

No hubieron eventos no planificados que afectaron el desarrollo de esta iteración.

3.4 Estado de Riesgos

Se están monitoreando todos los riesgos identificados hasta el momento, han ocurrido algunos y han variado otros. La ocurrencia y la evolución de los riesgos se detalla en el documento de Riesgos.

4. Evaluación

El cronograma fue cumplido según lo previsto y se cumplió con el alcance original.
