

Challenge Accepted

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|------------|---------|------------------------|--------------------|
| 05/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Inés Saint Martin. |
| 05/10/2014 | 1.1 | Revision de SQA. | Federico Blumetto. |
| | | | |
| | | | |

Contenido:


1. Mediciones realizadas
 - 1.1. Mediciones de horas
 - 1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo
 - 1.1.2. Esfuerzo por Rol
 - 1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo
3. Informe de Situación
 - 3.1. Estado del proyecto
4. Evaluación

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas


1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

| Línea de trabajo | Esfuerzo realizado |
|--------------------------|--------------------|
| Diseño | 8 |
| Implementación | 102,5 |
| Gestión de calidad | 7,5 |
| Gestión de configuración | 1 |
| Gestión de proyecto | 37 |
| Verificación | 26,25 |
| Comunicación | 23,5 |

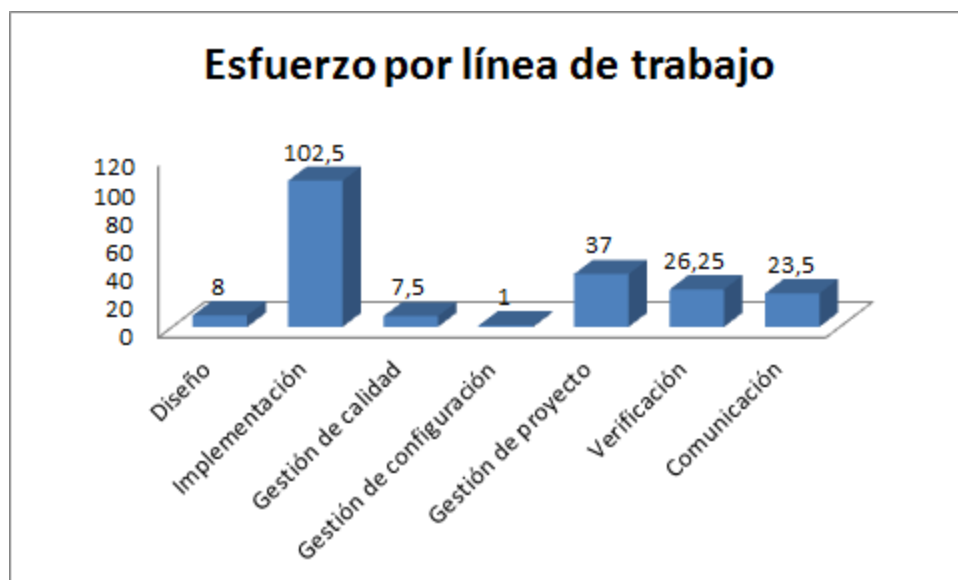


1.1.2. Esfuerzo por Rol

| Rol | Esfuerzo realizado |
|---------------------------|--------------------|
| Analistas | 4,5 |
| Arquitecto | 24 |
| Responsable de SQA | 11,5 |
| Responsable de SCM | 1 |
| Asistente SQA | 1 |
| Responsable verificación | 22,75 |
| Asistente de verificación | 11,5 |
| Administrador | 14,5 |
| Implementador | 115 |

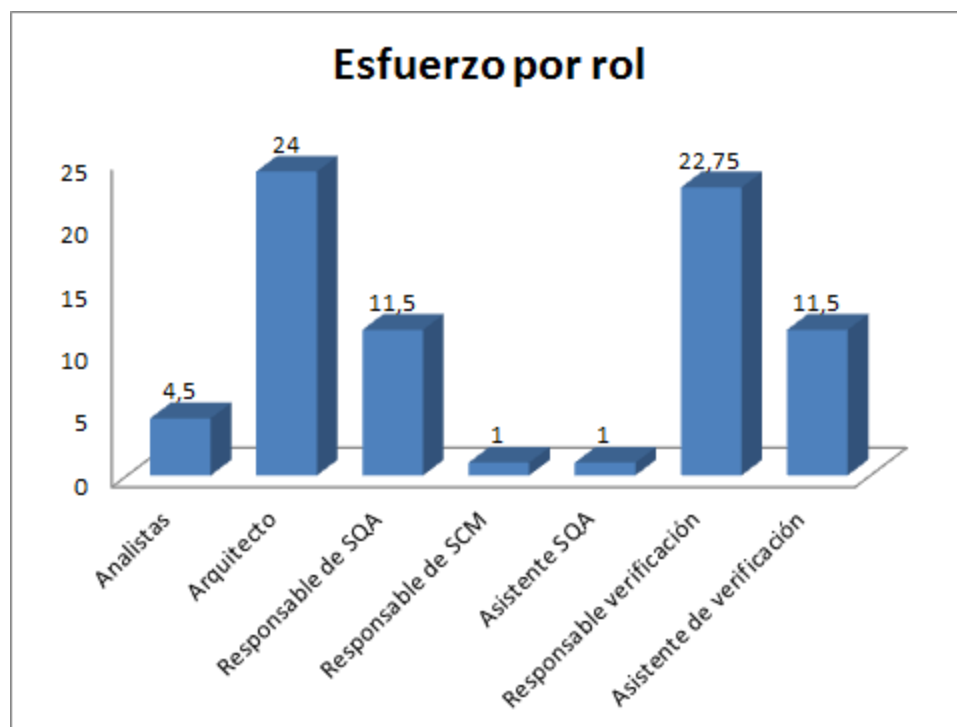

1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Alejandro Miguel | 19 | 25,5 | 105,5 | 15 |
| Inés Saint Martin | 17,5 | 21,5 | 112 | 16 |
| Luciano Montero | 7,5 | 14,5 | 100 | 14,2 |
| Florencia Ruiz | 14 | 17,5 | 107 | 15,2 |
| Juan Korenko | 11,5 | 17,5 | 123,5 | 17,6 |
| Pablo Da Silva | 2 | 20,5 | 121,5 | 17,3 |
| Federico Blumetto | 22,5 | 23 | 114,5 | 16,3 |
| Eduardo Mereles | 1,5 | 18,5 | 105 | 15 |
| Lucas Bouissa | 19,5 | 24 | 106 | 15 |
| Leticia Vaz Lutz | 12,5 | 16 | 108,5 | 15,5 |
| Gonzalo Sintas | 12 | 14,75 | 116,65 | 16,6 |
| Joaquin Gatica | 13 | 14 | 106 | 15,1 |

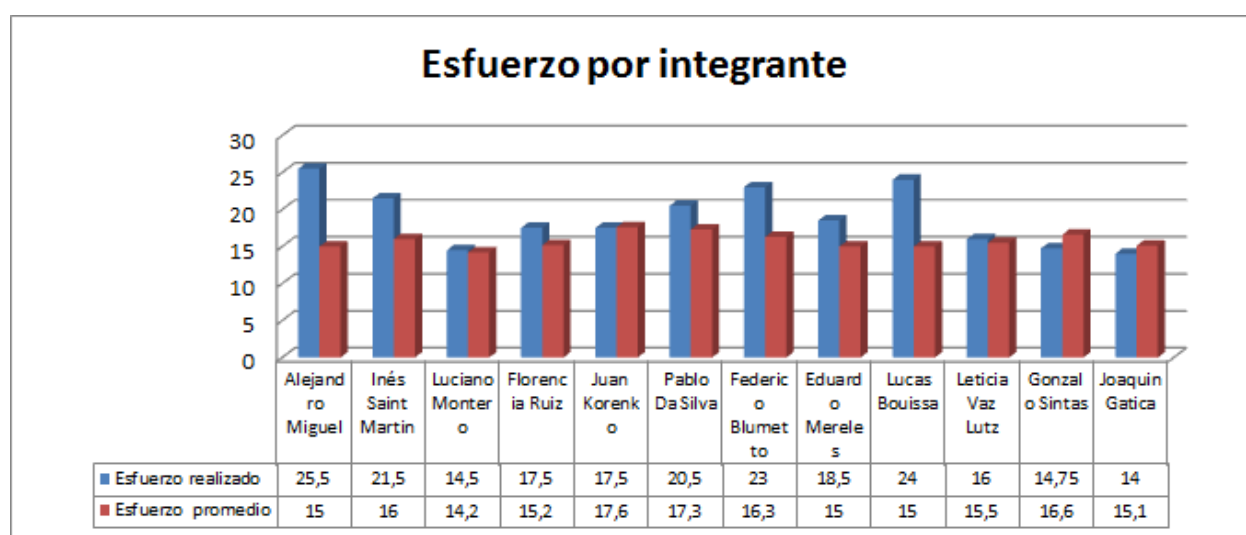

3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

Según el plan de la iteración, nos encontramos atrasados, ya que la entrega por parte de los implementadores de los requerimientos definidos para la primer iteración de la fase dos se realizó recién sobre el fin de semana.

Se pretende recuperarse del atraso desfasando la entrega de la próxima iteración, haciéndola el día Martes y no el Domingo como estaba planificada.

Por otro lado, dado el atraso, se decidió pasar una persona de verificación para implementación. Esta decisión se tomó luego de evaluar las consecuencias de ser menos verificadores con el responsable del área.

Para no ir en contra de las opciones elegidas en los roles, se cambió el responsable de verificación y esa persona pasó a implementar, asumiendo como responsable del área un asistente de la misma.

Se planificó el pasaje de conocimientos y apoyo para encaminar las tareas para la semana ocho.

Se esta armando una entrega para el cliente en la mitad de la semana.

4. Evaluación

Al encontrarnos con un incidente grave como el detectar que no nos iban a dar las horas para completar la implementación si seguíamos trabajando igual, se logró conseguir una solución que beneficiara a todo el grupo.

Estamos en una etapa de adaptación a estos nuevos roles y se busca estar al día en poco tiempo más cuando el implementador se vuelva productivo. Así también se espera una dedicación extra de los implementadores.
