

Jogo Rubynho

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/11/2014	1.0	Versión inicial	Jorge Artave

Contenido

Índice de contenido

<u>Mediciones realizadas.....</u>	<u>3</u>
<u>Mediciones de horas.....</u>	<u>3</u>
<u>Informe de Situación.....</u>	<u>5</u>
<u>Estado del proyecto.....</u>	<u>5</u>
<u>Incidencias encontradas.....</u>	<u>6</u>
<u>Estado de Riesgos.....</u>	<u>6</u>
<u>Evaluación.....</u>	<u>7</u>

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas


Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de actividades. Se presenta un resumen.

Integrante\ Horas	Semana	Estimado Sprint	Acumulado	Promedio	Acumulado Sprint
Cristian Vega	17	45	232,5	17,96	29
Federico del Río Silva	14	34	200,33	15,41	26,5
Fernando Banchemo	11	45	192,5	14,81	21,5
Guillermo Báez	17	31	216,5	16,65	28
Joel Vázquez	17	31	224,5	17,27	28
Jorge Artave	20	45	219	16,85	35,75
Juan Rahi	10	30	240,5	18,5	10
Liber Azambuya	12	35	251	19,31	27,5
Matías Irland	20,25	45	221,5	17,04	28,75
Mauricio Calcagno	10,5	21	234,5	17,67	30,5
Pablo Coore	18	45	186	14,38	35,5
Sergio Vico	20,5	45	214	16,46	35,5

Historia/T area	Estimado (3 horas * puntos)	Realizado (Horas)	Error (%)
H38	63	37	70,27
H20	39	65,5	40,46
H22	15	7	114
T2	24	6	
T16	21	6	250
H42	9	8,5	5,8
H78	24	2	1100
T3	15	8	
T10	3	2	
T17	24	6	
T18	3		
T19	9	3	
T20	2	1	
T22	6		
T23	6	6,25	
T100	6		
T101	24	2	
T110	6	10	
H81	6	4,5	

H82	24	4,5	
-----	----	-----	--

En la tabla anterior se presenta la cantidad de horas estimadas y la cantidad de horas invertidas en dicha tarea. Las filas con fondo verde indican que dicha tarea se encuentra finalizada.

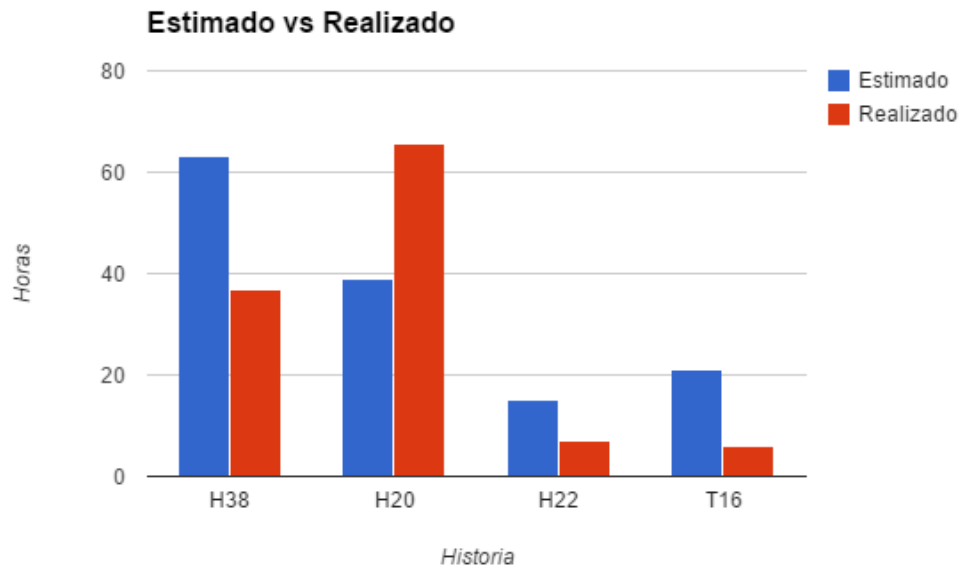


El gráfico anterior muestra las horas estimadas contra las realizadas para las las historias finalizadas.


2. Informe de Situación


2.1. Estado del proyecto

De las tareas iniciales a realizar en el sprint, resta unicamente T2, se adjunta gráfico BurnDown actualizado al día sabado antes de agregar las nuevas tareas.

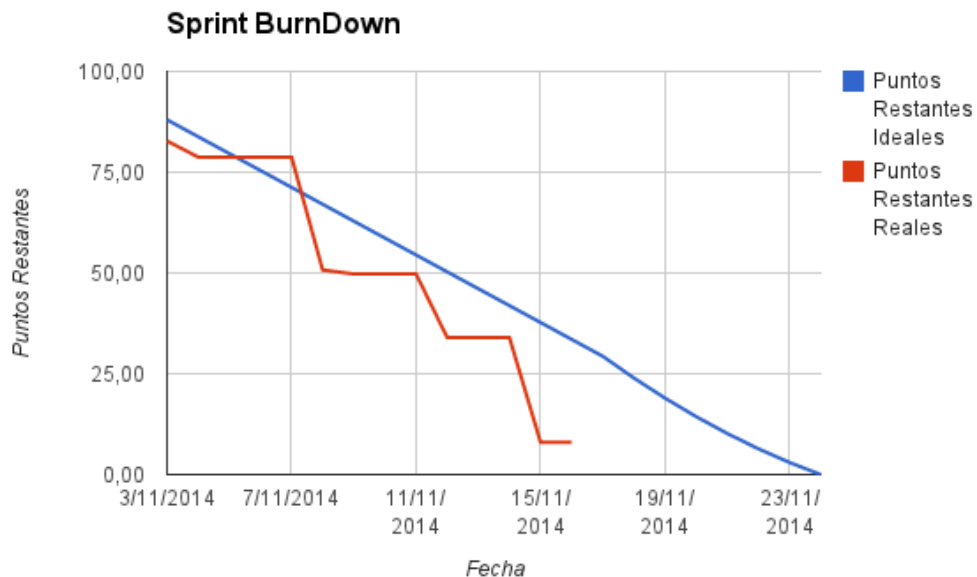

A continuación se presenta el mismo gráfico luego de haber ingresado nuevas tareas.

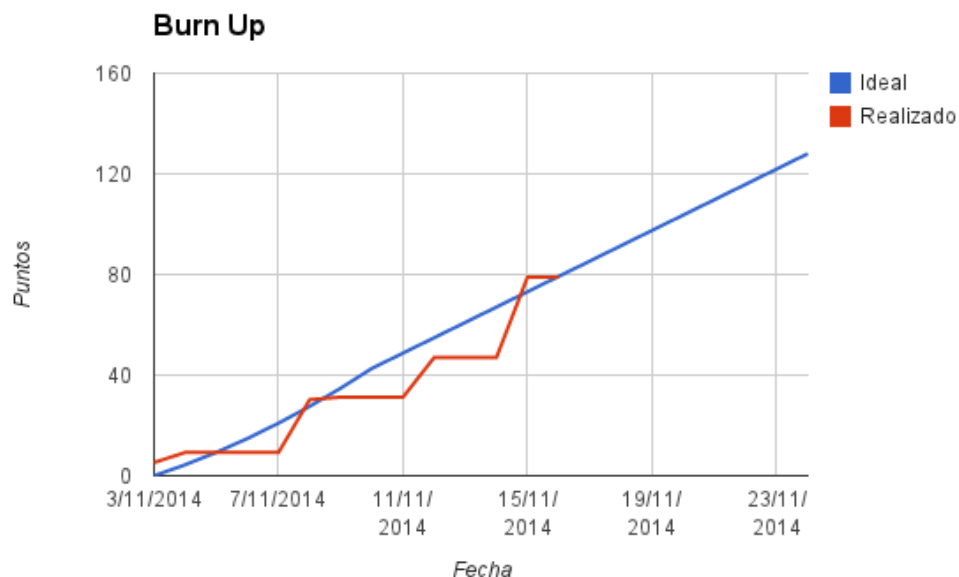

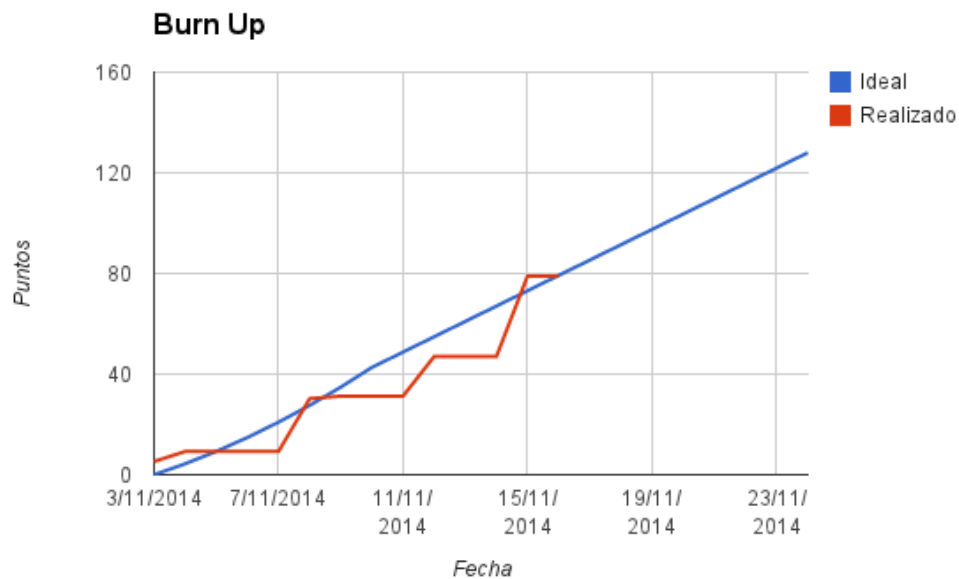

De las tareas nuevas, en general se comenzó a trabajar durante el fin de semana, habiendo comenzado con algunas al inicio de la semana, ya que algunas de las tareas a realizar en el sprint fueron mencionadas durante la última review y algunas se agregaron durante la semana (en ambos casos, estas tareas a realizar fueron confirmadas cerca del fin de semana por el cliente).

2.2.Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes.

2.3.Estado de Riesgos

En el correr del fin de semana, el compañero que no iba a poder dedicar tiempo a facultad retomó su actividad normal.

Debido a las dificultades para coordinar con el cliente en semanas anteriores y la demora en obtener una respuesta a los correos electrónicos, sumado a que se nos informó sobre algún problema en particular durante la semana anterior, asumimos que durante la semana que finaliza y la siguiente el cliente no podrá dedicarle el tiempo que venía dedicándole al curso. Se seguirá intentando comunicarse con él pero se tendrá en cuenta la situación mencionada.

3.Evaluación

Se espera tener cerca del día Jueves la mayoría del trabajo finalizado para poder comenzar a verificar la aplicación. Creemos que esta meta nos va a permitir corregir bugs que puedan surgir y tener la mayoría de las mejoras mencionadas por el cliente para dicha fecha.

Con respecto a la comunicación con el cliente aparte de lo mencionado en la sección anterior, se realizaron consultas extras a las planteadas en la encuesta de satisfacción y se espera por respuesta.
