

Sistema de Administración de Farmacias

Informe de Situación del Proyecto.

Versión 1.14

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
14/09/2014	1.5	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
21/09/2014	1.6	Modificación	Gonzalo Capote
27/09/2014	1.7	Modificación	Gonzalo Capote
05/10/2014	1.8		
12/10/2014	1.9		
19/10/2014	1.10	Modificación	Gonzalo Capote
26/10/2014	1.11	Modificación	Gonzalo Capote
02/11/2014	1.12	Modificación	Gonzalo Capote
09/11/2014	1.13	Modificación	Gonzalo Capote
16/11/2014	1.14	Modificación	Gonzalo Capote

ÍNDICE


1. Mediciones realizadas.....	3
1.1 Mediciones de horas	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina	4
1.2 Mediciones de productos	5
2. Indicadores	6
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	6
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas	6
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas	6
3. Informe de Situación	7
3.1 Estado del proyecto	7
3.2 Desviaciones ocurridas.....	7
3.3 Incidencias encontradas	7
3.4 Estado de Riesgos	7
4. Evaluación	7

1. Mediciones realizadas.


1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Acumulado	Promedio	Semana 13
Maria Jose Rabaza	334,5	25,7	24,5
Manuela Viola	249,5	19,2	10
Estera Nocon	130,5	10,0	7
Gonzalo Capote	227	17,5	21
Alfonso Methol	188	14,5	15,5
Fernanda Toledo	250,75	19,3	8,5
Daniela Fagundez	245	18,8	16,5
Gonzalo Mercadante	214,95	16,5	6
Juan Pablo Sierra	189,25	14,6	11,5
Guillermo Lopez	299,5	23,0	36
Santiago Ramirez	170	13,1	18
Santiago Nieves	243,5	18,7	21,5

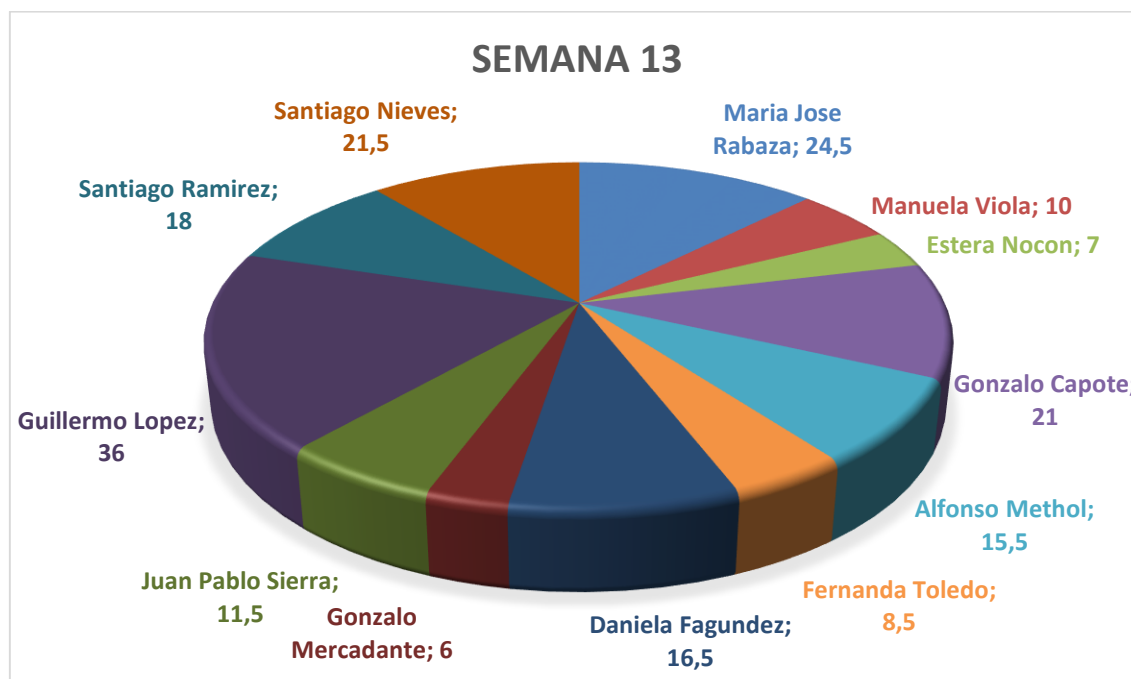


ACUMULADO

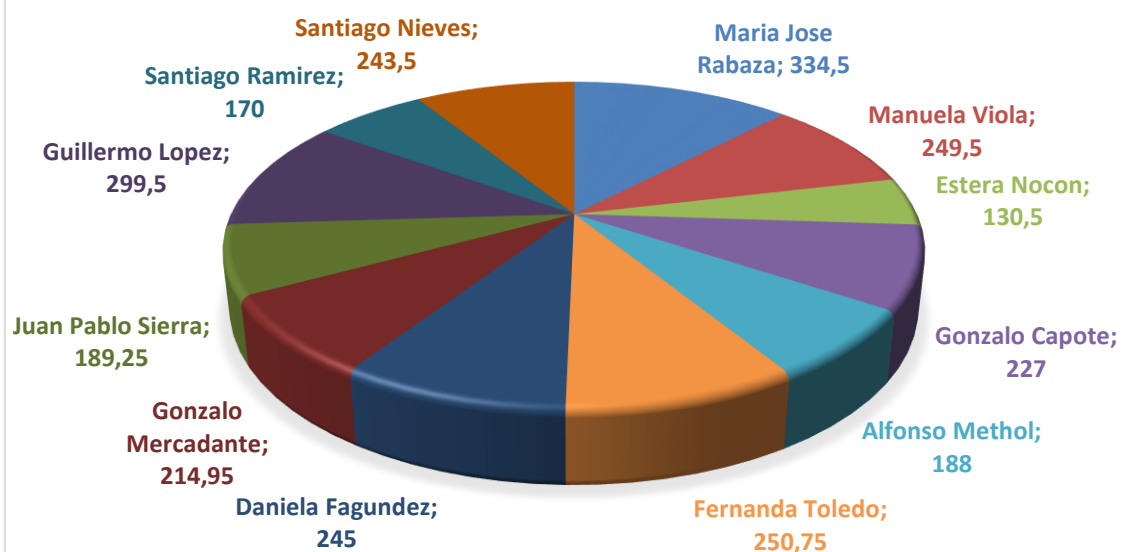

1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado
Gestión de Proyecto	461,95
Análisis/Req.	305
Diseño	101,5
Implementación	950
Gestión de Calidad	95,5
Gestión de Configuración	60,5
Verificación	177,25
Formacion y Entrenamiento	190,5
Comunicacion	6,5
Implantacion	18

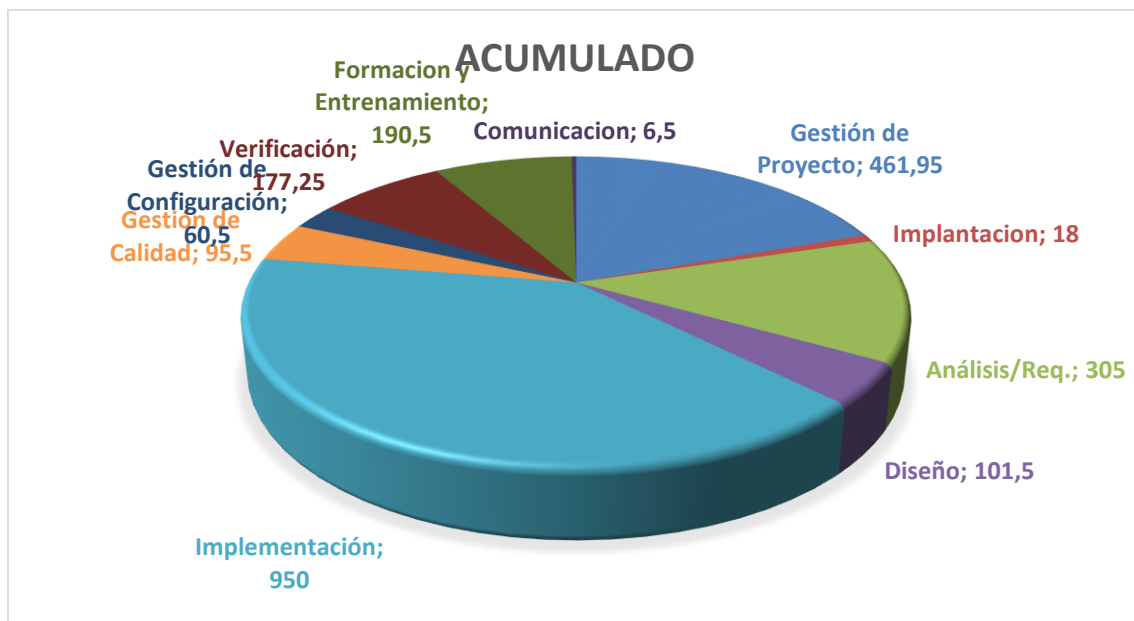

1.2 Mediciones de productos

	Alcance	Estimado	Medido	Avance
Elaboración				
Iteración 1				
	Iniciar Sesión	12	26.5	100%
	Buscar Producto	48	32	100%
	Actualizar Precios y Stock	60	33.5	100%
	Realizar Factura	48	74	100%
	Ver Información Producto	24	14.5	100%
	Subtotal	192	180.5	
Iteración 2				
	Registrar Cliente	36	30.5	100%
	Ajustar stock	36	23	100%
	Realizar Factura	96	58.5	100%
	Imprimir Comprobante	24		100%
	Actualizar Precios y Stock		57	100%
	Subtotal	192	169	

Construcción				
Iteración 1				
	Controlar Compra Automática	60	52	100%
	Crear Descuento Producto	12	22	100%
	Crear Cuenta Corriente	12	19	100%
	Ingresar Pago Cuenta Corriente	12	19	100%
	Realizar Factura	72	56	100%
	Modificar Cliente	12	14	100%
	Buscar Cliente	24	17	100%
	Ver Información Cliente	24	22	100%
	Subtotal	228	221	
Construcción				
Iteración 2				
	Ver Historial Operaciones	36		
	Ver Compras Cliente	24		100%
	Consultar Factura	36		100%
	Ver Factura	24		100%
	Realizar Factura	48		100%
	Subtotal	168	21	

2. Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

3. Informe de Situación

3.1 Estado del proyecto

Ver documento de conclusión de fase.

3.2 Desviaciones ocurridas

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluación

Ver documento de conclusión de fase.
