


















































































Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1						
2	✓	<b>P4 - Producir version alfa 1.3</b>	<b>1 día?</b>	<b>mié 08/10/14</b>	<b>mié 08/10/14</b>	
3	✓	I11 - Realizar Factura	8 días	lun 29/09/14	mié 08/10/14	
4	✓	I11 - Ajustar stock	8 días	lun 29/09/14	mié 08/10/14	
5	✓	I11 - Registrar Cliente	8 días	lun 29/09/14	mié 08/10/14	
6						
7	✓	<b>P4 - Producir version alfa 1.4</b>	<b>1 día?</b>	<b>sáb 11/10/14</b>	<b>sáb 11/10/14</b>	
8	✓	I3 - Corregir Iniciar Sesión - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
9	✓	I3 - Corregir Buscar Producto - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
10	✓	I3 - Corregir Actualizar Precios y Stock - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
11	✓	I3 - Corregir Realizar Factura - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	3
12	✓	I3 - Corregir Ver Información del Producto - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	
13	✓	I3 - Corregir Ajustar Stock - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	sáb 11/10/14	4
14						
15	✓	<b>P4 - Producir version alfa 1.5</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 13/10/14</b>	<b>lun 13/10/14</b>	
16	✓	I3 - Corregir Registrar Cliente - Ajuste Nuevo Modelo	3 días	jue 09/10/14	lun 13/10/14	
17						
18	✓	<b>P4 - Producir version alfa 1.6</b>	<b>1 día?</b>	<b>jue 16/10/14</b>	<b>jue 16/10/14</b>	
19	✓	V8 - Pruebas del sistema versiones 1.3, 1.4 y 1.5	6 días	jue 09/10/14	jue 16/10/14	
20	✓	I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.3, 1.4 y 1.5	5 días	dom 12/10/14	jue 16/10/14	
21	✓	I11 - Implementar mejores usabilidad	4 días	lun 13/10/14	jue 16/10/14	


Proyecto: Replanificación PIS Fecha: dom 02/11/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
22		<b>Verifiacion 1.6</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 17/10/14</b>	<b>dom 19/10/14</b>	
23		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.6	2 días	vie 17/10/14	dom 19/10/14	
24		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.6	2 días	vie 17/10/14	dom 19/10/14	
25		<b>P4 - Producir verison alfa 1.7</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 13/10/14</b>	<b>dom 19/10/14</b>	
26		I11 - Implementar Imprimir Comprobante	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
27		I11 - Implementar Buscar Cliente	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
28		I11 - Crear Cuenta Corriente	6 días	lun 13/10/14	dom 19/10/14	
29		<b>Verifiacion 1.8</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 20/10/14</b>	<b>dom 26/10/14 25</b>	
30		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8	6 días	lun 20/10/14	dom 26/10/14	
31		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8	6 días	lun 20/10/14	dom 26/10/14	
32		<b>Producir verison alfa 1.9</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 13/10/14</b>	<b>dom 02/11/14</b>	
33		I11 - Implementar Controlar Compra Automática	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
34		I11 - Implementar Crear Descuento Producto	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
35		I11 - Implementar Modificar Cliente	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
36		I11 - Implementar Ingresar Pago Cuenta Corriente	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
37		I11 - Implementar Realizar Factura	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
38		I11 - Implementar Ver Informacion de Cliente	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
39		I11 - Implementar mejores usabilidad	16 días	lun 13/10/14	dom 02/11/14	
40		<b>Verificacion 1.9</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 03/11/14</b>	<b>lun 17/11/14</b>	
41		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.9	6 días	lun 03/11/14	dom 09/11/14	
42		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.9				

Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 02/11/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43		<b>Producir version alfa 2.0</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 03/11/14</b>	<b>dom 09/11/14</b>	
44		I11 - Implementar Ver Historial Operaciones	6 días	lun 03/11/14	dom 09/11/14	
45		I11 - Implementar Ver Compras Cliente	6 días	lun 03/11/14	dom 09/11/14	
46		I11 - Implementar Consultar Factura	6 días	lun 03/11/14	dom 09/11/14	
47		I11 - Implementar Ver Factura	6 días	lun 03/11/14	dom 09/11/14	
48		I11 - Implementar Realizar Factura	6 días	lun 03/11/14	dom 09/11/14	
49		<b>Verifiacion 2.0</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 10/11/14</b>	<b>dom 16/11/14</b>	
50		V8 - Pruebas del sistema versiones 1.8	6 días	lun 10/11/14	dom 16/11/14	
51		I3 - Corregir bugs detectados versiones 1.8	6 días	lun 10/11/14	dom 16/11/14	
52		<b>Producir version beta 2.0</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 17/11/14</b>	<b>vie 21/11/14</b>	
53		V8 - Pruebas de aceptacion	5 días	lun 17/11/14	vie 21/11/14	

Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 02/11/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

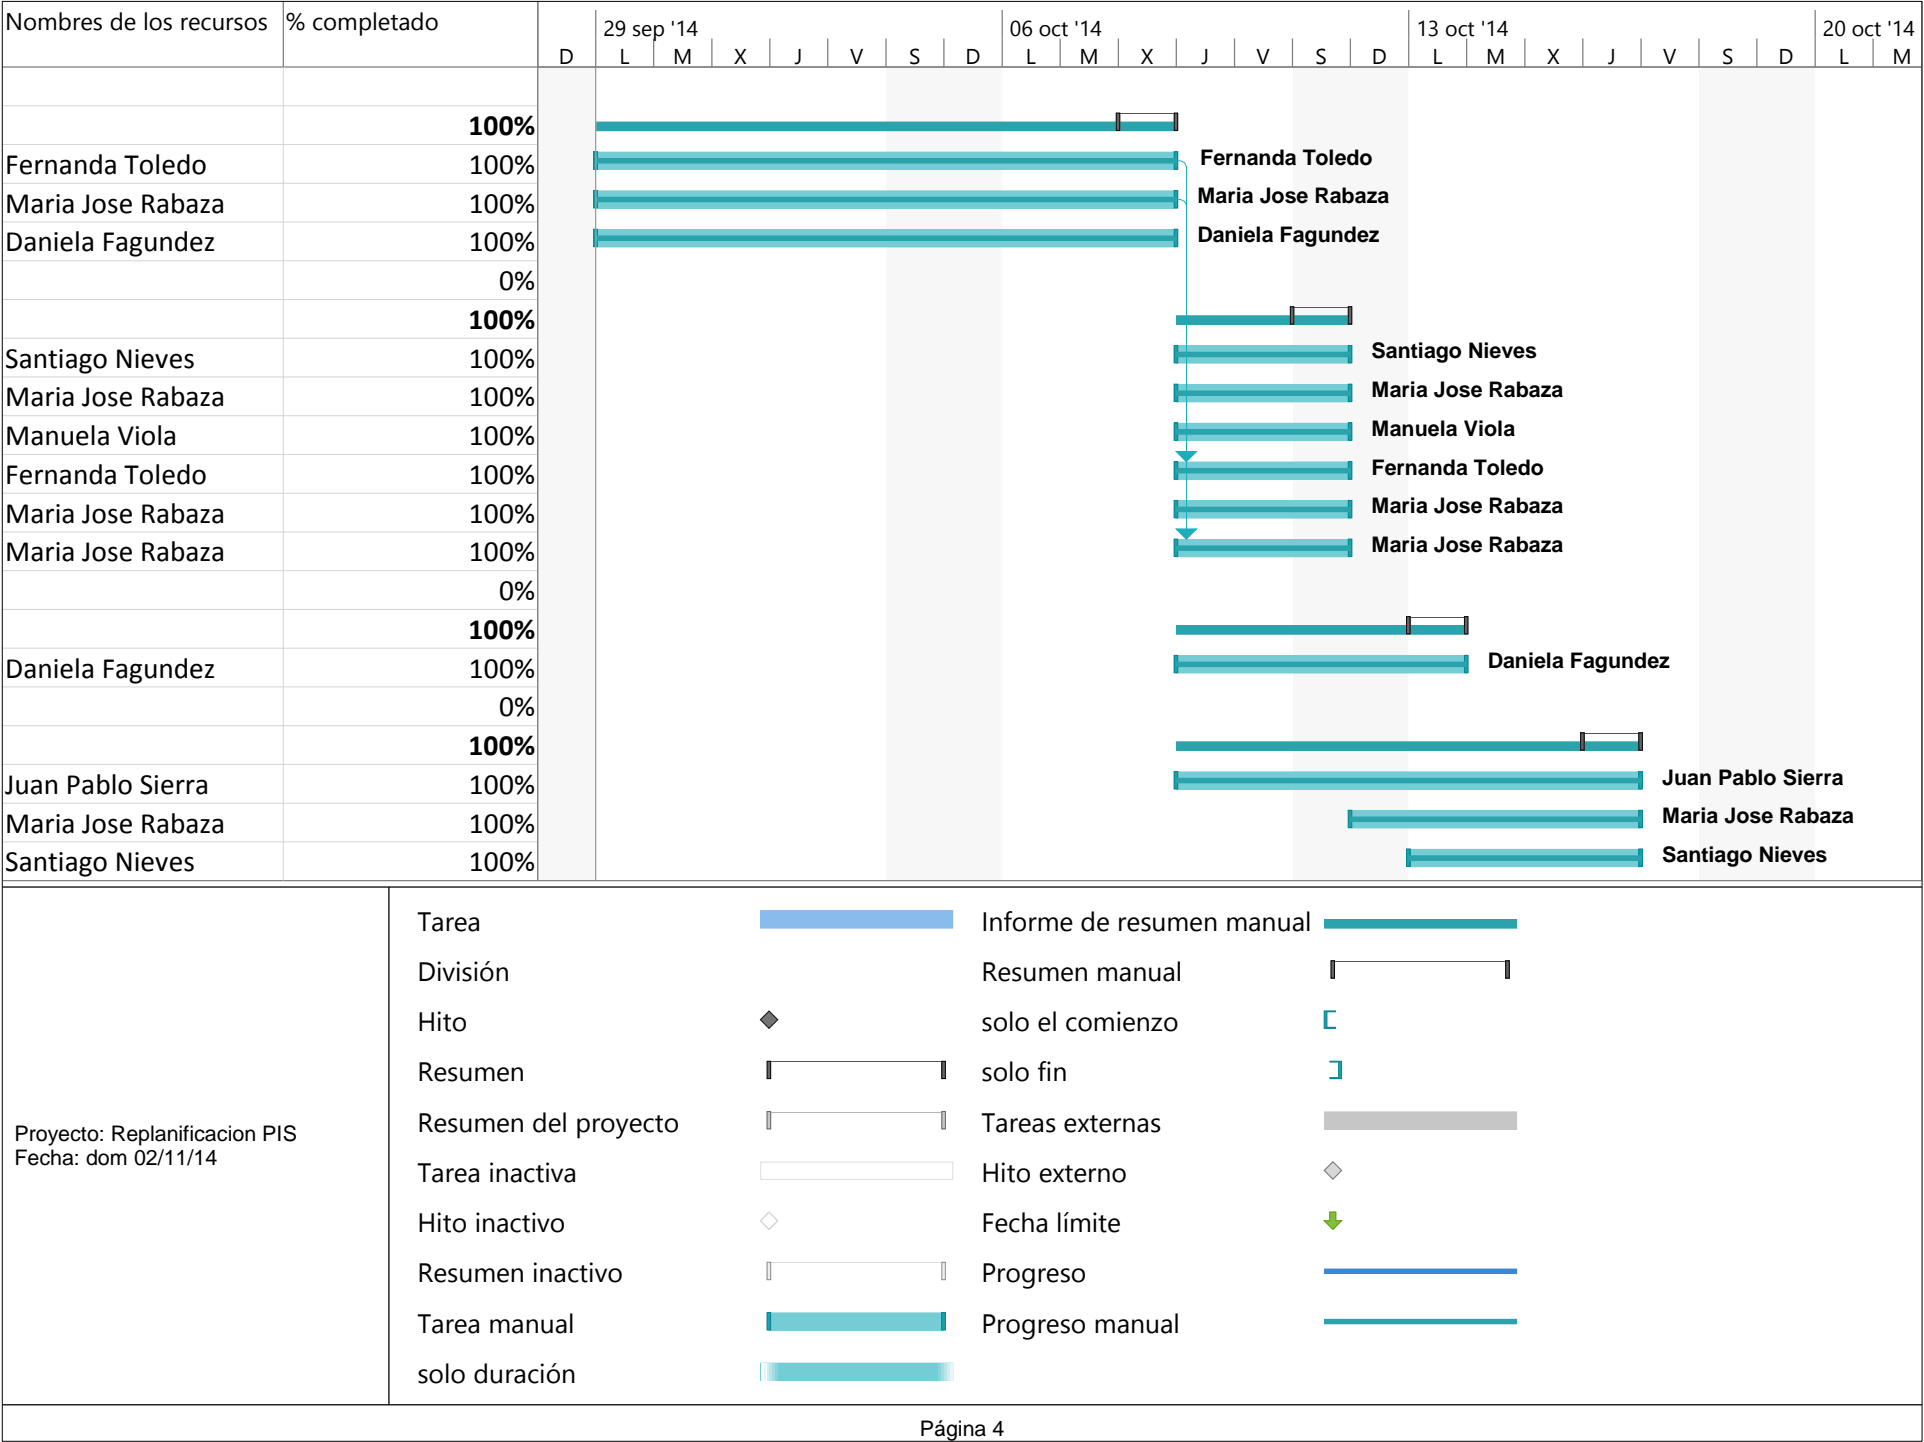



















Página 4

Nombres de los recursos	% completado	29 sep '14									06 oct '14							13 oct '14							20 oct '14	
		D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
	100%																									
Juan Pablo Sierra	100%																									
Juan Pablo Sierra	100%																									
	100%																									
Santiago Nieves	100%																									
Maria Jose Rabaza	100%																									
Santiago Ramirez	100%																									
	100%																									
Juan Pablo Sierra	100%																									
Maria Jose Rabaza	100%																									
	63%																									
Guillermo Lopez	63%																									
Manuela Viola	63%																									
Maria Jose Rabaza	63%																									
Santiago Ramirez	63%																									
Fernanda Toledo	63%																									
Daniela Fagundez	63%																									
Santiago Nieves	63%																									
	0%																									
Juan Pablo Sierra	0%																									
Maria Jose Rabaza	0%																									

<div> <div>Proyecto: Replanificacion PIS</div> <div>Fecha: dom 02/11/14</div> </div>	Tarea	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>
	División		Resumen manual	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>
	Resumen	<div></div>	solo fin	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Tarea manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	solo duración	<div></div>		

[illegible]

Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 02/11/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Replanificación PIS  
Fecha: dom 02/11/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso



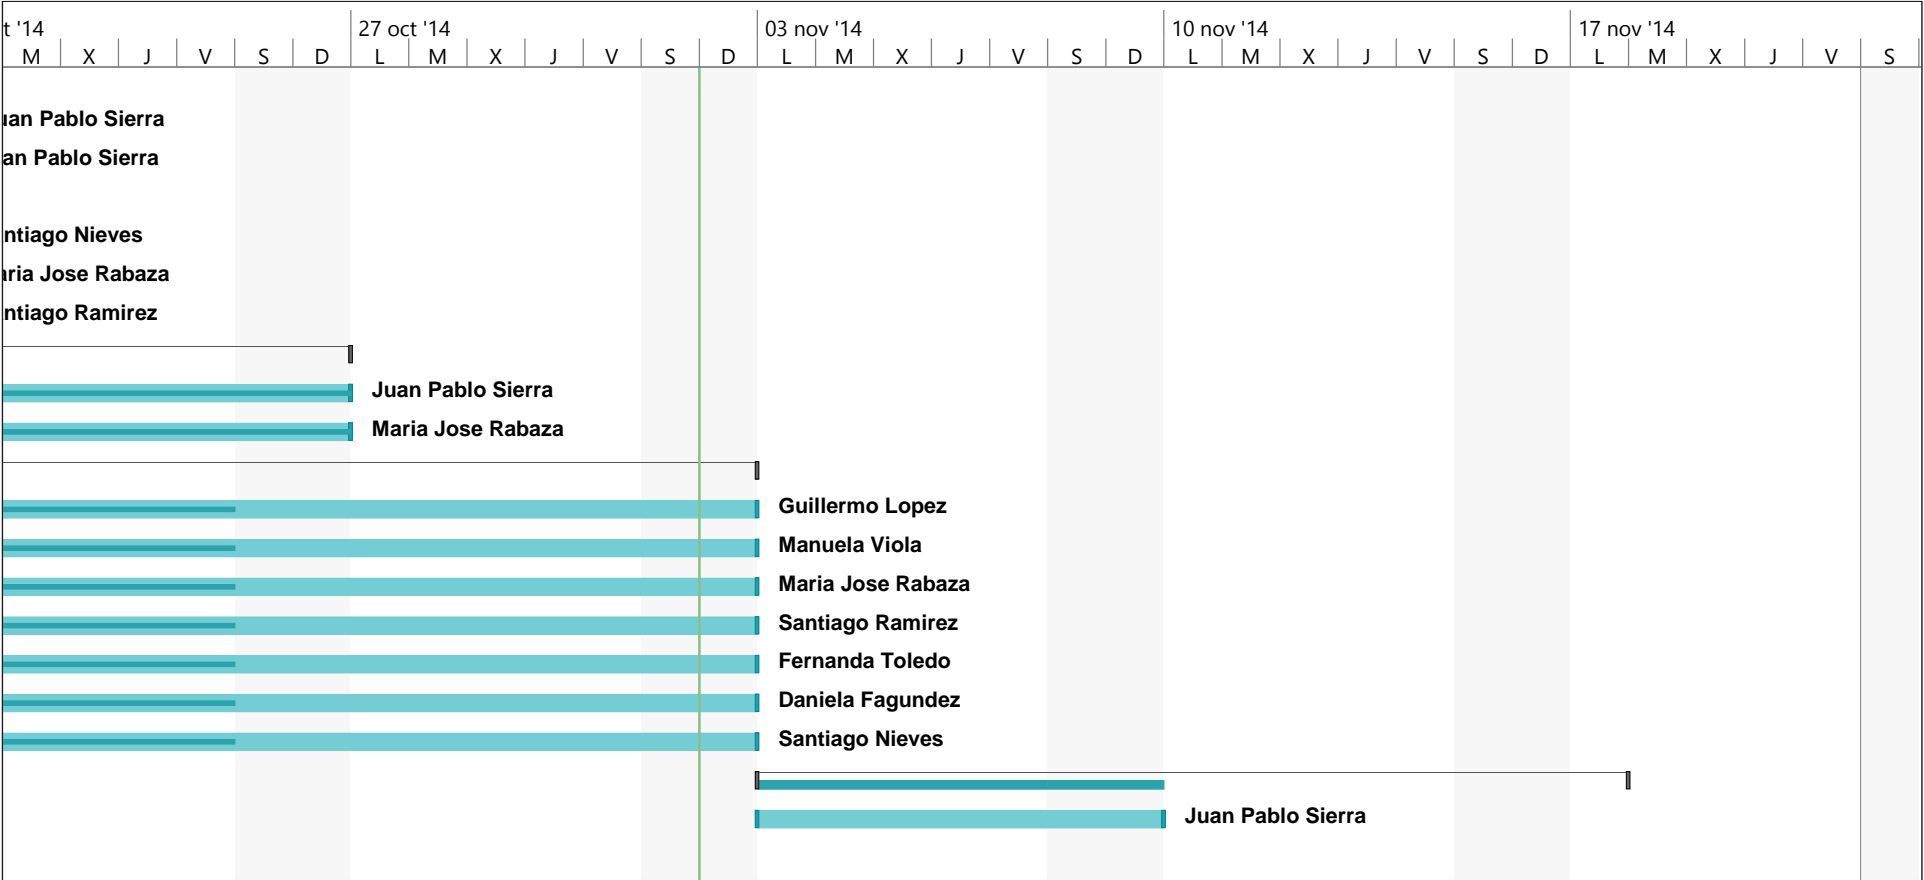



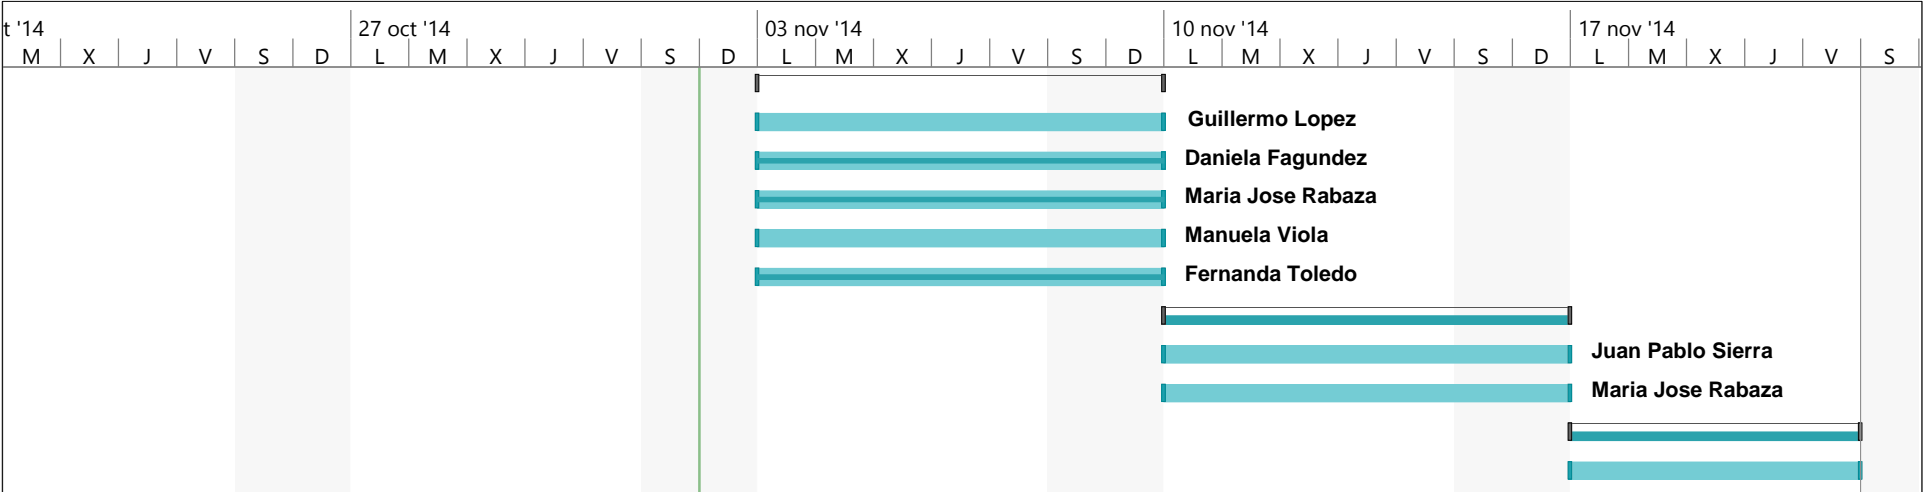











Progreso manual



Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 02/11/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			





Proyecto: Replanificacion PIS Fecha: dom 02/11/14	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración	
